

**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI  
PLANA POSLOVANJA  
ZA 2018. GODINU**

Sarajevo, februar/veljača 2019.

**SADRŽAJ**

	Strana
U V O D	3
A. I JAVNI PRIHODI	6
A. II AMORTIZACIJA	10
B. I JAVNI RASHODI	11
1. Troškovi poslovanja	12
2. Služba „Pomoć-informacije na cestama“	14
3. Redovno održavanje	15
4. Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode	23
5. Rezervirana sredstva za sudske presude	24
6. Troškovi konsultantskih usluga	25
7. Kamate	26
B. II TROŠKOVI AMORTIZACIJE	28
C. INVESTICIJE	29
1. Nabavka stalnih sredstava	30
2. Program „Modernizacija cesta u F BiH“	31
3. Projekti JP Ceste F BiH	40
4. Eksproprijacija i elaborati eksproprijacije	62
5. Projekti iz Budžeta F BiH i GSM licence	64
6. Donacije	65
D. ODJEL JAVNE NABAVKE	66
E. PRAVNI I KADROVSKI POSLOVI	67

### U V O D

Na osnovu Zakona o cestama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“ br. 6/02.) u Kantonalnom sudu Sarajevo, registrovano je 2002. godine Javno preduzeće Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, kojoj je data na korištenje i upravljanje magistralna cestovna infrastruktura u F BiH. U skladu sa Zakonom o cestama F BiH („Službene novine F BiH br. 12/10. i 16/12. i 66/13.) promijenjen je naziv u Javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo. Navedena promijena registrovana je kod Općinskog suda Sarajevo, Rješenjem registraciji broj: 065-0-Reg-11-000713 marta 2011. godine. Sjedište Društva je u Sarajevu, na adresi Terezije 54. Na osnovu Odluke Vlade F BiH V broj:562/10 otvoren je Ured u Mostaru. U međuvremenu otvorene su kancelarije u Bihaću, Livnu, Tuzli i Grudama.

Vlada F BiH, u svojstvu osnivača, je dala saglasnost na Plan poslovanja JP Ceste F BiH za 2018. godinu, Odlukom V broj:198/2018. od 8.februara 2018.godine, nakon što je isti usvojio Nadzorni odbor JP Ceste F BiH, a Skupština je potvrdila Odlukom broj: 01-03.2 SK-2705/18 od 04.04.2018.

Plan poslovanja predstavljao je osnov svih aktivnosti, međutim tokom implementacije došlo je do okolnosti koje su bitno uticale na dalju realizaciju Plana, te se Uprava JP Ceste F BiH u sastavu:

- Ljubo Pravdić, direktor,
- Dedo Pjanić, izvršni direktor za tehničke poslove i
- Bekir Isaković, izvršni direktor za ekonomske i pravne poslove,

u skladu sa Statutom preduzeća, odlučila za revidiranje Plana tj. za izradu Rebalansa Plana poslovanja za 2018 godinu. (u daljem tekstu: „Rebalans“). Vlada F BiH je dala saglasnost na isti Odlukom V broj:1297/18 od 08.11.2018.godine. Razlog koji je uticao na izradu Rebalansa je usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 91/2017.), gdje putarina povećana za 0,15 KM/l, (od čega 0,05 KM/l za druge puteve), a namijenjena je za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva. Izmjene Zakona stupile su na snagu početkom 2018. godine. Međutim, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje je na svojoj sjednici, održanoj 10.07.2018.godine usvojio Odluku o privremenoj raspodjeli prihoda, kojom je utvrđeno da od ukupnih prihoda od putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva 10% ostaje na podračunu kod Centralne banke BiH i služit će za poravnanje prihoda po utvrđivanju konačne metodologije raspodjele, a preostalih 90% prihoda podijeljeno je između entiteta i Brčko Distrikta, tako da 59% pripada Federaciji BiH, 39% pripada Republici Srpskoj i 2% Brčko Distriktu. U Federaciji BiH prihod se raspoređuje na osnovu Zakona o cestama F BiH, po kome JP Ceste F BiH pripada 40 % od dobijenih sredstava.

U skladu sa Zakonom o cestama u F BiH, Zakona o javnim preduzećima u F BiH, Statuta JP Ceste F BiH, Zakona o računovodstvu u F BiH, Računovodstvenih politika JP Ceste F BiH usaglašenih sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, koliko je to moguće (u daljem tekstu:“MRS“), Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja („MSFI“) i u skladu sa specifičnostima poslovanja i pravnog statusa JP Ceste F BiH urađen je Izvještaj o poslovanju JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo 2018.godina.

U izvještajnom periodu većina aktivnosti se odvijala u vezi redovnog održavanja magistralnih cesta, gdje je obuhvaćena i zimska služba, zatim na okončanju aktivnosti vezanih za već započete projekte i

eksprijaciju. Neophodno je napomenuti i aktivnosti vezane za Program „Modernizacija cesta F BiH“, koji se finansira iz kreditnih sredstava međunarodnih finansijskih institucija. Najznačajnije aktivnosti bile su usmjerene na nabavku radova i konsultantskih usluga za radove, tehnički nadzor i monitoring okolinskih i socijalnih utjecaja za projekte obuhvaćene Programom „Modernizacije cesta u FBiH“ po međunarodnim procedurama, te na pribavljanju odobrenja za građenje, gdje je potrebno. Ozbiljan problem koji može dovesti do prolongiranja realizacije projekata i nepovlačenja kreditnih sredstava je „prebacivanje“ nadležnosti za izdavanje urbanističkih saglasnosti i odobrenja za građenje između nadležnih institucija na federalnom i kantonalnom nivou.

Spomenuti Program „Modernizacija cesta u F BiH“ sastavljen je od više projekata koji se mogu podijeliti u dvije grupe i to:

- **I grupa** projekti obilaznica i izgradnje cestovnih dionica od strateškog značaja za FBiH/ BiH i projekti izgradnje obilaznica oko gradova; i
- **II grupa** projekti rekonstrukcije postojećih cesta i kolovozne konstrukcije: korekcija osovina, izgradnja trećih traka za spora vozila, rehabilitacija/ rekonstrukcija mostova i tunela, rehabilitacija/ rekonstrukcija crnih tačaka i opasnih mjesta i dr.

Program „Modernizacija cesta u F BiH“ finansira se iz dugoročnih kredita međunarodnih razvojnih banaka, a dijelom i vlatitim sredstvima JP Ceste F BiH (troškovi eksprijacije, PDV). Finansijski plan, zasnovan na odobrenim iznosima kredita za podršku programu „Modernizacija cesta u FBiH“, naveden je u nastavku:

1. Evropska investicijska banka (EIB), kredit br. 82137 – 50 mil.EUR
2. Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), kredit br. 47461– 65 mil.EUR
3. Svjetska banka (WB) Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD), kredit br. 8640 58 mil.EUR

Realizacija programa predviđena je u četverogodišnjem periodu, počev od 2017 godine. Implementacija Programa je započela u 2018.godini, zbog kašnjenja u ispunjavanju uvjeta za efektivnost kredita. Kredit Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) efektivan je od 4.10.2017 godine i uvjeti za povlačenje prve tranše EIB kredita su ispunjeni. Međutim, EBRD zajam još nije efektivan. Naime, još nije ispunjen uvjet koji prethodi efektivnosti, a to je usvajanje legislative na nivou FBiH koja osigurava da godišnje alokacije sredstava od naknada za naftu i naftne derivate za JP Ceste F BiH nisu manje od alokacija utvrđenih Zakonom o cestama FBiH od 15.3.2010.

JP Ceste F BiH u 2018 godini su ostvarile ukupan javni prihod od 89,13 mil.KM, što je 1% više od planiranih 88,13 mil.KM, a javni rashodi su realizovani sa 51,09 mil.KM, ili 96% od planiranih 53,01mil.KM.

Razlika javnih prihoda i javnih rashoda JP Ceste F BiH iznosi 38,08 mil.KM i predstavlja finansijski rezultat koji je neoporeziv. Iskazani finansijski rezultat ne može biti predmet ponovne raspodjele na dividendu ili povećanje kapitala. Prema Zakonu o cestama F BiH, finansijski rezultat se raspoređuje na obaveze prema planiranoj namjeni. Ovako stvorene obaveze predstavljaju izvor sredstava koji će se utrošiti isključivo za dospjele obaveze po kreditima Programa „Rehabilitacija cesta u F BiH“, zatim upravljanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu magistralnih cesta.

Program „Rehabilitacija cesta u F BiH“ je okončan 2013.godine, a finansiran je iz kreditnih sredstava međunarodnih finansijskih institucija na osnovu Ugovora o zajmu broj: 37543 između Bosne i Hercegovine i EBRD i Sporazuma o podršci zajmu između BiH i EBRD, zaključenih 17.7.2007.

godine na 45mil.EUR, sa periodom otplate od 12 godina, uključujući tri godine perioda odgode. Također, Ugovorom o zajmu broj: 23924 između BiH i EIB-a definisan je period otplate tranši kredita. Otplata kredita WB je otpočela 2017. godine. U izvještajnoj godini JP Ceste F BiH su realizovale 16,70 mil.KM od 16,95 mil.KM planiranih sredstava za otplatu pristiglih rata kredita.

U investicije je uloženo 24,92 mil.KM, od čega 7,02 mil.KM vlastitih sredstava, 17,25mil.KM, kreditnih sredstava iz Programa „Modernizacija cesta u F BiH“ i 0,65 mil.KM sredstava Budžeta F BiH. Naime, Vlada F BiH je 20.07.2017.godine donijela „Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Vlade F BiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija“, V broj: 1043/2017. u svrhu eksproprijacije vezane za projekat „Izgradnja ceste Neum - Stolac“.

Vlada F BiH je donijela „Odluku o usvajanju Programa utroška dijela sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima-transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ u iznosu od 107.000.000 KM utvrđenih Budžetom F BiH za 2018 godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija“, od čega 7,00 mil.KM je namijenjeno za izgradnju južne obilaznice Mostara. Realizacije sredstava, u izvještajnoj godini, nije bilo.

Na osnovu Odluke Vlade F BiH broj: 233/05, JP Ceste F BiH su bile angažovane na LOT – 2C projekta Sarajevska obilaznica koji se u poslovnim knjigama JP Ceste F BiH vodi van-bilansno. Vlada F BiH, će izvršiti prenos na krajnje korisnike, odnosno upravitelje.

Nabavke roba, usluga i radova, finansiranih iz sredstava JP Ceste F BiH, obavljale su se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, a nabavke istih iz međunarodnih kreditnih sredstava po međunarodnim procedurama kreditora.


U nastavku Izvještaja dat je detaljan prikaz javnih prihoda, rashoda, investicija (sve u KM-ovima) kao i ostale aktivnosti koje su JP Ceste F BiH provodile tokom izvještajnog perioda perioda.

**A. I JAVNI PRIHODI**

Red Br.	OPIS	Šifra naknade	Realizovano 01.01.- 31.12.2017.	Plan 2018.	Rebalans Plana 2018.	Realizovano 01.01.- 31.12.2018.	Index 7/6	Index 7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Naknade od:</b>		<b>69.109.343</b>	<b>73.400.000</b>	<b>87.274.000</b>	<b>88.245.029</b>	<b>101</b>	<b>128</b>
1.1	Nafte i naftnih derivata	717131 717114	38.340.151 -	40.900.000	39.700.000 14.974.000	41.880.799 14.558.361	105 97	109 -
1.2	Registracije – putarine – fizička lica	722532	16.187.427	17.000.000	17.000.000	16.642.153	97	103
1.3	Registracije – putarine – pravna lica	722531	7.570.807	8.000.000	8.200.000	8.205.373	100	108
1.4	Službe “Pomoć-informacije na cestama“	722535	4.903.555	5.200.000	5.200.000	5.094.481	98	104
1.5	Korištenja cestovnog zemljišta	722538	1.499.709	1.600.000	1.600.000	1.195.033	75	80
1.6	Vanrednih prevoza	722536 722534	381.459	400.000	400.000	552.219	138	145
1.7	Prekomjerne upotrebe cesta (vage)	722537	226.235	300.000	200.000	116.610	58	52
<b>2.</b>	<b>Druga sredstva osigurana po posebnim propisima</b>		<b>506.800</b>	<b>700.000</b>	<b>655.000</b>	<b>517.727</b>	<b>79</b>	<b>102</b>
2.1	Reklamni panoi	722539	343.801	470.000	470.000	371.609	79	108
2.2	Kamate	722565	49.502	70.000	50.000	40.495	81	82
2.3	Saglasnosti	722565	112.697	160.000	130.000	100.801	78	89
2.4	Tenderi	722565	800	-	5.000	4.822	96	603
<b>3.</b>	<b>Naknadno utvrđeni prihodi</b>		<b>1.731.442</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>403.489</b>	<b>202</b>	<b>23</b>
	<b>UKUPNO</b>		<b>71.347.585</b>	<b>74.200.000</b>	<b>88.129.000</b>	<b>89.166.245</b>	<b>101</b>	<b>125</b>

Ostvaren je ukupan javni prihod u iznosu od 89,17 mil.KM, što je više za 1% ili 1,04 mil.KM u odnosu na Rebalansom planirana sredstva. Izmjene Zakona o akcizama u BiH, koje su stupile na snagu početkom godine, uticale su na povećanje prihoda iz naknada od nafte i naftnih derivata za 47% ili 18,10 mil.KM u odnosu na prethodnu godinu. Putarine/registracije za fizička i pravna lica su ostvarene u iznosu od 24,85 mil.KM što je 98,60% od planiranih 25,20 mil.KM, a prihod od službe pomoć informacije je ostvaren u iznosu od 5,09 mil.KM ili 98% od planiranih 5,20 mil.KM. Od ostalih prihoda, jedino je planirani prihod od 0,40 mil.KM za vanredni prevoz realizovan sa 0,55 mil.KM ili 38% više od planiranih sredstava, dok su ostali prihodi: od korištenja zemljišta u cestovnom pojasu, prekomjerne upotrebe cesta, postavljenih reklamnih panoa u cestovnom pojasu, kamata, saglasnosti i tendera - realizovani u manjem iznosu od planiranih sredstava.

Naknadno utvrđen prihod realizovan je u iznosu od 0,40 mil.KM, što je 102% više od planiranih 0,20 mil.KM, a 77% je manji u odnosu na prethodnu godinu.

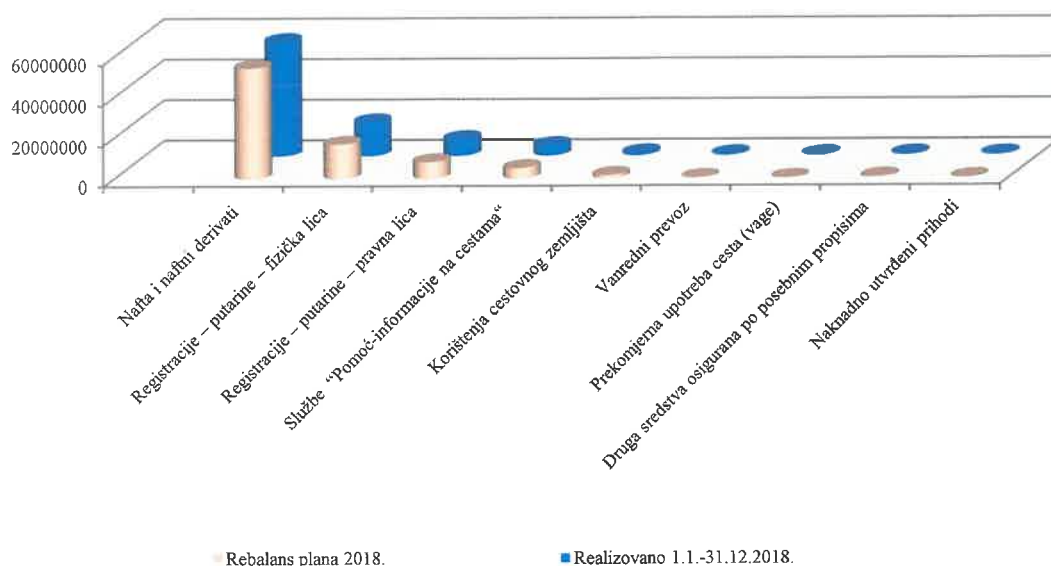


Grafikon prikazuje visinu planiranih i realizovanih prihoda

## 1. Naknade – učesće u strukturi javnih prihoda


98,97 %

**1.1. od nafte i naftnih derivata** – Na osnovu Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 49/09. 49/14. i 60/14.) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH („Službeni glasnik BiH“, br.91/17.) putarina, kao vrsta indirektnog poreza, plaća se na naftne derivate u iznosu od 0,15 KM/ l za puteve na Jedinствен račun Uprave za indirektno oporezivanje. Na osnovu Pravilnika o izračunavanju koeficijenta doznačavanja sredstava entitetima i Distriktu Brčko, te Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, propisana je raspodjela i pripadnost javnih prihoda. JP Ceste F BiH, zajedno sa kantonalnim direkcijama za puteve u F BiH, pripada iznos od 3,9 % u odnosu na visinu predviđenih sredstava od čega, na osnovu Zakona o cestama u F BiH, JP Ceste F BiH pripada 40%. Po ovom osnovu realizovan je prihod u iznosu od 41,88 mil.KM što je 2,18 mil.KM više u odnosu na planiranih 39,70 mil.KM. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama BiH uvedena je putarina u iznosu od 0,25 KM/l, također kao vrsta indirektonog poreza, za izgradnju autoputeva i za izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva, od čega se 0,20 KM/l odnosi na autoceste, a 0,05 KM/l za izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva. Naplaćeni prihod po ovom osnovu vodi se na posebnom podračunu otvorenom kod Centralne banke BiH, u skladu sa Zakonom o uplatama na Jedinствен račun i raspodjelom prihoda, a raspodjela prihoda se vrši na osnovu Odluke o privremenoj raspodjeli prihoda od putarine koju je donio Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje. Dio putarine koja pripada F BiH se dijeli prema Zakonu o cestama F BiH (40% pripada JP Ceste F BiH), a realizacija, po ovom osnovu, ostvarena je u iznosu od 14,56 mil.KM, je otpočela u mjesecu julu 2018. godine, sa jednomjesečnim uplatama. Znači, ukupan prihod od naknada iz nafte i naftnih derivata ostvaren je sa 56,44 mil.KM, što je za 18,10 mil.KM, više u odnosu na prethodnu godinu.

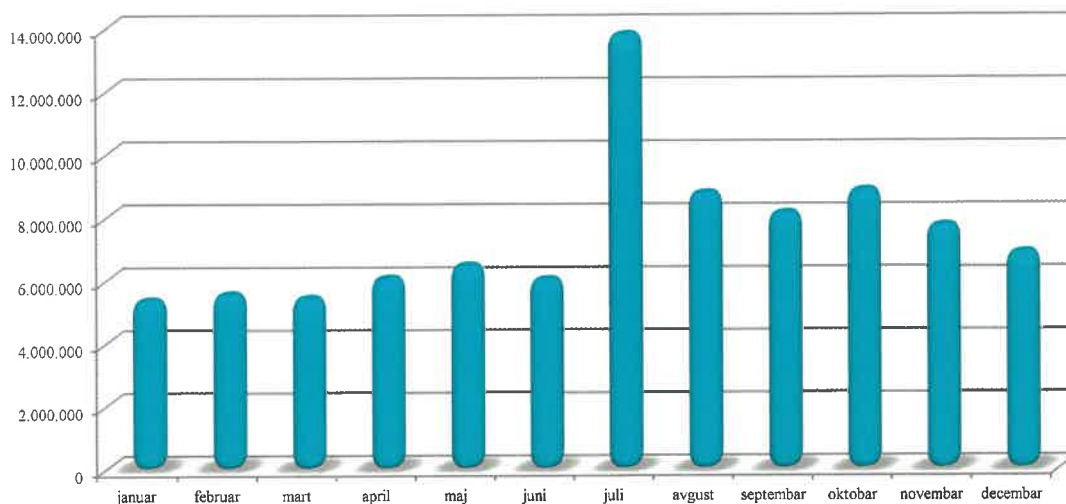

Grafički prikaz ostvarenja prihoda po osnovu naknade iz nafte i naftnih derivata (717131 i 717114)

**1.2 i 1.3 putarine za fizička i pravna lica** – „Uredbom o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila“, V broj: 202/2015, regulisana je naknada. Od planiranih 25,20 mil.KM realizovano je 24,85 mil.KM, što je 0,35 mil.KM manje u odnosu na predviđena sredstva. Putarina za fizička lica je realizovana sa 16,64 mil.KM od planiranih 17,00 mil.KM, dok je putarina pravnih lica realizovana sa 8,21 mil.KM od planiranih 8,20 mil.KM.

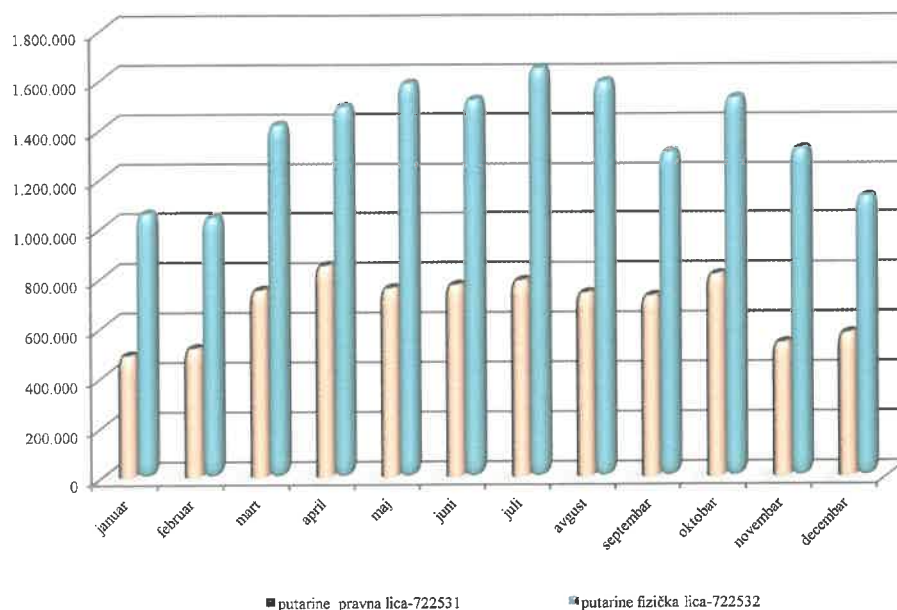

Grafički prikaz visine ostvarenih prihoda po mjesecima za putarine – fizička i pravna lica



**1.4 službe “Pomoć-informacije na cestama”-** Služba “Pomoć-informacije” predstavlja pružanje tehničke pomoći motorizovanim učesnicima u saobraćaju na javnim cestama, uklanjanje sa javnih cesta oštećenih vozila i vozila u kvaru, davanje informacija o stanju prohodnosti cesta i pružanje druge pomoći. Na osnovu člana 88. i 100. Zakona o cestama F BiH i Odluke Vlade Federacije BiH V broj: 45/11. („Službene novine Federacije BiH“, br: 5/11.) regulisana je ova vrsta naknade. Prihod po ovoj naknadi ostvaren je u iznosu od 5,09 mil.KM

**1.5. za korištenje cestovnog zemljišta** – regulisana je Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika za korištenje cestovnog zemljišta broj:08-02-2-806/15 i Uredbom o izmjeni i dopunama visine naknade za korištenje zemljišta uz javni pojas, V broj: 956/2015, usvojenim od strane Vlade F BiH. Spomenutim Pravilnikom uvedene su izmjene, na osnovu kojih je JP Ceste F BiH, po ovom osnovu umanjjen prihod. Naknada za korištenje cestovnog zemljišta za građenje komunalnih, vodoprivrednih, telekomunikacijskih, elektroenergetskih i drugih objekata se plaća, za prvu godinu, u punom obračunskom iznosu, a za svaku narednu godinu 30%, obračunskog iznosa prve godine korištenja, dok se ranije plaćalo 50%. Istim Pravilnikom uvedena je odredba da se na dionicama magistralnih i regionalnih cesta koje prolaze kroz *gradove* naknada za korištenje cestovnog zemljišta ne naplaćuje, što je imalo za posljedicu ukidanje rješenja za zakup zemljišta na dionicama koje prolaze kroz gradove. Uvedene izmjene i nove odredbe naknada za korištenje cestovnog pojasa su prouzrokovale pad prihoda po ovom osnovu. Od planiranih 1,60 mil.KM realizovano je 1,20 mil.KM. Treba napomenuti da potraživanja po ovom osnovu iznose 1,53 mil.KM od toga iz 2018 godine 0,38 mil.KM, a iz ranijeg perioda 1,15 mil.KM. Najveći, dužnici sa utuženim iznosima su: Media Res d.o.o. Mostar (195.220 KM); Petrol d.d. Ljubuški (92.161KM); Trgo Santovac d.o.o. Srebrenik (61.681 KM); Kasumović Fuad i Mersija (33.412 KM); Buba Commerce d.o.o. Vitez (32.696 KM); Zovko Oil d.o.o. Žepče (31.491 KM); Europlakat BH d.o. Sarajevo (30.946 KM); Ves d.o.o. Žepče (27.041 KM); TGT Tragtas d.o.o.Sarajevo (25.915 KM); Mustapić Frigo d.o.o. Široki brijeg (24.047 KM); OS-Petrol d.o.o. Srebrenik (23.178 KM); Općina Posušje (19.739 KM); Prestiž d.o.o. Posušje (19.396 KM); Termoglas d.o.o. Velika Kladuša (18.254 KM); Sisko Trade d.o.o. Gračanica (18.050KM) itd...

**1.6. i 1.7. od vanrednih prevoza i prekomjerne upotrebe cesta (vage)** – U skladu sa Zakonom o cestama u F BiH, Pravilnika za utvrđivanje prekomjerne upotrebe javnih cesta i Pravilnika o utvrđivanju uvjeta za obavljanje javnih prevoza vozila na magistralnoj cesti ostvaruje se prihod po ovom osnovu. Vanredan prevoz je realizovan u iznosu od 0,55 mil.KM što je 38% više od planiranih 0,40 mil.KM, dok je prihod od prekomjerne upotrebe cesta (vage), ostvaren u iznosu od 0,12 mil.KM ili 58% od planiranih 0,20 mil.KM.

## **2. Druga sredstva – učešće u strukturi javnih prihoda**

**0,58 %**


**2.1 naknada za reklamne znakove (panoi) u cestovnom pojasu** – definisana je Zakonom o cestama F BiH, Pravilnikom o postavljanju reklamnih znakova na cestama i Uredbom o visini naknade za korištenje zemljišta uz javne ceste („Službene novine F BiH“, br: 58/2015). Od planiranih 0,47 mil.KM, realizovano je 0,37 mil.KM ili 79%. Nenaplaćeni prihod iz tekuće godine iznosi 0,09 mil.KM, a iz prethodnog perioda 0,40 mil.KM.

**2.2, 2.3 i 2.4 - naknada za kamate, saglasnosti i tendere** – prihod od kamata, saglasnosti i tendera iznosi 0,15 mil.KM, a planirano je 0,18 mil.KM.

**3. Naknadno utvrđen prihod – učešće u strukturi javnih prihoda**

**0,45 %**

Realizovan je u iznosu od 0,40 mil.KM ili 102 % više u odnosu na planiranih 0,20 mil.KM. Najveću stavku čini ukidanje rezerviranja po započetim sudskim sporovima (0,21 mil.KM), prihod od naplate šteta od osiguravajućih kuća (0,09 mil.KM), pozitivne kursne razlike po osnovu obaveza na kredite {(program “Rehabilitacija cesta u F BiH”) 0,03 mil.KM}, prihod od prodaje automobila i otpada (0,01 mil.KM) i dr.

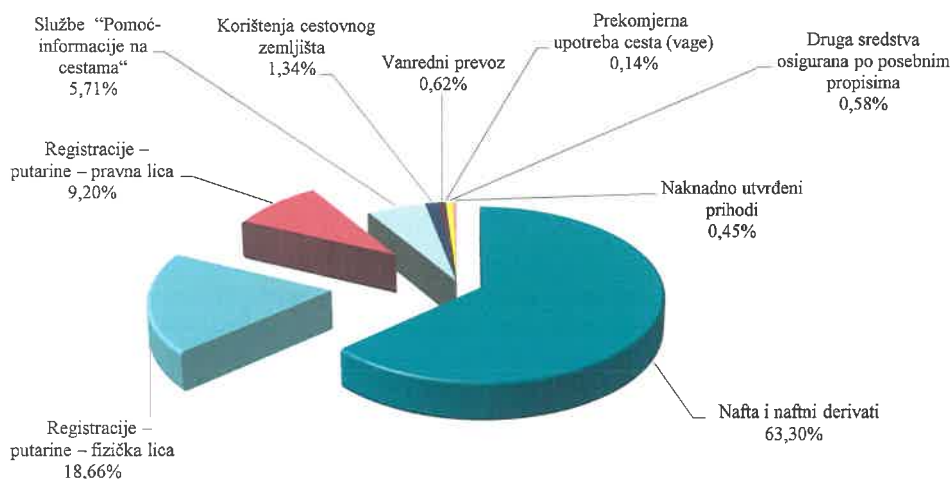

Grafički prikaz strukture ostvarenih prihoda

**A. II AMORTIZACIJA**

Red. Br.	OPIS	Realizovano 01.01.- 31.12.2017.	Plan 2018.	Rebalans Plana 2018.	Realizovano 01.01.- 31.12.2018.	Index 6/5	Index 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Amortizacija stalnih sredstava	810.145	800.000	700.000	601.731	86	74
	<b>UKUPNO</b>	<b>810.145</b>	<b>800.000</b>	<b>700.000</b>	<b>601.731</b>	<b>86</b>	<b>74</b>


*Napomena:* Objašnjenje amortizacije dato na strani 28.

**B. I JAVNI RASHODI**

Red Br.	O P I S	Realizovano 01.01.- 31.12.2017.	Plan 2018.	Rebalans Plana 2018.	Realizovano 01.01.- 31.12.2018.	Index 6/5	Index 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Troškovi poslovanja	4.878.291	5.848.000	5.824.000	5.095.872	87	104
2.	Služba pomoć-informacije	4.568.519	4.830.000	4.830.000	4.803.260	99	105
3.	Redovno održavanje	32.664.342	34.008.000	35.335.200	34.811.010	99	107
4.	Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode	1.050.536	450.000	1.900.000	2.007.652	106	191
5.	Rezervirana sredstva za sudske presude	939.095	950.000	1.400.000	2.197.130	157	234
6.	Troškovi konsultantskih usluga	206.061	713.000	346.000	108.517	31	53
7.	Kamate, servisni troškovi i kursne razlike	1.185.297	3.108.000	3.376.000	2.063.283	61	174
	<b>UKUPNO</b>	<b>45.492.141</b>	<b>49.907.000</b>	<b>53.011.200</b>	<b>51.086.724</b>	<b>96</b>	<b>112</b>

Rashodi su realizovani u iznosu od 51,09 mil.KM, što je 96 % ili 1,92 mil.KM manje od planiranih 53,01 mil.KM. Većina rashoda je realizovana manje ili u okviru planiranih budžeta, izuzev:

- „rezerviranih sredstava za rizike i neplanirane rashode“ kojima je obuhvaćena realizacija preporuka Ureda za reviziju institucija u F BiH, gdje izvršeno preknjižavanje ulaganja iz ranijih godina u rashode perioda kao i rashodi vezani za projekat Sarajevska obilaznica i
- „rezerviranih sredstava za sudske presude“ gdje najveću stavku čini pravno zastupanje pred Međunarodnim arbitražnim sudom Međunarodne privredne komore, u vezi projekta Sarajevska obilaznica

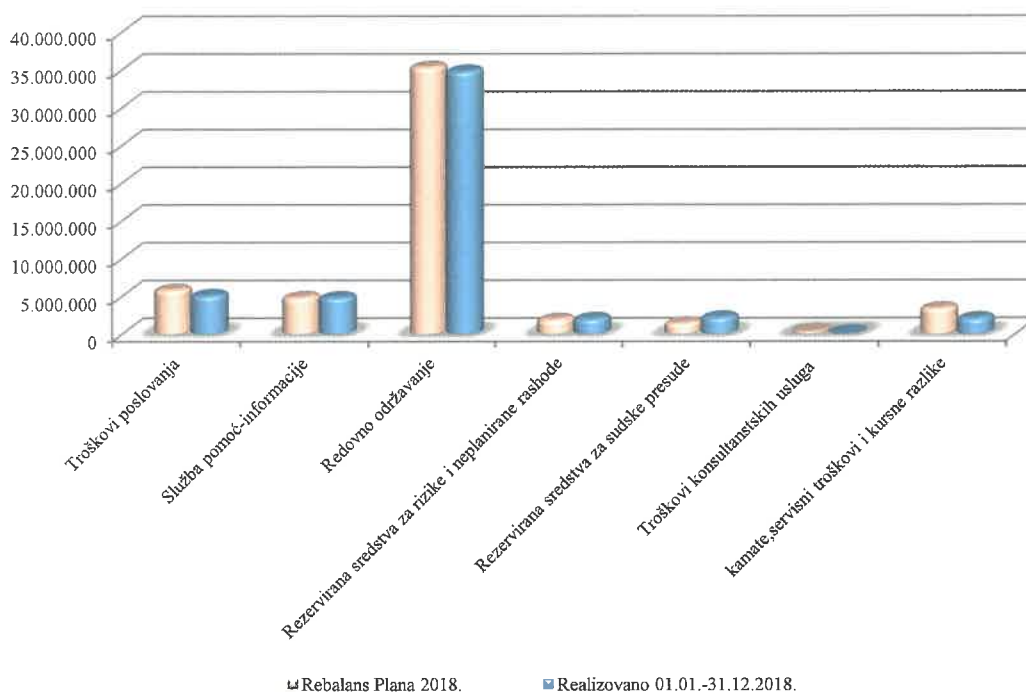

Grafički prikaz visine planiranih i realizovanih javnih rashoda u 2018. godina.

## 1. Troškovi poslovanja

Red. br.	OPIS	Realizovano 01.01.-31.12.2017.	Plan 2018.	Rebalans Plana 2018.	Realizovano 01.01.-31.12.2018.	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I	Troškovi zaposlenih	3.830.246	4.411.000	4.411.000	3.965.873	90
II	Materijalni troškovi i usluge	1.048.045	1.437.000	1.413.000	1.129.999	80
	<b>UKUPNO I+II</b>	<b>4.878.291</b>	<b>5.848.000</b>	<b>5.824.000</b>	<b>5.095.872</b>	<b>87</b>

Troškovima poslovanja obuhvaćeni su troškovi vezani za zaposlene i materijalni troškovi i usluge. Od planiranih 5,82 mil.KM, realizovano je 5,10 mil.KM ili 87% planiranih sredstava.

### I Troškovi zaposlenih

Za troškove zaposlenih, od planiranih 4,41 mil.KM realizovano je 3,97 mil.KM, što je 90% planiranih sredstava. Do manje realizacije je došlo zbog ne usvajanja nove sistematizacije radnih mjesta, kao i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, kojim je propisano da se prijem u radni odnos vrši nakon provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja. Inače, troškovima zaposlenih obuhvaćeni su: troškovi bruto plaća zaposlenih, naknade propisane zakonskim i podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast (naknada troškova prevoza s posla i na posao, naknada za ishranu u toku rada – topli obrok, regres za godišnji odmor).

**II Materijalni troškovi i usluge**

Red. br.	OPIS	Realizovano 01.01.-31.12.2017.	Plan 2018.	Rebalans Plana 2018.	Realizovano 01.01.-31.12.2018.	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1.	kancelarijski i potrošni materijal	48.235	50.000	50.000	42.468	85
2.	električna energija	42.204	50.000	45.000	36.467	81
3.	gorivo i mazivo za automobile	65.792	95.000	95.000	78.419	83
4.	otpis sitnog inventara i auto guma	8.499	16.000	15.000	11.310	75
5.	usluge održavanja, servisiranja i registracije	157.613	210.000	180.000	151.779	84
6.	učešće na sajmovima i seminarima	58.873	55.000	55.000	58.465	106
7.	stručna literatura i časopisi	12.753	20.000	21.000	14.410	69
8.	grijanje	26.930	45.000	40.000	28.402	71
9.	zakupnina	51.056	60.000	63.000	61.602	98
10.	reklama i propaganda	1.801	35.000	35.000	-	-
11.	osiguranje imovine i lica i ljekarski pregledi	33.594	65.000	60.000	45.205	75
12.	bankarske usluge	6.401	10.000	10.000	8.925	89
13.	reprezentacija	31.246	35.000	35.000	31.046	89
14.	naknade za službena putovanja u zemlji	42.657	45.000	55.000	51.452	94
15.	naknade za službena putovanja u inostranstvu	28.644	40.000	50.000	42.481	85
16.	privremeni i povremeni poslovi, ugovori o djelu	5.064	30.000	30.000	25.068	84
17.	bruto naknade za članove Nadzornog odbora	78.202	77.000	77.000	74.941	97
18.	održavanje čistoće	47.100	50.000	50.000	44.186	88
19.	obezbjeđenje zgrade	8.066	11.000	11.000	10.557	96
20.	PTT usluge	102.845	100.000	110.000	104.364	95
21.	komunalne usluge	15.778	20.000	15.000	13.632	91
22.	stručno osposobljavanje	0	5.000	5.000	6.282	126
23.	tenderi, konkursi i oglasi	22.787	40.000	40.000	22.905	57
24.	takse	18.501	30.000	30.000	29.404	98
25.	advokatske usluge i trošk. vještačenja	2.418	60.000	50.000	11.169	22
26.	troškovi eksterne revizije	17.527	20.000	28.000	16.325	58
27.	troškovi Odbora za reviziju	32.353	34.000	34.000	33.277	98
28.	ostali troškovi poslovanja	30.004	50.000	50.000	25.031	50
29.	kamate i kursne razlike	0	1.000	1.000	7	1
30.	naknadno utvrđeni rashodi	29.502	50.000	50.000	28.062	56
31.	troškovi koji ne zavise od finansijskog rezultata	21.518	28.000	23.000	22.358	97
32.	troškovi ulaganja u tuđe građevinske objekte	82				
	<b>UKUPNO II</b>	<b>1.048.045</b>	<b>1.437.000</b>	<b>1.413.000</b>	<b>1.129.999</b>	<b>80</b>

Materijalni troškovi i usluge su realizovani u iznosu od 1,13 mil.KM, što je 80 % od planiranih 1,41 mil.KM. Većina troškova manje je realizovana od planiranih sredstava. Troškovi koji su prekoračili planirane budžete odnose se na „učešće na sajmovima i seminarima“, gdje su obuhvaćeni troškovi učešća JP Ceste F BiH na sajmu u Mostaru, Bihaću i Tešnju, kao i učešće radnika JP Ceste F BiH na edukativnim seminarima, vezanih za izmjene zakonskih regulativa. Stručnim osposobljavanjem obuhvaćeni su troškovi ispita radnika, neophodnih za izvršavanje radnih aktivnosti.

### 2. Služba "Pomoć – informacije na cestama"

Služba «Pomoć-informacije» na cestama F BiH (u nastavku „SPI“) povjerena je kao javno ovlaštenje JP Ceste F BiH po odredbama člana 100. stav 2. Zakona o cestama F BiH, a posebna naknada za SPI regulisana je na osnovu člana 88. tačke 5. i člana 100. stav 3 Zakona o cestama F BiH i Odluke o službi „Pomoć-informacije“ (Vlada Federacije BiH, od 20. januara 2011. godine).

Po osnovu člana 100. stav 2 Zakona o cestama F BiH, člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH («Službeni glasnik BiH» br. 39/14), a u skladu sa uslovima definisanim Dokumentima ponude uz objavljeni Javni oglas za izbor najpovoljnije ponude za obavljanje poslova SPI na cestama F BiH i na osnovu provedenog otvorenog postupka, za period: od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine, te na osnovu Okvirnog sporazuma i Odluke o dodjeli ugovora za obavljanje usluga SPI na javnim cestama u F BiH su sklopljeni ugovori za 2018. godinu sa:

- **Auto moto savezom u Bosni i Hercegovini** (skraćeni naziv **AMS u BiH**) Mostar za obavljanje poslova «Pomoć-informacije» na području: Posavskog kantona (1 vozilo), Kanton Središnja Bosna (3 vozila), Hercegovačko-neretvanskog kanton (3 vozila), Zapadnohercegovačkog kantona (2 vozila) i Kanton 10 (2 vozila), i
- **BIHAMK** (Bosanskohercegovački auto-moto klub) Sarajevo za obavljanje poslova «Pomoć-informacije» na području: Unsko-sanskog kantona (4 vozila), Tuzlanskog kantona (5 vozila), Zeničko-Dobojskog kantona (4 vozila), Bosansko-podrinjskog kantona (1 vozilo), Srednjo-bosanskog kantona (2 vozila), Hercegovačko-neretvanskog kantona (4 vozila) i Kantona Sarajevo (5 vozila + 1 vozilo-spec. vozilo «rescue car»).

Ugovorom je definisano da se isplata vrši prema mjesečnim privremenim obračunskim situacijama nakon izvršene kontrole od strane uposlenika JP Ceste F BiH. Nadzor nad radom Službe «Pomoć-informacije» obavlja ovlašteno lice JP Ceste F BiH tako što vrši kontrolu privremenih obračunskih situacija, odnosno dnevnika informisanja i dnevnika pomoći na cesti za svaku bazu SPI. Planskim obilaskom baza SPI i putem nadzora pružanja intervencija na terenu kontroliše se na licu mjesta rad uposlenika SPI (izgled izvršioca i vozila, opremljenost, urednost vođenja dnevnika, tehnika pružanja pomoći i sl.), te se zapisnički konstatuje nađeno stanje.

Za svaku akciju iz Programa prometno - preventivnih aktivnosti izdaje se odobrenje, a na osnovu zahtjeva u kojem stoji šta će se raditi, od kada do kada, gdje, koliko će sudionika i vozila biti uključeno. Nakon završetka akcije, u okviru obračunske situacije, kontroliše se izvještaj koji sadrži navedene elemente i finansijski dio (strukturu i specifikaciju svih troškova sa računima za izvršene usluge i nabavke).

Prema dostavljenim mjesečnim obračunskim situacijama tokom 2018. godine ostvaren je slijedeći obim poslova i prihod po osnovi naknade za poslove SPI:

R. br.	Izvršitelj usluga SPI	Vrijednost situiranih radova	Prispjela sredstva	% umanjeno po osnovu člana 5. Ugovora **	Obaveza Razlika (2-3)	Vrijednost situiranih radova	Razlika (4-5) *
		2017.godina	2018. godina				
	1		2	3	4	5	6
1	BIHAMK Sarajevo	3.633.012	4.053.141	231.694	3.821.447	3.667.235	154.212
2	AMS U BIH Mostar	927.294	1.041.340	59.527	981.813	968.446	13.367
3	<b>UKUPNO</b>	<b>4.560.306</b>	<b>5.094.481</b>	<b>291.221</b>	<b>4.803.260</b>	<b>4.635.681</b>	<b>167.579</b>

*Pregled obima poslova i prihoda po osnovu naknade za poslove SPI*

\* Po osnovu godišnjeg obračuna vrijednost situiranih radova u 2018. godini za SPI je bio manji za :

- 154.212 KM kod BIHAMK-a, i
- 13.367 KM kod AMS u BIH

pa će taj dio razlike novčanih sredstava biti uvećan AMK-a u situaciji za februar 2019. godine.

\*\* Procentualno umanjeno iz kolone 4 se vrši na osnovu Odluke o visini naknade za troškove implementacije iz sredstava za poslove „Pomoć – informacije“ na cestama (odluka Nadzornog odbora broj : 01-03.2-NO-6835-6/07 od 17.12.2007. godine), a po godišnjem obračunu za 2018. godinu, u iznosu od 5,7164 % (ovaj procenat predstavlja udio SPI u ukupnim prihodima po konačnom obračunu JP Ceste F BiH).

Za navedene i izvršene poslove SPI u F BiH, tokom 2018. godine, utrošena su ukupna sredstva kako slijedi:

- Pomoć na cesti	3.555.297 KM
- Informiranje	670.682 KM
- Prometno-preventivne aktivnosti	409.702 KM
<b>U K U P N O</b>	<b>4.635.681 KM</b>

Zaključno, BIHAMK i AMS u BIH su poslove pomoći na cesti, informisanja i prometno-preventivnih aktivnosti izvršili u potpunosti s obzirom na priliv finansijskih sredstava.

## 2. Redovno održavanje cesta

Prema Zakonu o cestama u F BiH i Pravilniku o održavanju javnih cesta, održavanje cesta čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tokom većeg dijela godine ili cijele godine na cestama, uključujući i sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti, tehničke ispravnosti i sigurnosti prometa na cestama. U redovno održavanje cesta uključeni su i radovi održavanja cesta i objekata u zimskim uslovima.

Procedura postupka javne nabavke za potpisivanje novih sporazuma za naredni četverogodišnji period je pokrenuta u ljeto 2012. godine, i za 11 od 12 LOT-ova, potpisani su okvirni sporazumi sa izvođačima radova za period 01.09.2014. - 31.08.2018., te jednogodišnji ugovori za period 01.09.2017. - 31.08.2018. Za LOT 11 (magistralne ceste na području Herceg-Bosanskog kantona - regija Livna), zaključen je Okvirni sporazum po principu «Dobro izvršenje radova održavanja» (pilot projekat) u skladu sa preporukama Svjetske banke. Sporazum je sklopljen za period 01.09.2014. - 31.08.2018. godine.

Za LOT 7 (dio magistralnih cesta u HNK) postupak nabavke je poništen od strane Ureda za razmatranje žalbi. Nakon provedenih pregovaračkih postupaka, potpisani su ugovori za izvođenje radova na LOT-u 7 za period 01.09.2017.-15.03.2018. godina, te nakon toga i za period 15.03.2018.-31.08.2018. godine.

Na LOT 3, LOT 9 i LOT 12 došlo je do povećanja dužine cesta zbog prekategorizacije tri dionice iz regionalnih u magistralne ceste. Radi se o dionicama: M-17.4 Mostar – Ljubuški - Crveni Grm, M-1.9 Gradačac - Ormanica i M-14.2 Odžak – Šamac - Orašje za koje je preuzeto redovno održavanje krajem 2016. godine.

Zbog značajnog povećanja dužine mreže cesta u toku potpisanog četverogodišnjeg sporazuma na LOT-u 9, ugovorena sredstva za preostali period trajanja Okvirnog sporazuma su se pokazala nedovoljna za planirane radove redovnog održavanja u 2018. godini. Nakon provedenog pregovaračkog postupka, novi Ugovor za izvođenje radova na LOT-u 9 je potpisan za period 01.02.2018. - 31.08.2018. godina.

Da bi se nastavio kontinuitet radova redovnog održavanja i nakon isteka važećih okvirnih sporazuma (31.08.2018.) pripremljena je nova tenderska dokumentacija za ugovaranje radova redovnog održavanja za naredni četverogodišnji period 2018. – 2022. godina. Postupak nabavke je pokrenut u junu 2018. godine. Nakon uloženih žalbi na tender dokumentaciju, od strane pojedinih ponuđača, postupak nabavke je poništen rješenjem URŽ-a od 28.08.2018. godine.

Ponovni postupak javne nabavke sa Tender dokumentacijom usklađenom sa Rješenjima URŽ-a, pokrenut je dana 15.10.2018. godine.

Na osnovu Zaključka Vlade F BiH V broj: 972/18 od 24.07.2018. Okvirni sporazum o uvjetima i načinu izvođenja radova redovnog održavanja magistralnih cesta na LOT-ovima navedenim u donjoj tabeli, su produženi sa istim izvođačima radova do okončanja postupka nabavke za naredni period. Na osnovu ovog zaključka, ugovoreno je redovno održavanje magistralnih cesta za svih 12 LOT-ova na period 01.09.2014. - 15.03.2019. godine, odnosno do okončanja postupka javne nabavke.

Za period od 1.1.2018. - 15.3.2018. godine za sve magistralne ceste na području F BiH vrijednost radova utvrđena je kao pripadajući dio ukupnih troškova utvrđenih Operativnim programom zimske službe 2017./18. godine (15.11.2017. - 15.3.2018.).

Obim i vrsta radova redovnog održavanja za period 16.3. - 14.11.2018. godine procijenjena je na osnovu praćenja statističkih podataka iz prethodnih godina, vodeći računa da se prioritetno izvršavaju radovi na čišćenju i sanaciji kolovoza, ophodnji cesta, obnavljanju horizontalne i vertikalne prometne signalizacije i cestovne opreme, regulisanju odvodnje, košenju cestovnog pojasa i poboljšanju preglednosti, održavanju bankina, bermi, kosina usjeka i nasipa, održavanju objekata, potpornih i obložnih zidova, sve u skladu sa potrebama cesta i Pravilnikom o održavanju javnih cesta. Vrijednost planiranih radova je procijenjena na osnovu važećih jediničnih cijena u postojećim ugovorima redovnog održavanja.

Rebalansom Plana, predviđeno je povećanje ukupnih sredstava za redovno održavanje za cca 200.000 KM, a prema ukazanim potrebama na pojedinim lokalitetima, te izvršeno usklađivanje sa novim ugovorima i dosadašnjom realizacijom redovnog održavanja po pojedinim LOT-ovima.

Rebalansom Plana, predviđeno je povećanje ukupnih sredstava zimsku službu za cca 0,70 mil. KM. Iako pojedinačni jednogodišnji ugovori nisu prekoračeni, zbog vremenskih prilika srazmjerno veći dio planiranih troškova zimske službe za 2017-2018 godinu je realizovan u prva tri mjeseca 2018 godine (cca 7,40 mil.KM), uz prognozirane troškove za 11 i 12 mjesec 2018. godine (cca 4,20 mil. KM).

U periodu od 01.01.2018. - 15.03.2018. godine odnosno od 15.11. - 31.12.2018 godine kad se



## JP CESTE FEDERACIJE BIH

prema Pravilniku uspostavlja zimska služba na mreži magistralnih cesta u F BiH, formirano je dežurstvo na punktovima zimske službe, te izvršavani poslovi prema Operativnom planu zimske službe: čišćenje snijega i sprječavanje poledice na kolovozu, ulazno-izlaznim trakama, objektima i proširenjima kolovoza, obilježavanje širine planuma ceste rubnim motkama, nabavka, preuzimanje i deponovanje posipnog materijala (sol i abrazivni materijal), uklanjanje osulinskog i drugog materijala sa kolovoza, uklanjanje vozila koja ometaju promet, osiguranje odvodnje u vrijeme padanja kiše i otapanja snijega, sprječavanje izlivanja vode na kolovoz, održavanje kolovoza i prometne signalizacije u ispravnom stanju, postavljanje znakova II-46 „obavezna upotreba zimske opreme“ na pogodnim mjestima na ulazu u područje F BiH i pred usponima, informiranje o stanju prohodnosti cesta i druge mjere i aktivnosti u cilju stvaranja uslova za sigurno odvijanje prometa.

Nakon završetka zimske službe i obračuna radova na zimskom održavanju za sezonu 2017-2018 godina, zbog povoljnih vremenskih prilika, odnosno ispodprosječnih sniježnih padavina na nekim područjima FBiH, pokazalo se da su na pojedinim ugovorima planirana ukupna sredstva za zimsku službu ostala neutrošena u visini od cca 1,50 miliona KM (oko 15 % planirane vrijednosti). Uz saglasnost Uprave JP Ceste FBiH dio neutrošenih sredstava zimske službe je iskorišten za neophodne radove redovnog održavanja cesta.

Prema potpisanom Sporazumu, učešće JP Ceste FBiH u održavanju pružnih prelaza na cesti M-14 Bihać - Bosanska Krupa iznosi 50% vrijednosti radova, a učešće JP Ž F BiH 50%. Na osnovu ovog Sporazuma u 2018. godini su planirana sredstva za sanaciju tri pružna prelaza. Tokom 2018. godine, JP Željeznice FBiH su izvršile i fakturisale održavanje sedam pružnih prelaza. Ugovor o održavanju sedam putnih prijelaza potpisan je 16.05.2018. (01-02.2-3904/18.) na iznos 8.096 KM, a realizovan je dio, u iznosu od 3.424 KM. Ugovor se odnosi na slijedeće putne prijelaze: „Čuvarnica br:13,14,15,16,17 i Blok III Bihać ind.“ pravac Bosanski Novi-Martin Brod.

Pregled ugovora redovnog održavanja magistralnih cesta za period  
01.09.2017. - 31.08.2018. i 01.09.2018-31.08.2019. g.

Red.br	LOT	Izvođač	Vrijednost Okvirnog sporazuma za period 01.09.2014.-15.03.2019.	broj ugovora	Vrijednost ugovora potpisanog za period 01.09.2017.-31.08.2018	broj ugovora	Vrijednost ugovora potpisanog za period 01.09.2018.-15.03.2019.
1.	LOT1	Rad-putevi Bihać	9.551.922	01-02.2-7861/17.	2.396.927	01-02.2-7462/18.	1.259.466
2.	LOT2	Kov-grad Bužim	7.537.036	01-02.2-7862/17.	1.990.988	01-02.2-7463/18.	1.049.638
3.	LOT3	Konz: Jata-group, Srebrenik,HIH Živinice,	14.624.982	01-02.2-7836/17.	3.905.911	01-02.2-7464/18.	1.785.756
4.	LOT4	Dobojputevi Doboj jug	7.868.100	01-02.2-7864/17.	2.059.434	01-02.2-7465/18.	879.258
5.	LOT5	Rudnici gipsa Donji Vakuf	7.299.910	01-02.2-7865 /17.	2.099.727	01-02.2-7466/18.	889.343
6.	LOT6	Goraždeputevi Goražde	4.983.332	01-02.2-7866/17.	1.261.982	01-02.2-7467/18.	589.821
7.	LOT7*	PZP Mostar		01-02.2-9298/17.	922.750*	01-02.2-7479/18.	716.841
				01-02.2-2512/18	875.003		
8.	LOT8	Sarajevoputevi Sarajevo	8.461.968	01-02.2-7867/17.	2.289.577	01-02.2-7468/18.	1.050.054
9.	LOT 9**	Ceste Mostar	2.802.890	01-02.2-7868/17	201.440	01-02.2-7469/18.	387.426
				01-02.2-1217/18	729.980		
10.	LOT10	Ceste Mostar	9.207.698	01-02.2-7869/17.	1.788.680	01-02.2-7470/18.	1.319.772
11.	LOT11	Ceste Mostar	20.148.894	01-02.2-7870/17.	5.356.829	01-02.2-7471/18.	2.608.857
12.	LOT12	Ceste Mostar	13.295.115	01-02.2-7871/17.	3.468.951	01-02.2-7472/18.	1.189.375
	<b>UKUPNO</b>				<b>29.348.179</b>		<b>13.725.607</b>

**Napomena:**

\*Na LOT-u 7 ugovor sa PZP Mostar potpisan je za period 01.09.2017.-15.03.2018, odnosno do završetka postupka nabavke. Pregovarački postupak je proveden za radove redovnog održavanja na LOT-u 7, pa je potpisan novi ugovor za period 16.03.2018. do 31.08.2018. tj. do okončanja ostalih ugovora.

\*\*Na osnovu Odluke Vlade F BiH V broj: 1020/2016. regionalna cesta R-464 Orašje-Šamac-Odžak razvrstana je u magistralnu cestu sa oznakom M-14.2. Finansijska sredstva ugovorena po Okvirnom sporazumu, su isplaćena sa 31.01.2018. godine, pa je proveden pregovarački postupak za nastavak radova do 31.08.2018. godine, tj do okončanja ostalih ugovora.

**Realizacija radova redovnog održavanja magistralnih cesta:**

LOT	Mag. Cesta	Dužina u km	Dionice magistralnih cesta	Realizovano 01.01.-31.12.2017.			Plan 2018.			Rebalans Plana 2018.			Realizovano 01.01.-31.12.2018		
				Redovno održavanje	Zimska služba	Ukupno	Redovno održavanje	Zimska služba	Ukupno	Redovno održavanje	Zimska služba	Ukupno	Redovno održavanje	Zimska služba	Ukupno
1	M5	111,894	(gr.Hrvatske) Izčić-Bihać-Ključ-Velečevo(gr.ent)												
	M11	8,526	Ripač-Uzjebiće(gr.Hrvatske)	1.357.436	968.894	2.326.330	1.450.000	1.050.000	2.500.000	1.390.000	1.120.000	2.510.000	1.454.119	968.092	2.422.211
	M14	11,666	Bihać-Srbijani												
	M14.2	26,337	Bosanski Petrovac-Drvar												
	M15	49,303	(gr.ent)-Šanski Most-Kamičak-Ključ												
2	M4.2	51,343	(gr.Hrvatske)Velika Kladuša-Cazin-Srbijani	1.157.529	821.942	1.979.471	1.130.000	810.000	1.940.000	1.302.000	896.000	2.198.000	1.357.430	812.843	2.170.273
	M14	37,538	Srbijani-Bosanska otoka-(Gr.entiteta)												
	M14.2	52,642	Bosanska Krupa-Krnjeusa-Bosanski Petrovac												
	M1.8	40,849	(gr.ent)-Arizona(gr.distr) (Gr.distr.)-Srebrenik-Sićki Brod												
	M4	67,12	Donja Orašnica-Petlja Sićki-Tuzla-Kalesija-Memići(gr.ent)												
3	M14.1	13,021	(gr.ent)-Gradačac-(gr.ent)	2.283.237	1.484.993	3.768.230	2.550.000	1.450.000	4.000.000	2.481.000	1.416.000	3.897.000	2.504.264	1.379.832	3.884.096
	M18	84,38	(gr.ent)Banj Brdo, Šimin Han Sićki Brod-Kladanj, ...Tunel Karaula-Olovo												
	M19.2	11,867	Vitaji-(gr.ent)												
	M1.9	20,357	Gradačac-Ormanica-Slatina												

# JP CESTE FEDERACIJE BIH

M4	38,462	(gr.ent.)Jelab-Karuše (gran.ent.) Stanić Rjeka-Gračanica-Donja Orahovica	1.350.045	656.398	2.006.443	1.340.000	660.000	2.000.000	1.502.000	719.000	2.221.000	1.494.536	735.169	2.229.705
M17	100,982	(gr.ent.)Karuše-Zepče-Zenica-Lašva-Bijlješevo Lašva-Kaonik	1.126.627	692.696	1.819.323	1.150.000	750.000	1.900.000	1.390.000	866.000	2.256.000	1.604.670	576.686	2.181.356
M5	80,817	(gr.ent.) Jezero- Jajce-Travnik-Nević Polje												
M16	50,859	(gr.ent) crne Rjeka-Jajce I Donji Vakuf-Bugojno- tunel Koprivnica	921.060	471.694	1.392.754	900.000	450.000	1.350.000	903.000	471.000	1.374.000	925.906	415.984	1.341.890
M5	13,998	(gran.ent.)Prača-Hrenovica(gr.ent.)												
M18	6,016	(gr.ent.)Bogatići-Trnovo(gr.ent.)												
M18.1	46,281	Ustikolina-Grebak-Trnovo												
M20	27,040	(gr.ent.)Ustikolina-Goražde(gr.ent.)												
M6.1	24,087	Mostar-Gnojnice-Nevesinje(Gr.ent)	823.058	516.797	1.339.855	1.115.000	535.000	1.650.000	1.182.000	602.000	1.784.000	1.180.430	624.126	1.804.556
M14.2	30,075	Prozor-Jablanica												
M17	72,376	Konjic-Jablanica-Mostar-Gnojnice												
M5	26,581	Zelena meraja-Mostarokrišće Vijećnica-Korija, Gradska obilaznica Jošanica-Stup												
M17	47,002	Sup-Tarčin-Konjic	1.233.676	970.751	2.204.427	1.350.000	850.000	2.200.000	1.332.000	937.000	2.269.000	1.512.230	957.685	2.469.915
M18	54,273	Olovo-Semizovac-Koševsko brdo, Stup-Dobrinja (gran.ent)												
M1.8	7,992	(gr.Hrvatske)-Orašje-Lončari(gr.ent)												
M14.1	24,664	(gr.ent)-Svilaj-Odžak-(gr.ent)	597.226	303.973	901.199	603.000	307.000	910.000	638.000	360.000	998.000	679.309	298.547	977.856
M14.2	31,47	Odžak- gr.entiteta I gr. Ent.Orašje												
M5	57,991	Nević Polje-Kaonik-Busovača-Kiseljak-Zelena Meraja												
M16.2	39,509	Bugojno-Gornji Vakuf-Prozor	1.534.413	998.835	2.533.248	1.390.000	910.000	2.300.000	1.109.000	967.000	2.076.000	1.104.859	956.900	2.061.759
M16.4	38,618	Bugojno-Novi Travnik-Nević Polje												
M6.1	158,025	(gr.Hrvatske) Kaldra-Bos Grahovo-Livno-Kolo- Studena Vriila												
M14.2	33,355	Drvar-Resanovci Bosansko Grahovo-Sirmica (gr.Hrvatske)												
M15	95,643	(gr.ent)-Glanč-Prituka Livno-Kolo	2.698.936	2.212.902	4.911.838	2.970.000	2.280.000	5.250.000	3.156.000	2.280.000	5.436.000	3.186.879	2.227.689	5.414.568
M16	56,587	Tunel K. Vrata-Kupres-Šujica Livno-Kamensko-(gr.Hrvatske)												
M16.3	2,935	Renjci-Prisika (gr.Hrvatske)												
M2	9,258	Gr.Hrvatske-Neum-gr.Hrvatske	2.722.541	849.630	3.572.171	2.950.000	850.000	3.800.000	2.710.000	963.000	3.673.000	2.967.218	583.039	3.550.257
M6	85,004	Gr.Hrvatske-Grude-Ljubuški-Čapljina-Stolac- gr.ent.												



**Redovno održavanje mostova**

Naziv	Realizovano 01.01.- 31.12.2017.	Plan 2018.	Rebalans Plana 2018.	Konsultant /Izvođač	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2018.
Redovno održavanje mostova	50.499	750.000	750.000	HP Investing d.o.o. Mostar 01-02.1-11499/17. 28.12.2017. Sikra d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-11162/18. 12.12.2018.	564.584  34.254	403.847
<b>UKUPNO</b>	<b>50.499</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>			<b>403.847</b>

Realizacija ugovora je u toku.

**Glavni pregledi mostova**

Naziv	Realizovano 01.01.- 31.12.2017.	Plan 2018.	Rebalans Plana 2018.	Konsultant /Izvođač	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2018.
Glavni pregledi mostova	-	22.000	42.600	Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo, 01-01.2-1154/17. 21.12.2017. Taksa	12.636  293	12.636  293
<b>UKUPNO</b>	<b>-</b>	<b>22.000</b>	<b>42.600</b>			<b>12.929</b>

Na osnovu ugovora broj: 01- 02.1-11354/17. od 21.12.2017.godine vrijednosti 12.636 KM, Ipsa Institut d.o.o.Sarajevo je uradila detaljan pregled mosta preko rijeke Bosne (M17-007-172) Bosna III, Topčić polje.

Rebalansom plana je predviđen detaljan pregled za još dva mosta: preko rijeke Bosne u Bosanskom Šamcu (M14.2-006-596), na cesti M14.2, dionica Odžak-Gornja Dubica-Granica Entiteta (Bosanski Šamac), km 14+705 i ulice Bistrak u Sarajevu (M5-016-429), na cesti M5, dionica A.Šaćirbegović-Korija-Ljubogošta, km 4+400. U pripremi Obim usluga - Projektni zadatak za predmetne usluge.

**- Novelirani prometni projekti**

Red. broj	Mag. Cest.	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Realizovano 01.01.- 31.12.2017.	Plan 2018.	Rebalans Plana 2018.	Konsultant	Ugovoreno	Realizovan o 01.01.- 31.12.2018.		
1.	M-1.9	Izrada noveliranog prometnog projekta na dionici: - gr. entiteta /Slatina/Ledenice-Gradačac - Ormanica L = 21 km	Projektovanje	5.231	20.000	13.600	Institut za građevinstvo IG d.o.o. Banja luka, 01-02.2-8621/17. 25.09.2017. NTSI-Institut d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-11183/17. 15.12.2017.	13.077 (preneseno 7.846)	7.846		
	M-14.2	- Odžak – Bosanski Šamac – Bosanski Šamac – Orašje, L = 31,4 km	Revizija							5.800	5.800
	M-17.4	- Mostar - Čitluk - Ljubuški - Crveni Grm (gr. Hrvatske), L = 45 km									
<b>UKUPNO</b>				<b>5.231</b>	<b>20.000</b>	<b>13.600</b>			<b>13.646</b>		

Planirane aktivnosti su okončane.

**- Održavanje elektroopreme (rasvjeta tunela i prilaznih zona tunelima, rasvjeta raskrsnica, semafori i trafo stanice)**

Okvirni sporazumi, za period 2017.- 2021.godina su potpisani dana: 22.09.2017. (01-02.4-8590/17.) sa Step d.d. Sarajevo, a regulišu okvirna pitanja vezana za nabavku radova redovnog održavanja javne rasvjete raskrsnica, tunela i prilaznih zona tunelima na magistralnim cestama u F BiH (vrijednost 712.104 KM) i Okvirni sporazum za održavanje semaforiskih uređaja i opreme na magistralnim cestama vrijednosti 981.122 KM.

Naziv i opis projekta	Realizovano 01.01.- 31.12.2017.	Plan 2018.	Rebalans Plana 2018.	Konsultant /Izvođač	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2018.
Održavanje elektroopreme (rasvjeta tunela i prilaznih zona tunelima, rasvjeta raskrižja, semafori i trafo stanice)	263.730	450.000	450.000	Step d.d.Sarajevo, 01-02.2-7052/17.03.08.2017.	245.281 (preneseno 177.827)	177.720
				Step d.d.Sarajevo, 01-02.2- 8592/17.22.09.2017.	178.026 (preneseno 163.959)	163.954
				Aber Desing d.o.o. Sarajevo, 01-01.1-8879/17.04.10.2017.	7.020	7.000
				Aber Desing d.o.o. Sarajevo, 01-01.1-8880/17.04.10.2017.	7.020	7.000
Izvođenje radova redovnog održavanja semaforiskih uređaja i opreme i svjetlosnih oznaka pješačkih prelaza na magistralnim cestama u F BiH	263.730	450.000	450.000	Step d.d.Sarajevo, 01-02.4-6219/18.31.07.2018. Za period 03.08.2018.- 02.08.2019.	245.281	71.339
Izvođenje radova redovnog održavanja elektroopreme javne rasvjete raskrsnica, tunela i prilaznih zona tunelima na magistralnim cestama u F BiH				Step d.d.Sarajevo, 01-02.2-7682/18. 07.09.2018. Za period 01.09.2018.- 31.08.2019.	178.025	15.008
<b>UKUPNO</b>	<b>263.730</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>			<b>442.021</b>

Ugovori za usluge (nadzor) na radovima redovnog održavanja semaforiskih uređaja i opreme i svjetlećih oznaka pješačkih prelaza na magistralnim cestama u F BiH i nadzora na radovima redovnog održavanja javne rasvjete raskrsnica, tunela i prilaznih zona tunelima su potpisani sa Aber Desing d.o.o. Sarajevo, koji su navedeni u donjoj tabeli. Također, u tabeli su navedeni i ugovori i njihova realizacija za izvođenje sa Step-om d.d. Sarajevo.

Troškovi redovnog održavanja elektroopreme za rasvjetu tunela i prilaznih zona tunelima, rasvjete raskrsnica, semafora i trafostanica su realizovani prema potpisanim ugovorima sa izvođačima radova, a troškovi električne energije za rasvjetu tunela, raskrsnica, mostova, semafora, brojača prometa, su realizovani prema stvarnom utrošku odnosno prema fakturama Elektrodistribucije.

Na osnovu ugovora 01-02.1-9532/18 od 01.11.2018. godine sa NTSI-Institut d.o.o. Sarajevo i MHM Projekt d.o.o. Brčko Distrikt BiH, ugrađeni su nabavljeni brojači sa kompletnom opremom. Vrijednost ugovora iznosila je 0,04 mil.KM.

Za uslugu GPS/GPRS uređaja monitoringa vozila izvođača radova redovnog održavanja sa zimskom službom potpisan je ugovor sa TIM System d.o.o. Sarajevo broj:01-02.2-1142/18, 13.02.2018. na iznos 7.018 KM. Sacom d.o.o.Sarajevo je potpisao ugovor broj: 01-02.2-8223/18. od 26.09.2018. na iznos 40.342 KM za izradu

## JP CESTE FEDERACIJE BIH

pješačkih prijelaza od plastike sa optičko - zvučnim trakama kod škola i to: M-5, M-17 i M-18 u Kanton Sarajevo (9 lokacija); M-5 i M-5 i M-16.2 U Srednjo-bosanskom kantonu (6 lokacija); M-17 u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (3 lokacije) i M-14.2 u Posavskom kantonu (2 lokacije). Ugovor je realizovan u cijelosti.

### REKAPITULACIJA ULAGANJA ZA REDOVNO ODRŽAVANJE

O P I S	Realizovano 01.01.- 31.12.2017.	Plan 2018.	Rebalans Plana 2018.	Realizovano 01.01.- 31.12.2018.	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>REDOVNO ODRŽAVANJE I ZIMSKA SLUŽBA</b>	<b>28.755.289</b>	<b>29.800.000</b>	<b>30.692.000</b>	<b>30.508.442</b>	<b>99</b>
Redovno održavanje mostova	50.499	750.000	750.000	403.847	54
Glavni pregledi objekata (složenih)	-	22.000	42.600	12.929	30
Troškovi električne energije za rasvjetu tunela, raskrsnica, mostova, semafora i brojača prometa	475.376	500.000	500.000	495.118	99
Osiguranje pružnih prelaza u USK (sufinansiranje)	-	20.000	20.000	3.424	17
Poboljšanje sigurnosti prometa – izrada noveliranih prometnih projekata	5.231	20.000	13.600	13.646	100
Poboljšanje sigurnosti prometa – izrada noveliranih projekata sigurnosnih odbojnih ograda	-	32.000	32.000	-	-
Održavanje elektro-opreme (rasvjeta tunela i prilaznih zona tunelima, rasvjeta raskrsnica, semafori i trafo stanice, te zamjena rasvjetnih tijela LED svjetiljkama)	263.730	450.000	450.000	442.022	98
Sanacija postojećih i izgradnja novih svjetlosnih prometnih znakova kod škola	65.637	50.000	50.000	-	-
Redovno održavanje brojača prometa	-	7.000	7.000	39.312	562
Monitoring vozila redovnog održavanja GPS-om	6.962	7.000	28.000	14.335	51
Obilježavanje pješačkih prijelaza sa plastikom optičko-vibracionim trakama kod škola	42.494	50.000	50.000	40.341	81
Tehničko izviđanje i čišćenje površine rizične od mina na M-14 (dionica 002)	-	-	100.000	-	-
<b>Utrošak soli NaCl i CaCl<sub>2</sub></b>	<b>2.922.435</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.837.594</b>	<b>109</b>
Projekat koordinacije 5 semaforiziranih raskrsnica (zeleni val) na M5 (011) u Travniku – (izvođenje)	51.692	-	-	-	-
Tvornička kalibracija mjerača refleksije horizontalne i vertikalne signalizacije	24.997	-	-	-	-
<b>UKUPNO REDOVNO ODRŽAVANJE</b>	<b>32.664.342</b>	<b>34.008.000</b>	<b>35.335.200</b>	<b>34.811.010</b>	<b>99</b>

#### 4. Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode

Naziv	Realizovano 01.01.- 31.12.2017.	Plan 2018.	Rebalans Plana 2018.	Realizovano 01.01.- 31.12.2018.	Napomena
Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode	1.050.536	450.000	1.900.000	1.419.660	-rashodi nastali preknjižavanjem
				587.992	-rashodi vezani za SO
<b>UKUPNO</b>	<b>1.050.536</b>	<b>450.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.007.652</b>	

## JP CESTE FEDERACIJE BIH

Na osnovu preporuka Ureda za reviziju institucija u F BiH, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, izvršeno je preknjižavanje slijedećih ulaganja iz ranijih godina u rashode perioda:

- Studija opravdanosti za Program Modernizacija cesta u F BiH (157.716 KM),
- Izrada geodetsko-eksplozivacionog elaborata sa zaštitnim pojasom (307.208 KM),
- Izrada katastra magistralnih cesta u F BiH (389.940 KM),
- Studija kategorizacije cesta u F BiH (557.936 KM)

Izvršena ulaganja za navedene projekte ne mogu se konkretno definisati na pozicije magistralne cestovne infrastrukture, niti se može predvidjeti priliv ekonomske koristi u narednom periodu.

- Vlada F BiH je Rješenjem broj: 08-27-330-3/16. dala saglasnost JP Autoceste F BiH na korištenje objekat ABH – PROM-a eksproprijanog na projektu Sarajevska obilaznica, a koji je prvobitno bio predviđen za odlaganje arhivske građe JP Ceste F BiH. Otpisana je vrijednost uloženi sredstava u iznosu od 6.850 KM.
- Pred Međunarodnim arbitražnim sudom Međunarodne privredne komore vodi se predmet br.22380/MHM Osijek-koteks d.d Osijek protiv JP Ceste FBIH, vezan za projekat Sarajevska obilaznica. Strabagu AG isplaćene su zatezne kamate (366.757 KM) po DAB-u i troškovi komisije (180.154 KM), a ostalo su rashodi vezani za proces arbitraže (41.081KM-prevođenje, zakup sale, vještačenje...).

### 5. Rezervirana sredstva za sudske presude

NAZIV	Realizovano 01.01.- 31.12.2017.	Plan 2018.	Rebalans Plana 2018.	Realizovano 01.01.- 31.12.2018.	Napomena
				104.928	Troškovi po sud.
				219.452	Presudama
					Zatezne kamate po
					osnovu sudskih
Rezervirana sredstva za sudske presude	939.095	950.000	1.400.000	1.134.336	predusa
				738.414	Troškovi zastupanja
					u arbit.postupku
					Troškovi
					rezerviranja po
					sudskim sporovima
<b>UKUPNO</b>	<b>939.095</b>	<b>950.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>2.197.130</b>	

Rezervirana sredstva za sudske presude realizovana su u iznosu od 2,20 mil.KM, što je više za 0,80 mil.KM od planiranih 1,40 mil.KM, a obuhvataju: rezervirana sredstva za sudske presude u iznosu od 738.414 KM, zatim troškove po sudskim presudama (104.928 KM), zatezne kamate po osnovu sudskih presuda (219.452KM) i troškove zastupanja u arbitražnom postupku (1.134.336 KM). Naime, projekat Sarajevska obilaznica u poslovnim knjigama JP Ceste F BiH se vodi vanbilansno, obzirom da je projekat Vlade F BiH. Iako je upućen zahtjev Vladi F BiH za obezbjeđenje neophodnih sredstava, da se ne bi stvarale i povećavale neizmirene obaveze, JP Ceste F BiH su iz vlastitih sredstava izmirile nastale obaveze koje se tiču pravne pomoći i zastupanja pred Međunarodnim arbitražnim sudom Međunarodne privredne komore (predmet br.22380/MHM Osijek-koteks d.d Osijek protiv JP Ceste F BiH) vezano za sporove po osnovu ugovora o izgradnji Sarajevske obilaznice LOT2. U skladu sa Aneksom II dio B Zakona o javnim nabavkama JP Ceste FBIH provelo je postupak nabavke pravnih usluga pomoći, savjetovanja i zastupanja pred Međunarodnim arbitražnim sudom i potpisalo 30.08.2017. ugovor br. 01-02.3-7913/17 sa advokatskim kancelarijama Knoetzl Haugeneder



## JP CESTE FEDERACIJE BIH

Netal, Beč, Sead Miljković, Sarajevo i Tarja Krehić Zagreb. Ugovoreni iznos je 463.320 KM, uključujući PDV. Sa istom advokatskom kancelarijom potpisan je ugovor broj:01-02.3-11534/18. dana 21.12.2018. godine vrijednosti 675.054 KM.

### 6. Troškovi konsultantskih usluga

Red br.	NAZIV	Realizovano 01.01.- 31.12.2017.	Plan 2018.	Rebalans Plana 2018.	Konsultant	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Obrada podataka i izrada Publikacije o prometu	11.027	15.000	15.000	-	-	-
2.	Troškovi izrade projekta izvedenog stanja magistralnih cesta -za dionicu Blažuj-Tarčin i obilaznica Pazarić	44.792	75.000	75.000	Desing&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.5-10585/18, 28.11.2018	11.700	-
3.	Troškovi konsultantskih usluga za potrebe neovisne kontrole kvalitete radova	26.015	26.000	20.000	DTQ d.o.o. Sarajevo 01-02.2-853/17. 31.01.2017.	46.063 (preneseno 20.048)	2.726
4.	Troškovi održavanja sustava gospodarenja cestama – SUGOC	105.791	106.000	106.000	TEB Informatika d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-9612/18. 02.11.2018.	105.791	105.791
5.	ISO 9001 – Standard upravljanja kvalitetom	-	15.000	15.000	-	-	-
6.	IRAP – snimanje cestovne mreže za potrebe Programa „Modernizacije cesta u F BiH“ (kreditna sredstva IBRD)	-	391.000	50.000	-	-	-
7.	Konsultantske usluge vezane za nabavku radova i usluga po međ. procedurama	-	85.000	50.000	Ugovor o djelu, 01-11825.2018	-	-
8.	Izrada studije analize prometa na cesti M-18, Semizovac-Sarajevo-Malta	-	-	15.000	-	-	-
9.	Izrada i recenzija elaborata provjere sigurnosti (RSI) magistralne ceste M14-002, Srbljani-Bos.Krupa, L=21,50 km	12.001	-	-	-	-	-
10.	Uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole (FUK)	6.435	-	-	-	-	-
<b>UKUPNO</b>		<b>206.061</b>	<b>713.000</b>	<b>346.000</b>			<b>108.517</b>

Rb.1 - Dva puta objavljen tender i poništen. Nabavka se „prebacuje“ u 2019. godinu.

Rb.2 - U cilju uknjižbe nekretnina, za pojedine magistralne ceste neophodno je uraditi projekte izvedenog stanja kao i pribaviti podatke iz katastra općina za uspostavljanje katastra cestovne infrastrukture. Rebalansom je bilo predviđeno da se uradi za više dionica, međutim, u izvještajnom periodu potpisan je ugovor za dionicu: Blažuj-Tarčin i Obilaznicu Pazarić sa Desing&QC d.o.o. Sarajevo,

Rb.3 - Ugovor za potrebe kontrole kvalitete materijala za redovno i investiciono ulaganje potpisan je sa DTQ d.o.o. Sarajevo, čija realizacija je u toku.

Rb.4 - TEB Informatika d.o.o. Sarajevo na osnovu ugovora održava, daje stručnu podršku i unapređuje rad u programskim rješenjima SUGOC (e-mailom, telefonom ili udaljenim pristupom) sistema neophodnog za održavanje i upravljanje magistralnim cestama u Federaciji BiH.

Rb.5 - Planirana aktivnost nije realizovana u izvještajnom periodu.

Rb.6 - U toku je evaluacija ponude snimanja cestovne mreže IRAP metode, koja predstavlja snimanja prolaza kojima se bilježe karakteristike cesta uz pomoć specijalizovane opreme, a u toku vožnje tim cestama. Snimanje je neophodno za Program „Modernizacija cesta F BiH“.

Rb.7 - Za pružanje potrebne tehničke pomoći vezane za Program „Modernizacija cesta u F BiH“ kao što je postupak nabavki roba, radova i usluga u skladu sa definisanim opisom i predmetom projekta, saradnja u implementaciji i praćenju provođenja ugovora vezanih za projekte,

saradnja u vođenju komunikacije sa izvođačima, konsultantima, izvođačima i međunarodnim finansijskim institucijama, saradnja u pripremi odgovora ponuđačima u slučaju eventualnih zahtjeva za pojašnjenjima, prigovora i žalbi priprema neophodne argumentacija i strategije vođenja žalbenog postupka i dr. potpisan je ugovor o djelu broj:01-11825/18. na period od 15.11.2018. do 31.12.2019., a izvršitelju ugovora pripada mjesečni neto iznos od 2.500 KM, nakon dostavljenog izvještaja o obavljenom poslu.

Rb.8 - Planirana aktivnost nije realizovana u izvještajnom periodu.

### 7. Kamate

Red. broj	NAZIV	Realizovano 01.01.- 31.12.2017.	Plan 2018.	Rebalans Plana 2018.	Realizovano 01.01.- 31.12.2018.	Napomena
1.	Kamate, servisni troškovi i kursne razlike za kredit EBRD-a, EIB-a i WB za program „Rehabilitacija cesta u F BiH“	847.969	1.000.000	1.170.000	414.939 360.479 252.747 167.827	Negat. kurs. razl SDR EIB EBRD WB
2.	Jednokratna provizija za Program „Modernizacija cesta u F BiH“, kredit EBRD-a (plativo iz zajma/kredita nakon efektivnosti)	-	1.272.000	1.272.000	-	Kredit nije efektivan
3.	Provizija na nepovučena sredstva kredita za Program „Modernizacija cesta u F BiH“ (vlastita sredstva)	-	836.000	934.000	206 614.315 252.770	Kamate IBRD EBRD IBRD
4.	Kamate i servisni troškovi za program „Modernizacija cesta u FBIH“ EIB, EBRD, WB-IBRD	53.733	-	-	-	U 2018. godini terete investicije
5.	Jednokratna bankarska provizija na kredit WB – IBRD	283.595	-	-	-	
<b>UKUPNO</b>		<b>1.185.297</b>	<b>3.108.000</b>	<b>3.376.000</b>	<b>2.063.283</b>	

Rb.1.- Okončani projekti iz Programa „Rehabilitacija cesta u F BiH“ su finansirani međunarodnim kreditnim sredstvima i to:

- Evropska investicijska banka (EIB), kredit broj: 23924 po finansijskom ugovoru br. 2005-0455 u iznosu 50 mil.EUR. Kamatna stopa je varijabilna (6 mjesečni EURIBOR + fiksni raspon). Povlačenje kredita je bilo po tranšama (šest tranši). Period otplate kredita je do 18 godina, uključujući 6 godina perioda odgode otplate, a otplata se vrši u jednakim polugodišnjim ratama. Prvi datum otplate svake tranše je ne kasnije od 6 godina od datuma povlačenja tranše, a krajnji rok otplate posljednje rate je ne ranije od 4 godine i ne kasnije od 18 godina od datuma povlačenja. Otplata prve tranše počela je 2014 godine. U 2018.godini otplaćene su prispejele obaveze po slijedećim tranšama: I tranša -734.039KM, II tranša -782.332KM, III tranša - 938.798KM, IV tranša - 704.099KM, V tranša -1.251.731KM i VI tranša - 2.346.996KM kao i kamate u vrijednosti od 248.704 KM.

- kredit Svjetske banke (WB) - IDA 43710, u iznosu 8,20 mil. SDR. Kamata na kredit je 0,75% na povučeni iznos kredita, a naknada za održavanje kredita iznosi 0,5% godišnje na nepovučeni iznos kredita. Obzirom da je originalna valuta kredita SDR, zavisno od kretanja valuta koje čine SDR pojavljuju se pozitivne ili negativne kursne razlike. Otplata kredita je u jednakim polugodišnjim ratama, u periodu od 20 godina, uključujući period odgode od 10 godina. Period otplate kredita počeo je 15.12.2017. i traje do 15.06.2027 godine. Kreditna sredstva su povučena do 30.06.2012. godine.


Otplaćene su dospjele dvije rate kredita u iznosu od 1.908.161 KM, kamate -159.493KM, a obzirom da je kredit u SDR-ovima, obračunate su negativne kursne razlike u iznosu od 414.939 KM.

- Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) - po ugovoru br. 37543 u iznosu 45 mil.EUR. Kamatna stopa je varijabilna (6 mjesečni EURIBOR +1% marža), a plaća se polugodišnje. Otplata kredita je u 24 jednake polugodišnje rate, počev od 5.12.2010. godine. U izvještajnom periodu realizovane su, a nisu plaćene dvije rate kredita sveukupne vrijednosti 8.036.008KM, te kamate koje terete rashode perioda -248.704KM.

Rb.2 - Za Program „Modernizacija cesta u F BiH“ u skladu sa Ugovorom o zajmu između Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i BiH, povlačenje zajma je u dvije tranše: I tranša 32,00 mil. EUR i II tranša 33,00 mil.EUR, prije umanjnja za jednokratnu proviziju od strane EBRD-a. Jednokratna provizija EBRD-a od 1% obračunava se na ukupni iznos zajma i plaća se iz kredita nakon efektivnosti kredita. Obzrom da kredit nije još postao efektivan, nije ni obračunata jednokratna provizija.

Rb.3 - Ugovorom o zajmu između Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i BiH, troškovi održavanja kredita (provizija na nepovučena sredstva zajma) iznose 0,5% godišnje na nepovučeni saldo kredita. Grejs period za obračun provizije na nepovučena sredstva zajma: I tranša 60 dana nakon datuma potpisivanja Ugovora o zajmu. Na nepovučena sredstva obračunata je provizija u iznosu od 0,61 mil.KM.

U skladu sa kreditnim sporazumom između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i BiH, obaveza po osnovu troškova održavanja kredita (provizija na nepovučena sredstva kredita) iznosi 0,25 % godišnje na nepovučeni saldo kredita. Grejs period za obračun provizije na nepovučena sredstva kredita je 90 dana nakon datuma potpisivanja Ugovora o kreditu (Ugovor o kreditu potpisan 9. novembra 2016.), a ista je plativa na datum plaćanja kamata koji slijedi nakon efektivnosti kredita (kredit efektivan od 4.10.2017). Obračunata provizija po kreditu iznosi 0,25 mil.KM.

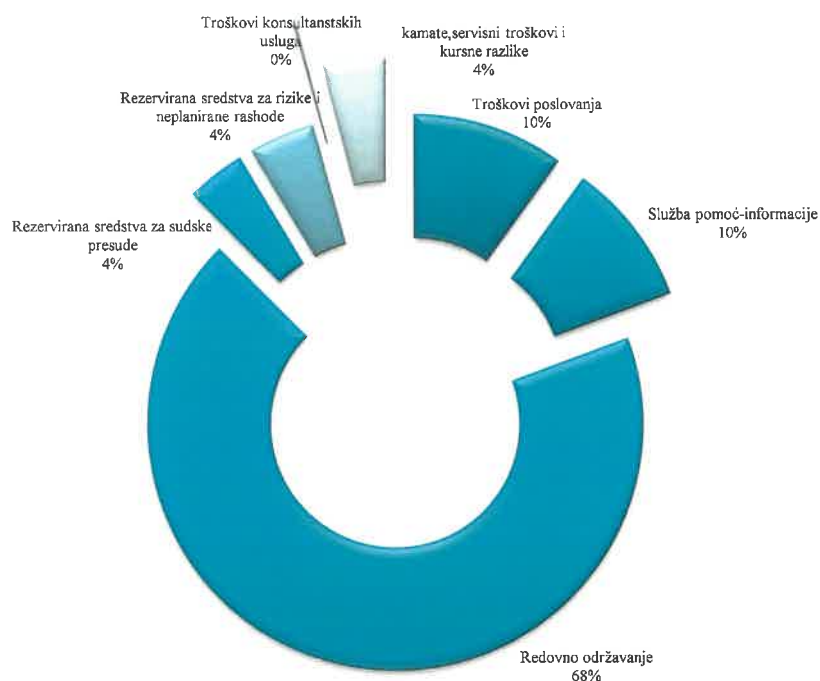

*Grafički prikaz strukture ostavarenih javnih rashoda*

## B. II TROŠKOVI AMORTIZACIJE

Naziv	Realizovano 01.01.- 31.12.2017.	Plan 2018.	Rebalans Plana 2018.	Realizovano 01.01.- 31.12.2018.
Amortizacija stalnih sredstava	810.145	800.000	700.000	601.731
<b>UKUPNO</b>	<b>810.145</b>	<b>800.000</b>	<b>700.000</b>	<b>601.731</b>


U skladu sa MRS 20, vrijednost nematerijalne i materijalne imovine neophodne za obavljanje osnovne djelatnosti sistematski se otpisuje tokom procijenjenog vijeka trajanja i sučeljava sa pripadajućim dijelom odloženih prihoda (izvora) do momenta otpisa.

Amortizacija se obračunava linearnom metodom otpisa, tokom procijenjenog korisnog vijeka trajanja stalnih sredstava. Ista se odnosi na nematerijalna stalna sredstva, opremu i transportna sredstva, te je u prihodovnoj i u rashodovnoj strani obračunata u iznosu od 0,60 mil.KM.

**C. INVESTICIJE**

Red Br.	OPIS	Realizovano 01.01.- 31.12.2017.	Plan 2018.	Rebalans Plana 2018.	Realizovano 01.01.- 31.12.2018.	Index 6/5	Index 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Nabavka stalnih sredstava</b>	<b>129.953</b>	<b>601.000</b>	<b>594.000</b>	<b>300.270</b>	<b>51</b>	<b>231</b>
<b>2.</b>	<b>Program "Modernizacija cesta u F BiH"</b>	<b>3.260.377</b>	<b>75.844.300</b>	<b>32.381.300</b>	<b>17.571.833</b>	<b>54</b>	<b>539</b>
	2.1. Program "Modernizacija cesta u F BiH"- vlast. sredstva	-	621.000	402.000	324.967	81	-
	2.2. Program "Modernizacija cesta u F BiH"- kredit. sredstva	3.260.377	75.223.300	31.979.300	17.246.866	54	529
<b>3.</b>	<b>Projekti JP Ceste F BiH</b>	<b>6.347.206</b>	<b>13.996.900</b>	<b>25.742.600</b>	<b>3.788.910</b>	<b>15</b>	<b>60</b>
	<b>3.1. Projekti iz prethodnog perioda</b>	<b>5.151.750</b>	<b>8.571.900</b>	<b>8.161.900</b>	<b>3.042.266</b>	<b>37</b>	<b>59</b>
	3.1.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje	949.550	1.471.500	1.198.400	744.135	62	78
	3.1.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica i tuncla	7.603	7.000	14.000	14.131	101	186
	3.1.3. Poboljšanje sigurnosti prometa	3.029.292	4.647.400	4.597.900	1.015.372	22	34
	3.1.4. Vanredno održavanje	<b>1.165.335</b>	<b>2.446.000</b>	<b>2.351.600</b>	<b>1.268.628</b>	<b>54</b>	<b>109</b>
	3.1.4.1. Sanacija cestovnih objekata	241.548	1.778.500	1.682.400	672.785	40	279
	3.1.4.2. San.klizišta, odrona, san.slijeganja trupa puta, kos. i zasjeka	923.787	628.000	643.100	584.728	91	63
	3.1.4.3.Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza	-	39.500	26.100	11.115	43	-
	<b>3.2. Planirani projekti u 2018. godini</b>	<b>1.195.456</b>	<b>5.425.000</b>	<b>17.580.700</b>	<b>746.644</b>	<b>4</b>	<b>62</b>
	3.2.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje	191.684	55.000	1.149.600	53.470	5	28
	3.2.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica	19.246	-	162.000	-	-	-
	3.2.3. Poboljšanje sigurnosti prometa	129.518	4.100.000	9.414.600	351.416	4	271
	3.2.4. Vanredno održavanje	<b>855.008</b>	<b>1.270.000</b>	<b>6.854.500</b>	<b>341.758</b>	<b>5</b>	<b>40</b>
	3.2.4.1. Sanacija cestovnih objekata	297.509	702.000	3.617.500	185.931	5	62
	3.2.4.2.Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza	271.881	568.000	2.580.000	155.827	6	57
	3.2.4.3. San. klizišta, odrona, sanac.slijeg. trupa puta, kosina i zasjeka	285.618	-	657.000	-	-	-
<b>4.</b>	<b>Eksproprijacija i elaborati eksproprijacije</b>	<b>1.268.469</b>	<b>2.635.900</b>	<b>2.895.000</b>	<b>2.601.448</b>	<b>90</b>	<b>205</b>
<b>5.</b>	<b>Projekti iz Budžeta F BiH</b>	<b>52.184</b>	<b>700.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>647.851</b>	<b>51</b>	<b>1241</b>
<b>6.</b>	<b>Donacije</b>	<b>7.459.959</b>	<b>-</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>18.518.148</b>	<b>93.778.100</b>	<b>62.904.100</b>	<b>24.921.512</b>	<b>40</b>	<b>135</b>

Od ukupno planiranih 62,90 mil.KM ulaganja u investicije, realizovano je 24,92 mil.KM ili 40% planiranih sredstava. Najviše je investirano (17,25 mil.KM ) u projekte iz Programa „Modernizacija cesta u F BiH“, koji se finansiraju iz kreditnih sredstava. Iz vlastitih sredstava uloženo je 7,02 mil.KM, od čega u projekte 3,79 mil.KM, u eksproprijaciju i aktivnosti vezane za proces eksproprijacije 2,60 mil.KM, stalna sredstva 0,30 mil.KM i kamate 0,32 mil.KM, koje terete projekte finansirane kreditnim sredstvima. Iz sredstva Budžeta F BiH realizovano je 0,65 mil.KM namijenjenih za eksproprijaciju izgradnje ceste Neum-Stolac, kao i sredstva donacije u iznosu od 0,01 mil.KM.

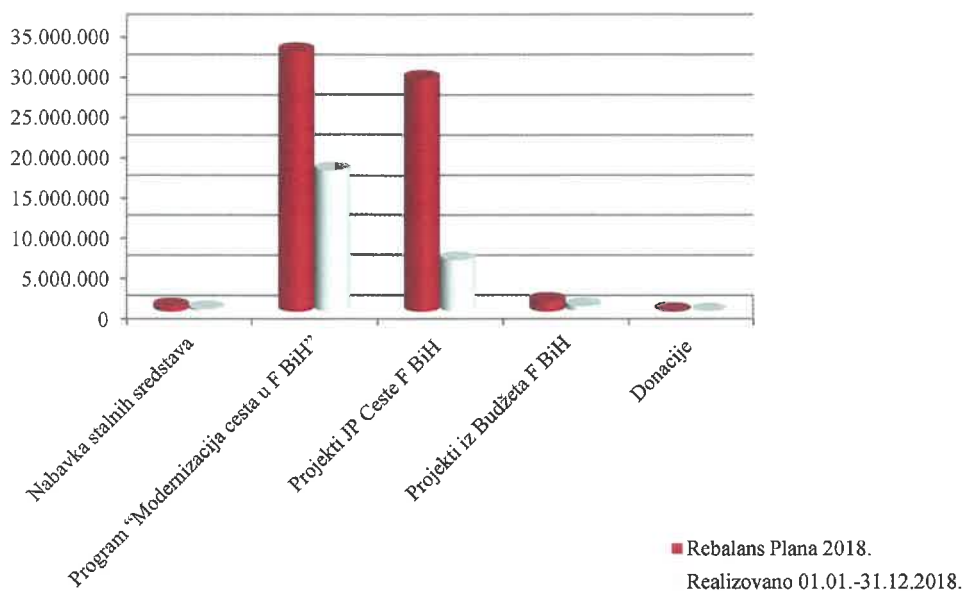

Grafički prikaz visine planiranih i realizovanih projekata

## 1. Nabavka stalnih sredstava

Red. Br.	OPIS	Plan 2018.	Rebalans Plana 2018.	Realizovano 01.01.-31.12.2018.
1.	Automatski brojači prometa	120.000	120.000	79.993
2.	Automobili	65.000	100.000	61.145
3.	Računarska oprema	44.000	54.000	-
4.	Nastavak informatizacije poslovnog procesa, multimedijalna oprema za salu i GPS	117.000	117.000	8.150
5.	Nabavka lifta	50.000	50.000	-
6.	Digitalni protokol – Sistem za upravljanje dokumentima	195.000	133.000	133.439
7.	Druge nabavke neophodne za izvršenje planiranih aktivnosti	10.000	20.000	17.543
<b>UKUPNO</b>		<b>601.000</b>	<b>594.000</b>	<b>300.270</b>

- Rb.1 - MHM - Projekt d.o.o.Brčko je dobavljač, na osnovu ugovora broj: 01-02.1-11057/17. od 12.12.2017. 15 automatskih brojača prometa ukupne vrijednosti 0,08 mil.KM, koji je realizovan u obračunskom periodu. Planirana ugradnja (stubovi) automatskih brojača, tereti rashode perioda.
- Rb.2 - Nabavljena su dva automobila za nadzorne organe na terenu marke Dacia Duster ukupne vrijednosti (sa osiguranjem i registracijom ) 0,06 mil.KM. Dobavljač je Guma M d.o.o. Mostar na osnovu ugovora broj:01-03.1-1811/18, 07.03.2018.godine vrijednosti 59.904 KM.
- Rb.3 - U toku je ponovljeni tender za nabavu računarske opreme.
- Rb.4. - Sa Infosoft-om d.o.o. Sarajevo potpisan je ugovor 01-03.1-423/18, 16.01.2018. (32.701 KM) o nadogradnji IMIS-a za potrebe praćenja subanalitičke evidencije podataka i obaveznog izvještavanja međunarodnih banaka, evidencije za ostvarivanje prava na povrat PDV-a.

Ugovor je u realizaciji. Isti dobavljač je na osnovu ugovora 01-03.1-824/18, 31.01.2018.(1.130 KM) dogradio softverski proizvod – modul upravljanja zalihama. Od TIM Systema d.o.o.Sarajevo nabavljeni su GPS/GPRS uređaji za monitoring vozila izvođača radova redovnog održavanja sa zimskom službom, vrijednosti 7.020 KM.

Rb.5. - Euro Prost d.o.o. Gračanica je potpisnik ugovora broj: 01-01.1-11779/18. od 27.12.2018. za ugradnju jednog lifta u poslovnoj zgradi vrijednosti 49.959 KM. Realizacija ugovora se očekuje u narednom periodu.

Rb.6.- Potpisan je ugovor broj 01-02.5-5009/18 27.06.2018.godine na iznos od 132.210 KM, sa Konzorcijem: Orka d.o.o. Sarajevo i Bosnien Business Systems d.o.o. Sarajevo za isporuku sistema upravljanja dokumentima, tj digitalizacija kompletnog kancelarijskog poslovanja, sa ciljem efikasnijeg provodjenja poslova iz svoje nadležnosti. Zahvaljujući tome što su svi podaci smješteni u centralni sistem pohrane podataka, kao i činjenicu da se svaki podatak samo jednom unosi u sistem, smanjuje se vrijeme potrebno za pretraživanje i dobijanje informacija, smanjuje se mogućnost pogreške uzrokovana korištenjem netačnih i zastarjelih podataka, a jednom unesen podatak je dostupan svima (u zavisnosti o pravima pristupa) i na kraju utiče na povećanje produktivnosti. Sa mrežnim optičkim adapterom realizovan je iznos od 0,13 mil.KM.

Rb.7.- Drugim neophodnim nabavkama obuhvaćena je nabavka kanalnog snimača, zatim kancelarijskog namještaja za ured u Bihaću, ormara-kase i ugradbenih ormara u poslovnoj zgradi.

## **2. Zajednički projekti sa međunarodnim finansijskim institucijama**

### **Program „Modernizacija cesta u F BiH“**

U posmatranom izvještajnom periodu, najznačajnije aktivnosti bile su usmjerene na nabavku radova i konsultantskih usluga za tehnički nadzor i monitoring okolinskih i socijalnih utjecaja za projekte obuhvaćene programom „Modernizacije cesta u FBiH“, te na pribavljanju odobrenja za građenje gdje je potrebno. Ozbiljan problem koji je već imao za posljedicu prolongiranje realizacije projekata i nepovlačenja kreditnih sredstava je dugotrajan i složen proces eksproprijacije , kao i prebacivanje nadležnosti za izdavanje urbanističkih saglasnosti i odobrenja za građenje između nadležnih institucija na federalnom i kantonalnom nivou.

### **2.1. Radovi na modernizaciji magistralnih cesta i objekata i konsultantske usluge nadzora**

U niže navedenoj tabeli dat je pregled troškova za izvođenja radova na dionicama magistralnih cesta i cestovnih objekata (mostovi i tuneli) i nadzor za projekte planirane za implementaciju u 2018., kao i izvori finansiranja.

## JP CESTE FEDERACIJE BIH

Re d. br.	Mag. cesta	Dionica	DIONICA	Aktivnosti na projektu	Plan 2018.	Rebalans Plana 2018.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2018.	Napomena
<b>1. Izgradnja cesta - Poboljšanje elemenata u postojećem koridoru</b>										
1.2	M-17	N	Šiški Brod -Sarajevo, dionica Kladanj-Podpaklenik preko prevoja Karaula, izgradnja trase = 2.702m1 i objekata (dva mosta, most 13 i most 14 L=414m1)	Izvođenje	8.699.200	6.765.000	JV Euro-asfalt d.o.o. i GP ŽGP d.d. Sarajevo, 01-02.3-879/18. 02.02.2018.	8.525.565	5.070.237	U toku
				Nadzor	750.000	595.000	JV Trasa d.o.o. i Desing&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.3-878/18. 02.02.2018.	749.903	478.415	
				Kamata					174.307	
				<b>Ukupno</b>					<b>5.722.959</b>	
<b>EIB</b>				<b>Izvođenje</b>	<b>8.699.200</b>	<b>6.765.000</b>			<b>5.070.237</b>	
				<b>Nadzor</b>	<b>750.000</b>	<b>595.000</b>			<b>478.415</b>	
1.1	M-73	N	Stolac - Neum, dionica Stari Neum - Oštrovac Asfaltiranje dionice Stari Neum - Babin Do L=5,3 km, izgradnja ceste Babin Do – Oštrovac L=1,7 km i izgradnja tunela Oštrovac L=900m1 (LOT1)	Izvođenje	5.151.500	4.636.000	Integral Inženjering ad Laktaši, 01-02.2-645/18. 24.01.2018.	5.151.459	2.723.012	U toku
				Nadzor	258.000	291.000	JV iC consulnten GesmbH, Nievelt Ingenieur GmbH Wien and AIK Inženjering d.o.o. Banovići, 01-02.3-2574/18. 28.03.2018.	323.952	326.223	
				Kamata					40.770	
				<b>Ukupno</b>					<b>3.090.005</b>	
			Stolac - Neum, dionica Oštrovac – Broćanac (LOT2)	Izvođenje	5.063.500	4.557.000	JV HP Investing d.o.o. Mostar, Putovi d.o.o. Grude 01-02.3-646/18. 24.01.2018.	5.063.464	2.968.984	U toku
				Nadzor	253.200	291.000	JV iC consulnten GesmbH, Nievelt Ingenieur GmbH Wien and AIK Inženjering d.o.o. Banovići, 01-02.3-2574/18. 28.03.2018.	322.973	351.849	
				Kamata					16.706	
				<b>Ukupno</b>					<b>3.346.181</b>	
			Izgradnja tunela Žaba (LOT3)	Izvođenje	8.183.000	1.889.000	JV Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo & HP Investing d.o.o. Mostar 01-02.3-7246/18, 23.08.2018.	19.707.007	2.064.559	Datum početka 15.10.2018 U toku pripremni radovi u skladu s privremenom građevinskom dozvolom
				Nadzor	409.000	100.000	JV iC consulnten GesmbH, Nievelt Ingenieur GmbH Wien and AIK Inženjering d.o.o. Banovići, 01-02.3-2574/18. 28.03.2018.	1.023.728	42.514	
				Kamata						
				<b>Ukupno</b>					<b>2.107.073</b>	
<b>2. Izgradnja traka za spora vozila</b>										
2.1	M-5	003	Ripač - Dubovsko	Izvođenje	1.483.000	-			-	Nije planirano
				Nadzor	74.000	-			-	



## JP CESTE FEDERACIJE BIH

2.2	M-5	006	Bosanski Petrovac - Ključ - prevoj Lanište	Izvođenje	1.776.000	930.000	-	-	-	Ponudači Euroasfalt i Kovgrad Bužim uložili žalbe Komisiji za rješavanje žalbi FMPK (drugostepeni organ) na odluku JP Ceste F BiH o uslovnoj namjeri dodjele Ugovora. Čeka se rješenje Komisije za žalbe
				Nadzor	89.000	28.000		189.879	-	
				<b>Ukupno</b>					-	
2.4	M-6.1		Posušje –Grude-Široki Brijeg	Izvođenje	1.476.000	-				Nije planirano
				Nadzor	74.000	-				

### 3. Rekonstrukcije ceste i kolovozne konstrukcije, korekcija osovine

3.1	M-5		Bihać 4-Ripač, sanacija kolovoza i korekcija osovine	Izvođenje	-	200.000	JV Kov-grad d.o.o. Bužim BC-Gradnjad.o.o. Bos.Otoka, 01-02.3-8459/18, 03.10.2018.	1.613.419	29.485	U toku
				Nadzor	-	3.000	JV Divel d.o.o.Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o. Mostar, 01-02.3-5708/18, 17.07.2018.	25.278	-	
				<b>Ukupno</b>					<b>29.485</b>	
3.4	M-20	009	Ustikolina –Goražde kružni tok Vitkovići, korekcija osovine, rješenje odvodnje i pješačke staze	Izvođenje	2.745.000	-				Ponudač Euroasfalt i Strabag d.o.o Sarajevo uložili žalbe Komisiji za rješavanje žalbi FMPK (drugostepeni organ) na odluku JP Ceste F BiH o uslovnoj dodjeli Ugovora. Čeka se rješenje Komisije za žalbe
				Nadzor	137.000	-				
3.5	M-19.2	001	Vitalj- Vlasenica (granica entiteta) korekcija osovine	Izvođenje	1.369.000	1.400.000	JV Jata Group d.o.o.Srebrenik, Roding d.o.o. Gračanica 01-02.3-7603/18, 06.09.2018.	1.773.648	164.094	U toku
				Nadzor	68.500	78.000	JV Divel d.o.o.Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o. Mostar, 01-02.3-5708/18, 17.07.2018.	97.224	68.785	
				kamata				6.972	6.972	
				<b>Ukupno</b>					<b>239.851</b>	

### 4. Rekonstrukcije/ rehabilitacije tunela

4.3	M-17	007	Topčić polje - Lašva, sanacija tunela Vranduk II km 7+416	Izvođenje	8.044.000	3.500.000	JV Hering d.o.o. Široki Brijeg i BBM d.o.o. Sarajevo 01-02.3-7602/18, 06.09.2018.	11.797.158	653.251	U toku
				Nadzor	402.000	119.300	JV Divel d.o.o.Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o. Mostar, 01-02.3-5708/18, 17.07.2018.	447.232	125.467	
				kamata				55.331	55.331	
				<b>Ukupno</b>					<b>834.049</b>	
			Konjic - Jablanica I, rekonstrukcija	Izvođenje	3.677.000	1.000.000				Problemi i dugotrajan proces

## JP CESTE FEDERACIJE BIH

4.4	M-18	012	tunela Crnaja km 15+082	Nadzor	184.000	23.000	JV Divel d.o.o.Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o. Mostar, 01-02.3-5708/18, 17.07.2018.	456.954	-	vezano za izdavanje građevinske dozvole od Federalnog ministarstva prostornog uređenja
				<b>Ukupno</b>					-	
4.2	M-1.8	003	Pelagićevo - Srebrenik, sanacija tunela Ormanica km 16+210	Izvođenje	1.232.000	927.000	JV Jata Group d.o.o. Srebrenik & Hering d.d.Široki brijeg, 01-02.3-7604/18. 06.09.2018.	1.853.519	-	Početak radova odgođen do aprila 2019 jer je na zahtjev lokalne zajednice i Vlade Tuz.kantona bilo neophodno najprije sanirati lokalnu cestu koja će biti korištena kao obilaznica
				Nadzor	62.000	44.000	JV Divel d.o.o.Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o. Mostar, 01-02.3-5708/18, 17.07.2018.	87.502	11.843	
				<b>Ukupno</b>					<b>11.843</b>	
<b>5. Rekonstrukcije - sanacije mostova</b>										
5.8	M-5	006	Gornje Bravsko - Ključ, most preko rijeke Sane, Ključ	Izvođenje	489.000	594.000	Hering d.d.Široki brijeg, 01-02.3-2429/18. 26.03.2018.	660.183	273.553	
				Nadzor	24.500	51.500	JV Divel d.o.o.Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o. Mostar, 01-02.3-5708/18, 17.07.2018.	51.529	54.934	U toku
				<b>Ukupno</b>					<b>328.487</b>	
5.9	M-5	007	Rogolji - Jajce jug, most preko rijeke Plive u Jajcu	Izvođenje	469.000	416.000	Hering d.d.Široki brijeg, 01-02.3-2429/18. 26.03.2018.	475.075	-	Početak radova odgođen za 2019 godinu obzirom da je Izvođač uveden u oktobru kada se ne mogu raditi radovi na antikorozijsnoj zaštiti
				Nadzor	23.500	47.600	JV Divel d.o.o.Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o. Mostar, 01-02.3-5708/18, 17.07.2018.	47.640	-	
				<b>Ukupno</b>					-	
5.12	M-5	010	Donji Vakuf - Turbe, most preko duboke prepreke Komar	Izvođenje	391.000	173.000	Hering d.d.Široki brijeg, 01-02.3-2429/18. 26.03.2018.	344.723	193.217	
				Nadzor	19.500	20.000	JV Divel d.o.o.Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o. Mostar, 01-02.3-5708/18, 17.07.2018.	36.945	38.271	U toku
				<b>Ukupno</b>					<b>231.488</b>	
5.16	M-16.4	001	Bugojno - Nević polje, most preko rijeke Vrbas, Bugojno	Izvođenje	1.060.000	505.000	Hering d.d.Široki brijeg, 01-02.3-2429/18. 26.03.2018.	839.597	622.258	
				Nadzor	53.000	53.000	JV Divel d.o.o.Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o. Mostar, 01-02.3-5708/18, 17.07.2018.	86.821	82.435	U toku
				kamata					21.457	
				<b>Ukupno</b>					<b>726.150</b>	
5.17	M-17	007	Nemila 0 – Lašva 0, most preko rijeke Bosne, Bosna IV i Bosna V	Izvođenje	967.000	700.000	Hering d.d.Široki brijeg, 01-02.3-2429/18. 26.03.2018.	1.882.270 –IV 653.903- V	19.656	U toku
				Nadzor	48.400	26.000	JV Divel d.o.o.Sarajevo, IG	84.585	-	

## JP CESTE FEDERACIJE BIH

							d.o.o. Banja luka IGH d.o.o. Mostar, 01-02.3-5708/18, 17.07.2018. (most IV)				
				<b>Ukupno</b>							<b>19.656</b>
5.19	M-17	018	Tasovčići - granica BIH/ RH, most preko rijeke Bregave, Tasovčići	Izvođenje	256.000	232.000	HP Investing d.o.o. Mostar, 01-02.3-8248/18. 27.09.2018.	290.747			58.711
				Nadzor	13.000	15.000	JV Divel d.o.o. Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o. Mostar, 01-02.3-5708/18, 17.07.2018.	17.500			6.507
				<b>Ukupno</b>							<b>65.218</b>
				Izvođenje	294.000	283.300	Hering d.d. Široki brijeg, 01-02.3-2429/18. 26.03.2018.	283.327			315.591
5.21	M-18	009	Olovo - Semizovac most preko rijeke Ljubine	Nadzor	15.000	35.600	JV Divel d.o.o. Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o. Mostar, 01-02.3-5708/18, 17.07.2018.	35.681			39.272
				<b>Ukupno</b>							<b>354.863</b>
<b>6. Rekonstrukcija crnih tačaka i opasnih mjesta</b>											
6.1	M-4.2	002	Skokovi - Srbijani, rekonstrukcija crne tačke "Mala Lisa" km 11+230	Izvođenje	190.000	173.000					-
				Nadzor	10.000	4.000	JV Divel d.o.o. Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o. Mostar, 01-02.3-5708/18, 17.07.2018.	19.445			-
				<b>Ukupno</b>							-
6.2	M-5	001	Granica BIH/ RH (Izačić) - Bihac, rekonstrukcija opasnog mjesta Kamenica (raskrsnica M-5 i R 403.a)	Izvođenje	247.000	-					-
				Nadzor	12.400	-					-
				<b>Ukupno</b>							-
6.3	M-17	011	Tarčin - Konjic, rekonstrukcija crne tačke km 16+800- km 17+600	Izvođenje	772.100	320.000	HP Investing d.o.o. Mostar, 01-02.3-8248/18. 27.09.2018.	634.672			31.051
				Nadzor	39.000	17.000	JV Divel d.o.o. Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o. Mostar, 01-02.3-5708/18, 17.07.2018.	44.723			28.482
				<b>Ukupno</b>							<b>59.533</b>
6.5	M-17	015	Mostar centar - Gnojnice, rekonstrukcija crne tačke južni ulaz Mostar, km 1+640	Izvođenje	260.000	245.000	HP Investing d.o.o. Mostar, 01-02.3-8248/18. 27.09.2018.	490.893			50.795
				Nadzor	13.000	10.000	JV Divel d.o.o. Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o. Mostar, 01-02.3-5708/18, 17.07.2018.	25.278			24.028
				<b>Ukupno</b>							<b>74.823</b>

## JP CESTE FEDERACIJE BIH

6.6	M-17	018	Tasovčići - Čapljina, rekonstrukcija crne tačke raskrsnica M 6 i M 17, km 0+009	Izvođenje	753.000	317.000	HP Investing d.o.o. Mostar, 01-02.3-8248/18. 27.09.2018.	1.057.316	117.405	U toku
				Nadzor	38.000	12.000	JV Divel d.o.o. Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o. Mostar, 01-02.3-5708/18, 17.07.2018.	53.473	15.193	
				<b>Ukupno</b>					<b>132.598</b>	
6.8	M-18		Vitalj - Olovo „Nula“ km 20+600 rekonstrukcija raskrsnice - crne tačke	Radovi	133.000	-	JV Jata Group d.o.o. Srebrenik, Roading d.o.o. Gračаница 01-02.3-7603/18. 06.09.2018.	339.461	-	Čeka se završetak eksproprij.
				Nadzor	7.000	-	JV Divel d.o.o. Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o. Mostar, 01-02.3-5708/18, 17.07.2018.	9.722	-	
				<b>Ukupno</b>					-	
6.7	M-18	006	Šiški Brod 3 - Živinice 1, rekonstrukcija crne tačke "Husino" km 2+500	Radovi	499.000	-	JV Jata Group d.o.o. Srebrenik & Hering d.d. Široki brijeg, 01-02.3-7604/18. 06.09.2018.	899.866	-	Čeka se završetak eksproprij.
				Nadzor	25.000	-	JV Divel d.o.o. Sarajevo, IG d.o.o. Banja luka IGH d.o.o. Mostar, 01-02.3-5708/18, 17.07.2018.	49.584	-	
				<b>Ukupno</b>					-	
<b>EIB + WB</b>				<b>Izvođenje</b>	<b>46.980.100</b>	<b>22.997.300</b>			<b>10.285.622</b>	
				<b>Nadzor</b>	<b>2.352.000</b>	<b>1.269.000</b>			<b>1.215.803</b>	
<b>1. Izgradnja cesta- Pobljšanje elemenata u postojećem koridoru</b>										
1.3	M-6.1	N	Južna obilaznica Mostara, dovršetak dionice Međine – Miljkovići L=6.7 km	Izvođenje	5.867.500	-				Rebalansom realizacija nije planirana.
				Nadzor	176.000	-				
<b>5. Rekonstrukcije - sanacije mostova</b>										
5.13	M-5	012	Nević polje - Kaonik, Sanacija mosta preko rijeke Bile u Staroj Bili	Izvođenje	267.000	-				
				Nadzor	8.000	-				
5.23	M-20		Obilaznica Goražde, most preko rijeke Drine postojeći most	Izvođenje	1.076.000	-				
				Nadzor	32.000	-				
<b>8. Sanacija šteta od poplava i modernizacija</b>										
8.1	M-1.8	001	Granica BIH/ RH (Lončari), rekonstrukcija /sanacija kolovoza	Izvođenje	2.677.000	-				
				Nadzor	80.000	-				
8.2	M-1.8	003	Pelagićevo-Srebrenik rekonstrukcija/sanacija kolovoza	Izvođenje	1.064.000	-				
				Nadzor	32.000	-				
<b>EBRD</b>				<b>Izvođenje</b>	<b>10.951.500</b>					
				<b>Nadzor</b>	<b>328.000</b>					
<b>SVEUKUPNO EIB + EBRD + WB</b>				<b>Izvođenje</b>	<b>66.630.800</b>	<b>29.762.300</b>			<b>15.355.859</b>	
				<b>Nadzor</b>	<b>3.430.000</b>	<b>1.864.000</b>			<b>1.694.218</b>	

Napomena: Iskazani iznosi su bez PDV-a.

Kredit EBRD još nije efektivan jer nisu ispunjeni neki od uvjeta koji prethode efektivnosti kredita, a to su:

- da je u Federaciji BiH usvojena legislativa koja osigurava da godišnje alokacije sredstava od naknada za naftu i naftne derivate za JP Ceste F BiH nisu manje od alokacija utvrđenih Zakonom o cestama F BiH od 15.03.2010;
- da BiH i Federacija BiH potpišu supsidijarni sporazum, te da nadležna ministarstva pravde BiH i F BiH osiguraju pravna mišljenja na kreditni, odnosno supsidijarni sporazum.

## 2.2. Konsultantske usluge

Red. Br.	Opis	Plan 2018.	Rebalans Plana 2018.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2018.	Izvor finansiranja	Napomena
1.	Konsultantske usluge za sigurnost prometa	782.000	-			-	Finansiranje 100% WB	Nije planirano
2.	Tehnička pomoć pri implementaciji projekta	50.000	113.000	Roughton International LTD. UK, 01-02.3-8736/17. 28.09.2017.	463.747	92.538	Finansiranje 100% EIB	U toku
				kamata		782	Vlastita sredstva	
3.	Tehnička pomoć za procjenu osjetljivosti cestovne mreže na klimatske promjene	782.000	-			-	Finansiranje 100% WB	Nije planirano
4.	Konsultantske usluge monitoringa tunela „Crnaja“ putem inklinometara	110.000	70.000	Geosonda d.o.o. Zenica. 01-02.3-11464/17. 27.12.2017.	164.731	104.251	Finansiranje 100% WB	Izvršena ugradnja inklinometara za potrebe geodetskog praćenja i osmatranja
5.	Vanjska kontrola Stolac – Neum (2%)	368.000	100.000			-	Finansiranje EIB/WB	Raspisan natječaj krajem oktobra 2018
6.	Vanjska kontrola – ostali projekti obuhvaćeni modernizacijom (1,5%)	593.000	-			-	Finansiranje EIB/ WB/ EBRD	Nije planirano
7.	Vanjska kontrola – nastavak radova na Karauli (1,5%)	130.500	-			-	Finansiranje 100% EIB	Nije planirano
<b>UKUPNO</b>		<b>2.815.500</b>	<b>283.000</b>			<b>197.571</b>		

Napomena: Iskazani iznosi su bez PDV-a.

U posmatranom izvještajnom periodu, u skladu sa zaključenim ugovorima, realizovane su slijedeće konsultantske usluge:

- tehnička pomoć Timu za implementaciju i upravljanje projektom pri implementaciji Projekta u upravljanju, administriranju i praćenju ugovora (uključujući tehničke, pravne, okolinske i socijalne aspekte) u cilju osiguranja implementacije projekata u skladu sa ugovornim uvjetima i tehničkim opisima;
- ugradnja inklinometara za potrebe geodetskog praćenja i osmatranja, te utvrđivanja ugroženosti objekta tunela Crnaja u cilju rekonstrukcije tunela Crnaja, obzirom da se tunel Crnaja nalazi u geološki nestabilnoj padini.

**2.3. Robe**

Red. Br.	NAZIV	Plan 2018.	Rebalans Plana 2018.	Realizovano 01.01.-31.12.2018.	Napomena
1.	Nabavka opreme za unapređenje prikupljanja podataka o stanju kolovoza	489.000	70.000	-	Finansiranje 100% WB
2.	Nabavka hardvera i softvera za sistem upravljanja cestovnom imovinom	1.467.000	-	-	
3.	Nabavka opreme za praćenje klimatskih promjena	391.000	-	-	
<b>UKUPNO</b>		<b>2.347.000</b>	<b>70.000</b>	-	

U posmatranom izvještajnom periodu vođene su aktivnosti na pripremi specifikacija za nabavku opreme i usaglašavanje sa predstavnicima Svjetske banke oko metoda nabavke.

**Kamate na međunarodne kredite**

Red. Br.	NAZIV	Plan 2018.	Rebalans Plana 2018.	Realizovano 01.01.-31.12.2018.	Napomena
1.	Kamate i servisni troškovi za program „Modernizacija cesta u FBiH“: EIB (370.000 KM), WB (32.000 KM).	621.000	402.000	309.986 14.981	EIB IBRD
<b>UKUPNO</b>		<b>621.000</b>	<b>402.000</b>	<b>324.967</b>	

U skladu sa Ugovorom o zajmu između Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i BiH zajam je podložan promjenljivoj kamatnoj stopi EURIBOR + 1% marže. Datumi plaćanja kamate 15. mart i 15. septembar svake godine.

U skladu sa kreditnim sporazumom između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i BiH koji je efektivan od 4.10.2017. kredit podliježe promjenljivoj kamatnoj stopi plus varijabilni raspon. Datumi plaćanja kamate 15. februar i 15. august svake godine.

Za povlačenje I tranše kredita EIB-a, u koordinaciji sa Federalnim ministarstvom finansija, odabrana je fiksna kamatna stopa 1,558 %.

**Revolving sredstva za PDV**

U skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost postoji mogućnost povrata PDV isplaćenog za izvršene radove i usluge koji se finansiraju iz međunarodnih ugovora. Plaćanje iznosa PDV-a ne može se vršiti iz međunarodnih kreditnih sredstava, nego se isti plaća iz sredstava JP Ceste F BiH. Za plaćeni PDV se podnosi zahtjev za povrat UIO, stoga sredstva imaju osobinu revolvinga. Zbog vremenske neusklađenosti isplata za PDV i priliva sredstava po osnovu povrata PDV, JP Ceste F BiH, tokom izvještajnog perioda su obezbjedile sredstva za izmirenje obaveza po osnovu PDV-a.

**REKAPITULACIJA PLANIRANIH ULAGANJA ZA  
PROGRAM „MODERNIZACIJA CESTA U FBiH“**

Red. br.	OPIS	Plan 2018.				Rebalans Plana 2018.				Realizovano 01.01.-31.12.2018.				
		EIB	EIB + WB	EBRD	WB	EIB	EIB + WB	EBRD	WB	EIB	EIB + WB	EBRD	WB	UKUPNO
<b>I</b>	<b>Radovi</b>	8.699.200	46.980.100	10.951.500		6.765.000	22.997.300	-		5.070.237	10.285.622			<b>15.355.859</b>
1.	Troškovi nadzora	750.000	2.352.000	328.000		595.000	1.269.000	-		478.415	1.215.803			1.694.218
2.	Vanjska kontrola	130.500	796.000	165.000			100.000							
3.	Monitoring tunela Crnaja				110.000								70.000	104.251
4.	Konsultantske usluge za sigurnost prometa				782.000									
5.	Tehnička pomoć pri implementaciji projekta	50.000				113.000				92.538				92.538
6.	Tehnička pomoć za procjenu osjetljivosti cestovne mreže na klimatske promjene				782.000									
<b>II</b>	<b>Konsultantske usluge</b>	930.500	3.148.000	493.000	1.674.000	708.000	1.369.000	-	70.000					<b>1.891.007</b>
<b>III</b>	<b>Robe</b>				2.347.000				70.000					
<b>IV</b>	<b>SVEUKUPNO (I+II+III)</b>	<b>9.629.700</b>	<b>50.128.100</b>	<b>11.444.500</b>	<b>4.021.000</b>	<b>7.473.000</b>	<b>24.366.300</b>	<b>-</b>	<b>140.000</b>	<b>5.641.190</b>	<b>11.501.425</b>	<b>-</b>	<b>104.251</b>	<b>17.246.866</b>

## JP CESTE FEDERACIJE BIH

### 3. Projekti JP Ceste F BiH

#### 3.1. Projekti iz prethodnog perioda

##### 3.1.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje

Red Br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2018.	Rebalans Plana 2018.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2018.	Napomena		
1.	M-5	Ažuriranje glavnog projekta obilaznice Donji Vakuf  Studija utjecaja na okoliš Studija za monitoring rijeke Vrbas	Projektovanje	85.000	85.100	JV Geoput d.o.o. Banja luka i INK Constructor d.o.o. Banja luka, 01-02.1-5797/16, 01.07.2016. Anex 01-02.1-8333/17, 13.09.2017.	79.525 12.636 (preneseno 85.141)	85.141	*Usluge okončane, nije naplaćen zadržani iznos 20 % ugovora do izdavanja okolinske -izdata		
			Revizija	2.100	2.100	IG d.o.o. Banja luka, 01-02.1-8903/16, 05.10.2016.	2.106	2.106			
			Kons usl.	-	3.400	JV ENOVA d.o.o. Sarajevo i ECOPLAN d.o.o. Mostar, * 01-02.1-1831/17, 07.03.2017. ENCOS d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-11155/18, 12.12.2018.	16.684 (preneseno 3.337)	-			
			<b>Ukupno</b>		<b>90.600</b>			<b>90.172</b>			
2.	M-5	Glavni projekat rekonstrukcije ceste na potezu Skela (tunel i cesta), L=cca 1km	Projektovanje	40.000	11.700	Divel d.o.o. Sarajevo 01-02.1-1406/17, 17.02.2017.	56.780 (preneseno 11.647)	11.647	Okončano		
			Revizija	5.600	2.800	Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-4018/17, 05.05.2017.	5.616 (preneseno 2.808)	2.808			
			<b>Ukupno</b>		<b>14.500</b>			<b>14.455</b>			
3.	M-14	Obilaznica Bihaća: Glavni projekat za dionicu: Jablanska ulica - čvor Mali Lug - veza na M-14  -Studija utjecaja na okoliš	Projektovanje	30.000	18.700	Institut za grad. IG d.o.o. Banja luka, 01-02.1-876/18, 02.02.2018.	18.498	-	Čeka se saglasnost Željeznica  Obuhvaćeno ugovorom *		
			Revizija	4.500	4.500	Trasa d.o.o. Sarajevo 01-02.1-7451/16, 24.08.2016.	4.446	-			
			Konsul.usl.	-	4.300			-			
			<b>Ukupno</b>		<b>27.500</b>			<b>-</b>			
4.	M-5	Glavni projekat rekonstrukcije ceste, dionica Jajce Jug -Donji Vakuf 1	Projektovanje	35.000	74.500	Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-387/17, 17.01.2017.	165.124 (preneseno 74.534)	74.534	Okončano		
			Revizija	4.600	2.300	Građevinski fakultet Sarajevo, 01-02.1-6428/17, 11.07.2017.	4.558 (preneseno 2.279)	2.279			
			<b>Ukupno</b>		<b>76.800</b>			<b>76.813</b>			
5.	M-5	Obilaznica Kiseljaka L=cca 2km Idejni projekt, studija izvodljiv. i stud. utjecaja na okoliš	Projektovanje	17.000	24.000	Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-8753/16, 30.09.2016. Anex 01-02.1-10501/17, 22.11.2017.	31.239 (preneseno 16.947) 6.874	<b>23.821</b>	Okončano		
6.	M-20	Obilaznica Goražda (Glavni projekti sanacije klizišta na trasi obilaznice) -glavni projekti -Studija utjecaja na okoliš	Projektovanje	10.000	9.400	JV Desing&QC d.o.o.Sarajevo i Sendo d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-1951/17, 09.03.2017.	45.630 (preneseno 9.360)	<b>9.360</b>	Okončano		
			Revizija	4.600	-			-			
7.	M-4.2	Obilaznica Cazina Glavni projekti objekata	Projektovanje	160.000	192.000	Divel d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-2002/18, 13.03.2018.			U toku		
			Potputnjak Osrednjak							25.177	24.570
			Natputnjak							35.967	35.100



## JP CESTE FEDERACIJE BIH

			Vijadukt 1				65.339	54.756	
			Vijadukt 2				65.339	38.977	
			Revizija	16.000	6.200	Trasa d.o.o. Sarajevo 01-02.1-5909/18, 25.07.2018.	6.201	-	
			Izmjena glavnog projekta trase	Revizija	-	-	Građevinski fakultet Sarajevo, 01-02.1-6428/17, 11.07.2017.	4.558 (preneseno 456)	
			<b>Ukupno</b>		198.200			<b>153.859</b>	
8.	M-5	Obilaznica Kiseljaka Glavni projekt objekata ( 2 vijadukta – cca 65 m i cca 50 m preko rijeke Lepenice	Projektovanje	50.000	40.000	Trasa d.o.o. Sarajevo 01-02.1-3500/18. 03.05.2018.	39.727	-	U toku
			Revizija	5.000	5.000	Ipsa Institut d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-7599/18, 06.09.2018.	4.680	-	
			<b>Ukupno</b>		45.000				
9.	M-6	Sjeverna obilaznica Gruda Glavni projekt objekata ( 2 vijadukta – cca 65 m i cca 50 m i 1 potputnjak l=cca 8 m )	Projektiranje	80.000	111.000	Ipsa d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-1964/18. 12.03.2018.	111.062	111.062	Okončano
			Revizija	8.000	8.000	Institut za građevinstvo IG d.o.o. Banja luka, 01-02.1-8933/18. 17.10.2018.	3.042	3.042	
			<b>Ukupno</b>		119.000				
10.	M-5	Obilaznica Donjeg Vakufa Gl. projekt rekonstrukcije mosta preko Oboračkog potoka (u raskrsnici)	Projektiranje	20.000	11.800	Divel d.o.o. Sarajevo 01-02.1-5677/18. 17.07.2018.	11.817	11.817	Okončano
			Revizija	2.500	2.500	Trasa d.o.o. Sarajevo 01-02.1-7704/18, 07.09.2018.	1.700	1.170	
			<b>Ukupno</b>		14.300				
11.	M-17.3	Izrada idejnog rješenja Obilaznice Stoca	Projektovanje	15.000	-			-	Projektni zadaci u pripremi (ugovoreno u 2019.)
		Obilaznica Stoca L=cca 11 km Priprema geotehnička studija (Misija G1)	Konsultantske	-	6.500			-	
		- Izrada idejnog rješenja, dionica Masline- Potplat L=cca 7km	Projektovanje	-	7.000			-	
		Izrada idejnog projekta, dionica Potplat-Stolac istok L=cca 4km	Projektovanje	-	6.500			-	
12.	M-4.2	Izrada glavnog projekta izgradnje veze obilaznica Cazina(Mihaljevac) i Bihaća (Kamenica) L= cca14km	Konsult.usl.	4.000	2.600	Ugovor o djelu 01-02.1-7164/18. 17.08.2018.	2.372	2.372	Nabavka u toku (ugovoreno u 2019)
			Projektovanje	130.000	250.000			-	
			<b>Ukupno</b>		252.600			2.372	
13.	M-14.1	Glavni projekat izgradnje dionice ceste Grmuša - Mali Radič, L=8km, uključujući Misiju G21	Projektovanje	54.000	5.700	Institut za građevinstvo IG d.o.o. Banja luka, 01-02.1-5678/18, 17.07.2018.	56.833	-	Projektovanje u zastoju zbog opasnosti od mina ( BH MAC – nije dostavio informaciju o području sumnjivom na mine)
			Revizija	8.000	8.000	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-10254/18. 20.11.2018.	2.925	-	
			<b>Ukupno</b>		13.700			-	
14.	M-16	Racionalizacija glavnog projekta sanacije crne tačke Trivunove krivine	Konsult.usl.	1.400	1.400	IPSA Institut d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-6223/17, 06.07.2017.	7.020 (preneseno 1.404)	1.404	Okončano
			Revizija	1.200	1.000	GF Sarajevo, 01-02.1-1651/18. 28.02.2018.	1.050	1.050	
			<b>Ukupno</b>		2.400			2.454	
15.	M-1.9	Glavni projekat rekonstrukcije ceste M-1.9 dionica: Slatina (gr.entiteta) - Gradačac, L=cca 5 km	Projektovanje	52.000	51.600	Institut za građ. IG d.o.o. Banja luka, 01-02.1-11494/17. 27.12.2017.	51.585	51.585	Okončano
			Revizija	6.000	2.900	Geoput Banja luka, 01-02.1-2346/18, 22.03.2018.	2.843	2.843	

## JP CESTE FEDERACIJE BIH

			Ukupno		54.500		54.428						
16.	M-17.4	Glavni projekat rekonstrukcije ceste M-17.4 dionica: Mostar – Čitluk - Ljubuški - Crveni grm	Projektovanje	52.000	51.100	Institut za građ. IG d.o.o. Banja luka, 01-02.1-11494/17. 27.12.2017.	51.106	51.105	Okončano				
			Revizija	6.000	3.000	Geoput Banja luka, 01-02.1-2346/18. 22.03.2018.	2.937	2.937					
			<b>Ukupno</b>		54.100			<b>54.042</b>					
17.	M-1.8	Idejno rješenje veze magistralnih cesta M-1.8 i M-14.2 (Orašje jug - Donja Mahala) L=cca 5km	Projektovanje	5.000	5.000	Saraj Inženjering d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-10518/17, 23.11.2017.	4.984	4.984	Okončano				
18.	M-5 M-6.1	Izrada Skraćenih akcijskih planova preseljanja za projekte izgradnje trake za spora vozila na dionici: - Ripač - Dubovsko - Posušje – Grude - Široki Brijeg	Konzult.usl.	7.000	7.000	ENOVA d.o.o.Sarajevo, 01-02.3-10204/17 15.11.2017.	3.510 Ripač 3.510 Široki	7.020	Okončano				
19.	M-14	Idejno rješenje obilaznice Bosanska Otoka (veza cesta M-14 i R 401)	Projektovanje	10.000	10.000	Desing&QC d.o.o.Sarajevo. 01-02.1-10335/18, 21.11.2018.	6.786	-	U toku				
20.	M-15	Idejni projekat izgradnje ceste M-15, dionica Vrhpolje - Donje Sokolovo – Crljeni,	Projektovanje	40.000	40.000			-	Tender u pripremi				
21.	Pribavljanje suglasnosti, elaborata i dozvola za projekte iz programa Modernizacije; Uskladiv. sa Smjericama i prevod. dokum. na engleski jezik		Ostalo Konzult.usl.	500.000	100.000								
	M-18	Izgradnja traka za spora vozila dionica: -Čevljanovići-Nišići									Saglasnost	152	152
	M-5	Izgradnja obilaznice Donji Vakuf									Naknada Saglasnost	612	612
	M-20	Izgradnja obilaznice Goražde									Naknada FMOiT	1.934	1.934
	M-6	Izgradnja Sjeverne obilaznice Gruda									Naknade	609	609
		-Izrada studije za izdavanje vodnih akata									Integra d.o.o. Mostar, 01-02.1-8362/18, 01.10.2018.	6.201	-
	M-5	-izrada elborata za prethodnu procjenu uticaja na okoliš									Ecoplan d.o.o. Mostar 01-02.1-7004/18. 15.08.2018.	6.786	6.786
		Studije za pribavljanje prethodbe vodne sagalsnosti, i studije za pribavljanje vodne saglasnosti izgradnja trake Bos.Petrovac-Ključ									Euroing d.o.o. Bihać, 01-02.1-1483/18-VA, 22.02.2018.	6.435	7.157
	M-20	Revizija glavnih projekta:Izgradnja pješačke staze sa rješavanje odvodnje, M20 009, dionica: ustikolina-Goražde 8, Bačci-Vinarići, km 19+995 do km21+030									Oglas	722	
	M-18	Izgradnja trake za spora vozila, dionica Priboj 2 - Simin Han1, L=cca 2 km									Pronasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-891/18. 02.02.2018.	1.170	1.358
	M14.2	Izgradnja trake za spora vozila, dionica: Bos.Petrovac- Drvar									Taksa	188	
											ZT Tehnozaštita d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-11497/17. 28.12.2017.	936	1.676
	M-18	Rekonstrukcija crne tačke Husino dionica:Šićki B-Živinice									Saglasnost	740	
											Saglasnost Naknada	117 1.556	1.673
	M-4.2	Rekonstrukcija raskrsnice Skokovi-Srbljani Mala Lisa									Oglašavanje, naknada	977 135	1.112
	M-18	Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-18 "Olovske Luke" dionica ( 008), km 20+600									Taksa	4.594	4.594
M-16.4	Bugojno - Nević polje, most preko rijeke Vrbas, Bugojno	Naknada, oglasi	1.710 585	2.295									
M-5	Gornje Bravsko - Ključ, most preko rijeke Sane, Ključ	Taksa, Oglas	964 281	1.245									
		Taksa	380	380									
M-5	Rekonstrukcija mosta na rijeci Biloj km4+988 NevićPolje-Kaonik	ZT Tehnozaštita d.o.o. Sarajevo, 16.04.2018.	878	1.255									

# JP CESTE FEDERACIJE BIH

					Saglasnost	377	
					Taksa, naknade	258	
M-5	Izgradnja obilaznic Bihaca				JV ENOVA d.o.o. Sarajevo i ECOPLAN d.o.o. Mostar, 01-02.1-1831/17, 07.03.2017.	25.026 (preneseno 4.345)	258
	Studija utjecaja na okoliš						
M-5	Izgradnja treće trake dionica Donji Vakuf-Turbe				Naknada Saglasnost, Taksa	288 160 130	578
M-15	Izgradnja treće trake Livno-Šujica				Saglasnost	109	109
M-17	Rekonstrukcija mosta na rijeci Bosni Bosna IV km 63+795				Naknada	78	78
M-17	Rekonstrukcija mosta na rijeci Bregavi Tasovčići-granica HR				Oglas	571	571
M17	Rekonstrukcija mosta na rijeci Bosni, Jošanica I -Stupl, km2+962				TZI Inženjering d.o.o Sarajevo	500	-
M-5	Sanacija mosta preko Sandžačke rijeke, dionica Jajce Jug - Donji Vakuf 1, km 26+245				Saglasnosti Takse	320	320
M-4	Sanacija mosta preko potoka , dionica Teslić (Barići) - Karuše, km 13+917				Naknada	178	178
M-17	Rekonstrukcija tunela Vranduk km64+590-km65+650				Saglasnosti Takse oglasi	33.784	33.784
M-1.8	Rekonstrukcija tunela Ormanica 003 Pelagićevo-Srebrenik, km16+210				Oglas	571	571
M-4	Rekonstrukcija tunela, Simin Han1 - Donje Caparde, km 2+775				Oglas	1.694	1.694
M-17	Rekonstrukcija tunela Crnaja Konjic-Jablanica, km 15+082				Oglas	868	868
M-20	Sanacija asfaltnog kolovoza Goražde 8-Ustikolina km 0+500-km 2+880				Taksa	618	618
M-20	Rekonstrukcija kolovozne konstrukcije sa odvodnjom Goražde 7-Ustiprača				Taksa	396	396
M-17	Izgradnja južne obilaznice Mostar, Miljkovići-Rodoč I faza (prevođenje thn.dok na engl)				Integra d.o.o. Mostar, 01-02.1-8158/18, 24.09.2018.	6.845	7.828
M-17	Rekonstrukcija tunela Vranduk 2 i izgradnja tunela Žaba - -određivanje kategorije stijenske mase za tunele i učešće stručnjaka geomehaničara u Geotehničkom vijeći				Oglas, taksa	983	
M-5	Izmjena projektne dokumentacije – rekonstrukcija raskrsnice u naselju Kamenica, grad Bihać				Ugovor o djelu, 01-03.2-9147/18, 24.10.2018.	12.097	1.008
M-1.8	Sanacija Tunela Ormanica (preusmjeravanje saobraćaja)				Desing&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-9781/18, 07.11.2018.	5.850	6.795
M-5	Glavni projekat rekonstrukcije ceste, dionica Jajce Jug -Donji Vakuf 1				ostalo	945	
M-1.8	Rekonstrukcija mosta Špionički potok				Sporazum sa Općinom Gradačac 01-02.1-8231/18. 10.10.2018	265.000 50% Općina 50% JP Ceste F BiH	-
M-17	Tarčin - Konjic, rekonstrukcija crne tačke km 16+800- km 17+600				Taksa	106	106
M-17	Tasovčići - Čapljina, rekonstrukcija crne tačke raskrsnica M 6 i M 17, km 0+009				naknade	106	106
	Neum_Stolac				Oglas	429	429
M-17.3	Studija zaštite okoliša za Neum-Stolac				Oglas	213	213
					Oglas	680	680
					JV Enova d.o.o.Sarajevo & Zagrebinspekt Ltd.	-4.840	-4.840

## JP CESTE FEDERACIJE BIH

Red. br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2018.	Rebalans Plana 2018.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 01.01.-31.12.2018.	Napomena
		dionica: Broćanac-Cerovica-Drenovac				Mostar, 01-02.3-1835/17. 07.03.2017.			
		Izgradnja tunela Žaba				Oglas, taksa	883	883	
		Izgradnja tunela Oštrovac				Oglas	1.377	1.377	
	M-17	Crna tačka- Gnojnice- Mostar jug				taksa	180	180	
	M-5	Izgradnja treće trake Ripač-Dubovsko				Kopiranje dokument i taksa	612	612	
	M-16.4	Izgradnja Obilaznice Bugojna				Taksa Konsult usl	450 500	450 500	
	M-5	Glavni projekat rekonstrukcije ceste: Busovača-Draga, km 5+200- km 6-050				taksa	565	565	
	M-5	Devijacija puta AVNOJ-a u Bihaću -Izrada studije za dobijanje vodne saglasnosti				Oglas	1.346	1.346	
	M-20	Rekonstrukcija raskrsnice u Vitkovićima				Oglas, taksa	1.582	1.582	
	M-20	rekonstrukcije raskrsnice u kružni tok , u Goraždu na cesti M-20, dionica Goražde 8-Ustiprača, km 0-550				Oglas	293	293	
	M-18	Izgradnja ceste - prevoj Karaula				taksa	52	52	
	M-6	Treća traka M-6.1 Tomislav grad-Široki brijeg				takse	9.853	9.853	
		<b>UKUPNO</b>				Oglas	714	714	
22.	M-5	Dionica Gromiljak-Blažuj, Poddionica Han Ploča -Šamin Gaj (Kobiljača)	Revizija	-	2.500	Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-11588/16 30.12.2016	4.914 (preneseno 2.457)	2.457	Okončano
23.	M-15	Obilaznica Livna (veza M-15 i M-6.1) Glavni projekat, L=cca 3km	Revizija	-	2.300	Građevinski fakultet Sarajevo, 01-02.1-6428/17, 11.07.2017.	4.558 (preneseno 2.279)	2.279	Okončano
24.	M-16.4	Izgradnja Obilaznice Bugojna	Projektovanje	-	12.000	IPSA Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7262/17. 10.08.2017.	29.998 (preneseno 11.892)	11.893	Okončano
			Revizija	-	3.000	Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-9740/17. 03.11.2017.	3.042	3.042	
			<b>Ukupno</b>	-	15.000			14.935	
		<b>UKUPNO</b>			1.471.500	1.198.400		744.135	

\* JV ENOVA d.o.o. Sarajevo i ECOPLAN d.o.o. Mostar, 01-02.1-1831/17, 07.03.2017. – Ugovorena izrada studija za izdavanje okolišni dozvola. Studije su blagovremeno urađene i dostavljene -20% zadržano do izdavanja okolinski dozvola.

### 3.1.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica

Red. br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2018.	Rebalans Plana 2018.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 01.01.-31.12.2018.	Napomena
1.	M-4.2	Rasvjeta raskrsnice cesta M-4.2 i M-14 u Srbijanima	Projektovanje	7.000	7.000	Projecta d.o.o. Mostar, 01-01.1-8356/18, 01.10.2018.	6.997	6.997	Okončano
2.	M-16 006	Sanacija semafora u Jajcu	Izvođenje	-	7.000	Step d.d. Sarajevo, 01-02.2-11355/17. 21.12.2017.	7.013	6.399	Okončano
3.	M-17	Rasvjeta Petlje Zenica Blatuša	Naknada			ZT Tehnozaštita Taksa	585 150	735	Okončano
				7.000	14.000			14.131	

## JP CESTE FEDERACIJE BIH

### 3.1.3. Poboljšanje sigurnosti prometa na magistralnim cestama izgradnjom traka za lijeva skretanja, pješačkih staza sa odvodnjom kišne kanalizacije, odmorišta i sanacija crnih tačaka

Red Br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2018.	Rebalans Plana 2018.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 01.01.-31.12.2018.	Napomena
1.		Saglasnosti i takse na projekte:	Ostalo	50.000	50.000				
	M-5	Rekonstrukcija raskrsnica cesta M-5 i M15 izlaz iz Ključa				Saglasnost	450	450	
	M-5	Rekonstrukcija raskrsnice na M-5 Jajce Donji Vakuf Skela most Rika km 0-894				Naknada	112	112	
	M-4.2	Rekonstrukcija raskrsnice Todorovo				Taksa	660	660	
	M-17	Rasvjeta mosta Begića-Begovića, dionica: Konjic-Mostar				Saglasnost	3.454	3.454	
	M-18	Izmještanje dijela ulice Alipašina na M-18_010.Semizovac-Sarajevo-Malta, Šip (izrada elaborata zaštitna)				ZT Tehnozaštita d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-8160/18, 24.09.2018.	936	936	
						Saglasnost	94	94	
	M-18	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na M-18, Semizovac Sarajevo-Malta, ulaz u Vogošću (elaborat zaštite na radu i zaštite od požara)				ZT Tehnozaštita d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-8159/18, 24.09.2018.	936	1.371	
						Saglasnost, Takse	435		
	M-5	Glavni projekat rekonstrukcije i dogradnje pješačke staze Gromljak – Blažuj				Arting d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-8163/18, 25.09.2018.	6.961	6.961	
	M-5	Glavni projekat rekonstrukcije raskrsnice na M-5 dionica:Kaonik-Gromljak, poddionica:Busovača-Druga				Pronasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-8775/18, 10.10.2018.	6.962	6.962	
	M-5	Glavni projekat rekonstrukcije ceste na potezu Skela (tunel i cesta), L=cca 1km				Taksa	38	38	
	M-14	Izgradnja obilaznice Bihaća, dionica Jablanska ulica-čvor Mali Lug-veza na M14				Komisija Željeznice) naknada	585	585	
	M-16.2	Izgradnja podhodnika kod skretanja za naselje Podgrađe, općina Prozor				Oglas	288	288	
	M-4	Magistralna cesta Doboj - Tuzla, dionica Dražnik (bolnica „Kreka“) - petlja Šićki Brod				Naknada	1.323	1.323	
	M-5	Dionica Gromljak-Blažuj, Poddionica Han Ploča -Šamin Gaj (Kobiljača)				Taksa	12.124	12.124	
	M-14.1	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok Odžak				Oglas	288	288	
	M-14	Rekonstrukcija raskrsnice M-14 i Ulice Prvomajska u Bosanskoj Krupi				Naknada	714	714	
	M-4	Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Klokotnica, II faza				Naknada	35	35	
	M-18	Rušenje postojećeg i izgradnja novog mosta preko Crne rijeke u Bašcima, km 42-726				Tehnozaštita	936	936	
	M-5	Sanacija mosta preko potoka Mrižnica, lokacija Kamenica, km 7-765				Taksa	40	40	
M-17.4	Izgradnja pješačke staze u Ljubuškom.	Taksa	420	420					
M-5	Devijacija ceste kod Robota, Bihać	Taksa, naknada	890	890					
M-17	Rekonstrukcija ceste i nadvožnjaka Brijesće	Taksa	39	39					
M-18	Rekonstrukcija mosta na Ljubini km27-523	Taksa	264	264					
		<b>Ukupno</b>		50.000		<b>38.985</b>			
2.	M-15	Rekonstrukcija raskrsnice Gorica u Livnu u kružni tok	Izvođenje	287.000	287.000	Livnopotovi d.o.o. Livno 01-02.1-10585/15. 16.12.2015	286.407	-	Obnovljena građevinska dozvola

## JP CESTE FEDERACIJE BIH

			Nadzor	7.000	7.000	Integra d.o.o. Mostar, 01-02-1-11589/16, 30.12.2016	6.903	-		
			<b>Ukupno</b>		294.000			-		
3.	M-14	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M-14_001, (dionica: Bihać - Srbljani) i lokalne ceste za naselje Brekovića sa rekonstrukcijom/ dogradnjom mosta preko rijeke Une, km7+830	Izvođenje	784.000	784.000			-	Zbog nemogućnosti dobijanja građevinske dozvole – kolizija sa HE Kostela, potrebna izmjena projektne dokumentacije koju će finansirati EP BiH	
			Nadzor	31.000	31.000	Konzorcij: Divel d.o.o. Sarajevo, Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo i IG Institut d.o.o. Banja luka, 01-02.2-5967/16, 11.07.2016.	30.946	-		
			-Varijante rješenja rekonstrukcije raskrsnice	Konsult.usl.	-	7.000	Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-8144/18, 24.09.2018.	6.435		6.435
			<b>Ukupno</b>		822.000			<b>6.435</b>		
4.	M-17	Izgradnja pješačke staze ulaz u Mostar (Vrapčići – Zalik)	Izvođenje	40.000	40.000	Konzorcij: Babić d.o.o. Jablanica i Bosman d.o.o. Sarajevo 01-02.2-890/17, 01.02.2017.	306.123 (preneseno 39.892)	10.217	Okončano	
5.	M-5	Rekonstrukcija raskrsnice na obilaznici Viteza	Izvođenje	266.600	267.000	Ceste-Company d.o.o. Kiseljak, 01-02.2-7232/18, 23.08.2018.	266.565	-	U toku	
			Nadzor	15.000	15.000	Konzorcij: Divel d.o.o. Sarajevo, Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo i IG Institut d.o.o. Banja luka, 01-02.2-5967/16, 11.07.2016.	14.625	-		
			<b>Ukupno</b>		282.000			-		
6.	M-14.1	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok Odžak	Izvođenje	240.000	240.000	Balegem d.o.o. Gradačac, 01-02.2-10404/16, 22.11.2016.	239.547	-	Eksproprijacija nije okončana	
			Nadzor	17.000	17.000	Konzorcij: Divel d.o.o. Sarajevo, Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo i IG Institut d.o.o. Banja luka, 01-02.2-5967/16, 11.07.2016.	16.731	-		
			<b>Ukupno</b>		257.000			-		
7.	M-4	Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Velika Brijesnica	Revizija		-	Pronasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-890/18 02.02.2018.	1.170	1.170	Okončano	
			Izvođenje	291.000	-			-		
			Nadzor	16.000	-			-		
8.	M-18	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na Šipu, sa izmještanjem dijela Ulice Alipašina, općina Centar, Sarajevo	Projektovanje	22.800	22.800	Desing&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-1655/17. 28.02.2017.	22.815	22.815	Eksproprijacija nije okončana	
			Revizija	7.000	7.000	TZI Inženjering d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-8222/18, 26.09.2018.	6.903	6.903		
			<b>Ukupno</b>		29.800			<b>29.718</b>		
9.	M-5 012	Rekonstrukcija raskrsnice sa M-5 i R-441 (Vjetrenica), općina Vitez	Projektovanje	7.500	6.500	GP:IPSA Institut d.o.o.Sarajevo, Divel d.o.o.Sarajevo, INK Constructor d.o.o. Banja luka, Geoput d.o.o. Banja luka, 01-02.2-6795/17, 26.07.2017.	9.272 (preneseno 6.490)	1.854	U toku	
			Revizija	1.000	1.000			-		
			<b>Ukupno</b>		7.500			<b>1.854</b>		

## JP CESTE FEDERACIJE BIH

10.	M-17.3 003	Hutovo – Neum, potez prolaz kroz Neum, rješavanje oborinske kanalizacije na postojećoj cesti, L=1,2km (1faza)	Projektovanje	5.000	-					
			Izvođenje	200.000	300.000	HP Investing d.o.o. Mostar 01-02.4-8543/18, 05.10.2018.	323.052	-	U toku	
			Nadzor	7.000	7.000	Integra d.o.o.Mostar, 01-02.4-3528/18. 03.05.2018.	6.786	-		
			<b>Ukupno</b>		307.000					
11.	M-4.2	Rekonstrukcije raskrsnice M-4.2, Ul. Žrtava domovinskog rata i Ul. 25. novembra, dionica: Skokovi - Srbijani (Mala Lisa)	Projektovanje	7.600	7.600	Ipsa Institut d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-6795, 26.07.2017.	15.122 (preneseno 7.561)	-		
			Revizija	2.000	2.000	Aber Desing d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-7227/18. 22.08.2018.	1.989	1.989	Okončano	
			Projektovanje			ASI Inžinjering d.o.o. Sarajevo	2.300	2.300		
			<b>Ukupno</b>		9.600			4.289		
12.	M-16.2	Izgradnja pješačke staze M-16.2 (001), km 11+500 do km 12+000, općina Gornji Vakuf	Izvođenje	98.000	98.200	Rudnici gipsa z.d.d. Sarajevo, 01-02.2-10661/17. 29.11.2017.	98.197	92.793	Okončano	
			Nadzor	6.000	5.600	Arting d.o.o.Sarajevo. 01-02.4-9338/17. 19.10.2017.	5.616	5.616		
			<b>Ukupno</b>		103.800			98.409		
13.	M-6.1	Rekonstrukcija raskrsnice na M6.1 sa lokalnom cestom za Blagaj, km 2+000	Projektovanje	11.900	10.400	GP:IPSA Institut d.o.o.Sarajevo, Divel d.o.o.Sarajevo, INK Constructor d.o.o. Banja luka, Geoput d.o.o. Banja luka, 01-02.2-6795/17, 26.07.2017.	14.800 (preneseno 10.400)	2.960	U toku	
			Revizija	-	1.800	IG d.o.o. Banja luka, 01-02.2-7945/18, 14.09.2018	1.778	-		
			<b>Ukupno</b>	11.900	12.200			2.960		
14.	M-5 M-15	Rekonstrukcija raskrsnica cesta M-5 i M15 izlaz iz Ključa	Projektovanje	11.800	8.800	GP:IPSA Institut d.o.o.Sarajevo, Divel d.o.o.Sarajevo, INK Constructor d.o.o. Banja luka, Geoput d.o.o. Banja luka, 01-02.2-6795/17, 26.07.2017.	14.683 (preneseno 8.810)	1.468	U toku	
			Revizija	-	1.800	IG d.o.o. Banja luka, 01-02.2-7945/18, 14.09.2018	1.779	-		
			<b>Ukupno</b>	11.800	10.600			1.468		
15.	M-4	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na M-4, ulaz u Lukavac	Projektovanje	12.600	11.600	GP:IPSA Institut d.o.o.Sarajevo, Divel d.o.o.Sarajevo, INK Constructor d.o.o. Banja luka, Geoput d.o.o. Banja luka, 01-02.2-6795/17, 26.07.2017.	19.334 (preneseno 11.600)	1.933	U toku	
			Revizija	-	1.800	IG d.o.o. Banja luka, 01-02.2-7945/18, 14.09.2018	1.778	-		
			<b>Ukupno</b>	12.600	13.400			1.933		
16.	M-5	Izgradnja pješačke staze uz M-5, 001 granica BiH/ RH – Izačić - Bihać u naseljenom mjestu Izačić, L=1,2km	Konsult.usl.	11.000	11.000	Desing&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-10302/18. 21.11.2018.	7.956	7.956	U toku	
			Projektovanje	7.000	7.000	Desing&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-11478/18. 19.12.2018.	6.903	-		

## JP CESTE FEDERACIJE BIH

			Revizija	2.000	2.000			-	
			<b>Ukupno</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>			<b>7.956</b>	
17.	M-5	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M-14.2 i M-5 u Bosanskom Petrovcu	Projektovanje	13.600	9.700	GP:IPSA Institut d.o.o.Sarajevo, Divel d.o.o.Sarajevo, INK Constructor d.o.o. Banja luka, Geoput d.o.o. Banja luka, 01-02.2-6795/17, 26.07.2017.	19.334 (preneseno 9.667)	-	U toku
			Revizija	-	1.800	IG d.o.o. Banja luka, 01-02.2-7945/18, 14.09.2018	1.779	-	
			<b>Ukupno</b>	<b>13.600</b>	<b>11.500</b>			<b>-</b>	
18.	M-5	Rekonstrukcija raskrsnice M-5 i lokalne ceste u Travniku (Plava voda)	Projektovanje	10.500	7.400	GP:IPSA Institut d.o.o.Sarajevo, Divel d.o.o.Sarajevo, INK Constructor d.o.o. Banja luka, Geoput d.o.o. Banja luka, 01-02.2-6795/17, 26.07.2017.	17.724 (preneseno 10.362)	-	U toku
			Revizija	-	1.800	IG d.o.o. Banja luka, 01-02.2-7945/18, 14.09.2018	1.778	-	
			<b>Ukupno</b>	<b>10.500</b>	<b>9.200</b>			<b>-</b>	
19.	M-14	Rekonstrukcija raskrsnice M-14 i Ulice Prvomajska u Bosanskoj Krupi	Projektovanje	3.500	3.500	Pronasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-7298/17, 11.08.2017.	6.962 (preneseno 3.481)	3.481	Okončano
			Revizija	2.000	2.000	Geofeld d.o.o. Bihać, 01-01.1-5978/18, 26.07.2018.	1.989	1.989	
			<b>Ukupno</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>			<b>5.470</b>	
20.	M-17	Izgradnja pješačke staze i rasvjete u Kosovi, općina Maglaj	Projektovanje	7.000	2.000	AIK Inžinjeri d.o.o. Banovići, 02-02.2-11181/17, 15.12.2017.	1.989	<b>1.989</b>	Okončano
21.	M-18	Rekonstrukcija raskrsnice na M-18 010 Kobilja Glava-Sarajevo - Malta km 8+340	Projektovanje	10.000	8.500	GP:IPSA Institut d.o.o.Sarajevo, Divel d.o.o.Sarajevo, INK Constructor d.o.o. Banja luka, Geoput d.o.o. Banja luka, 01-02.2-6795/17, 26.07.2017.	14.169 (preneseno 8.502)	1.417	U toku
			Revizija	3.000	3.000	Aber Desing d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-11579/18, 24.12.2018.	2.925	-	
			<b>Ukupno</b>	<b>13.000</b>	<b>11.500</b>			<b>1.417</b>	
22.	M-5	Izgradnja pješačke staze na M-5 (naselje Putiš), općina Busovača	Projektovanje	7.000	2.500	Desing&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-11015/17, 11.12.2017.	2.500	<b>2.500</b>	Okončano
23.	M-17	Izrada glavnog projekta raskrsnice sa pješačkim stazama na M-17 dionica: Jablanica - Mostar, mjesto Vrapčiči	Projektovanje	15.000	15.000	Sarajinžinjeri d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-8461/18, 03.10.2018.	7.862	<b>7.862</b>	Okončano
24.	M-6	Rješavanje odvodnje u Stocu, II faza	Izvođenje	170.000	150.000	HP Investing d.o.o. Mostar, 01-02.2-7253/18, 23.08.2018.	141.014	141.009	Okončano
			Nadzor	7.000	7.000	Interprojekat d.o.o. Mostar, 01-02.2-6590/18, 09.08.2018.	6.921	6.921	
			<b>Ukupno</b>	<b>177.000</b>	<b>157.000</b>			<b>147.930</b>	
25.	M-6.1	Rekonstrukcija raskrsnice u naseljenom mjestu Bobara, dionica Kolo - Posušje, II faza	Izvođenje	100.000	108.300	KTM Brina d.o.o. Posušje, 01-02.1-8458/18, 03.10.2018.	106.636	77.487	U toku
			Nadzor	5.000	5.000	Integra d.o.o. Mostar, 01-02.1-6976/18,	4.914	3.931	



## JP CESTE FEDERACIJE BIH

						14.08.2018.			
			<b>Ukupno</b>	105 000	113.300				<b>81.418</b>
26.	M-14 003	Bosanska Krupa I – Otoka, izgradnja pješačke staze L=1,0 km	Izvođenje	320.000	352.000	BC-Gradnja d.o.o. Bosanska Otoka, 01-02.2-8202/18, 26.09.2018.	352.501	352.258	Okončano
			Nadzor	7.000	7.000	Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-8355/18, 01.10.2018.	6.669	6.669	
			<b>Ukupno</b>	327 000	359.000				
27.	M-15 007	Igradnja pješačke staze uz magistralnu cestu M-15 u naselju Priluka, općina Livno	Projektovanje	7.000	7.000	Integra d.o.o. Mostar, 01-02.1-5772/18, 20.07.2018.	6.950	6.950	U toku
			Izvođenje	170.000	250.000	Livnoputevi d.o.o. Livno, 01-02.2-8204/18, 26.09.2018.	235.675	160.696	
			Nadzor	3.000	7.000	Geo-data d.o.o. Mostar, 01-01.1-8357/18. 01.10.2018.	6.950	4.739	
			<b>Ukupno</b>	180 000	264.000				<b>172.385</b>
28.	M-17	Izgradnja pješačke staze Karuše – Mravići	Izvođenje	190.000	190.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
29.	M-18	Rekonstrukcija raskrsnice M-5 i M-18 Jošanica u kružni tok	Izvođenje	1.000.000	1.083.000	Bosman d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-9077/18, 22.10.2018.	1.082.992	-	Žalba na odluku za nadzor
			Nadzor	30.000	17.000			-	
30.	M-4	Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Klokotnica, II faza	Projektovanje	7.000	7.000	Arting BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-7541/18, 05.09.2018.	7.000	-	U toku
			Revizija	-	1.000			-	
			<b>Ukupno</b>	7.000	8 000			-	
31.	M-5	Rekonstrukcija ceste M-5, potez Kamenica – Bedem sa rekonstrukcijom raskrsnica i izgradnjom pješačkih i biciklističkih staza	Projektovanje	50.000	28.100			-	U toku
32.	M-6	Izgradnja nogostupa na M-6 _001 km 15+500 - km 16+500 na dionici Gorica -Vitina, mjesto Ružići (lijeva strana kolnika)	Projektovanje	6.000	-			-	Nije planirano
33.	M-6.1	Rekonstrukcija raskrsnice M-6.1 i R-420 u naseljenom mjestu Viajani, općina Posušje	Projektovanje	10.000	10.000	Geoput d.o.o.Banjaluca, 01-02.2-8996/18, 19.10.2018.	6.669	-	U toku
34.	M-14	Rekonstrukcija raskrsnice magistralnih cesta M-14 i M- 14.2 u Bosanskoj Krupi	Projektovanje	15.000	15.000			-	Tender u toku
35.	M-14	Izgradnja pješačkih staza, izlaz iz Bosanske Krupe, L=1000 m	Projektovanje	7.000	7.000	Geo Feld d.o.o.Bihać, 01-01.1-5976/18. 26.07.2018.	6.786	<b>6.786</b>	Okončano
36.	M-17	Idejni projekat rekonstrukcije raskrsnice M17 i lokalne ceste za naselje Papratnica, općina Žepče	Projektovanje	-	5.900	Desing&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-6622/17, 18.07.2017.	5.850	<b>5.850</b>	Okončano
37.	M-16	Izgradnja pothodnika na M16 (skretanje za naselje Podgrađe), dionica: Prozor/Rama- C.Vakuš Uskoplje	Projektovanje	-	8.100	GP:IPSA Institut d.o.o.Sarajevo, Divel d.o.o.Sarajevo, INK Constructor d.o.o. Banja luka,Geoput d.o.o. Banja luka, 01-02.2-6795/17, 26.07.2017.	13.473 (preneseno 8.084)	<b>8.084</b>	Okončano
38.	M-5	Glavni projekat rekonstrukcije ceste:Busovača-Druga, km 5+200- km 6+050	Prev. tehn.dok	-	7.600	Arting BH d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-9692/17,	7.605	<b>7.605</b>	Okončano

## JP CESTE FEDERACIJE BIH

						01.11.2017.			
39.	M-5	Devijacija puta AVNOJ-a u Bijaču -Izrada studije za dobijanje vodne saglasnosti	Konsult.usl.	-	1.800	Higracon d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-11506/17. 28.12.2017.	1.755	1.755	Okončano
				<b>4.647.400</b>	<b>4.597.900</b>			<b>1.015.372</b>	

Rb.8.- Na osnovu Sporazuma projektovanje i reviziju sufinansira Općina Centar.

Rb.29. - Na osnovu Sporazuma, izvođenje radova u iznosu od 1,00 mil.KM finansira Kanton Sarajevo.

### 3.1.4. Vanredno održavanje

#### 3.1.4.1. Sanacija cestovnih objekata

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2018.	Rebalans Plana 2018.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2018.	Napomena
1.	M-18	Rekonstrukcija ceste i pločastog propusta preko Crne rijeke, u Delijašu, dionica Ustikolina – Trnovo, km 37+257	Izvođenje	361.000	361.400	HP Investing, d.o.o. Mostar, 01-02.1-11541/16, 29.12.2016.	361.373	360.989	Okončano
			Nadzor	5.100	5.100	IG d.o.o. Banja luka, 01-02.1-1588/17. 27.02.2017.	5.090	5.084	
			<b>Ukupno</b>			366.500			
2.	M-5	Glavni projekt rušenja postojećeg i izgradnje novog mosta preko potoka Bravnice u Bravnicama (M-5-009-508), dionica: Jajce Jug – Donji Vakuf 1, km 3+746	Projektovanje	10.000	-			-	Nije planirano Okončano u 2017.
			Revizija	2.900	-			-	
3.	M-17	Glavni projekt sanacije tunela Vranduk II, (T17-007-44), dionica Topčić pojje - Lašva, km 7+416 – Izmjene i dopune	Projektovanje	26.000	-			-	Nije planirano Okončano u 2017.
			Revizija	4.000	-			-	
4.	M-16.2	Glavni projekt sanacije tunela Jasen (T16.2-003-22) u naselju Ustirama, dionica Prozor - Jablanica 1, km 17+686 – Izmjene i dopune	Projektovanje	27.000	26.500	IGH d.o.o. Mostar, 01-02.2-7023/17. 02.08.2017.	39.780 (preneseno 26.442)	26.442	Okončano
			Revizija	4.000	4.000	Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-9293/17. 18.10.2017.	3.999	3.999	
			<b>Ukupno</b>	31.000	30.500				
5.	M-17	Glavni projekat rekonstrukcije tunela Karaula, G. Goliješnica, Tupanovac (T17-006-42), dionica Ozimica - Topčić polje, km 2+699	Projektovanje	100.000	59.300	Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-10677/17, 29.11.2017.	98.184 (preneseno 60.239)	39.457	U toku
			Revizija	9.000	4.500	IG d.o.o. Banja luka, 01-02.1-3083/18. 13.04.2018.	4.551	-	
			<b>Ukupno</b>	109.000	63.800				
6.	M-16.4	Glavni projekt sanacije/ rekonstrukcije mosta preko rijeke Vrbas (M-16.4-001-249) u Bugojnu, dionica Nević Polje – Bugojno, km 35+180 – Izmjene i dopune	Projektovanje	1.000	-			-	Nije planirano Okončano u 2017.
			Revizija	3.000	-			-	
7.	M-15	Glavni projekat rekonstrukcije mosta preko potoka Krbava, dionica Kamičak - Ključ, km 9+622	Projektovanje	16.000	15.800	Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo, 01-2.1.7349/17. 14.08.2017.	15.795	15.795	Okončano
			Revizija	800	1.000	Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-9802/17, 03.11.2017.	936	936	
			<b>Ukupno</b>		16.800				
8.	M-17	Glavni projekat zaštite temelja mosta preko duboke uvale, Gradište kod Crnaje (M-17-012-303), dionica Konjic- Jablanica 1, km 14+661	Projektovanje	8.200	8.200	GP:IPSA Institut d.o.o. Sarajevo INK Constructor d.o.o. Banja luka, 01-02.1-7349/17. 14.08.2017.	8.190	8.190	Okončano

## JP CESTE FEDERACIJE BIH

			Revizija	700	900	Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-9802/17, 06.11.2017.	819	819	
			<b>Ukupno</b>		<b>9.100</b>			<b>9.009</b>	
9.	M-17	Sanacija mosta preko rijeke Save u Bosanskom Šamcu (M-17-001-574), dionica, km 0+000	Projektovanje	22.000	-				Okončano u 2017.
			Revizija	1.500	1.800	Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-9802/17, 06.11.2017.	1.755	-	
10.	M-18.1	Rušenje postojećeg i izgradnja novog mosta preko Crne rijeke u Bašcima (M-18.1-001-446), dionica Ustikolina – Grebak – Delijaš - Trnovo, km 42+720	Izvođenje	607.000	603.000	Konzorcij: MGBH d.o.o. Sarajevo i Euroasfalt d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7257/18, 23.08.2018.	603.259	116.176	U toku
			Nadzor	8.500	8.500	Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7241/18, 23.08.2018.	8.483	2.340	
			<b>Ukupno</b>		<b>611.500</b>			<b>118.516</b>	
11.	M-18	Zamijena dilatacione naprave mosta preko rijeke Drinjače u Kladnju (M-18-008-68), dionica Vitalj – Olovo, km 1+186	Izvođenje	35.000	38.000	Sikra d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-7876/18, 13.09.2018.	37.762	35.915	Radovi okončani
			Nadzor	3.000	3.000	Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-7532/18, 04.09.2018.	2.867	1.626	
			<b>Ukupno</b>		<b>41.000</b>			<b>37.541</b>	
12.	M-17	Zamijena dilatacione naprave mosta preko bujičastog potoka lokacija Bagrem (M-17-012-305), dionica Konjic-- Jablanica 1, km 16+311	Izvođenje	66.000	71.000	Sikra d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-7876/18, 13.09.2018.	70.700	25.598	U toku
			Nadzor	3.000	3.000	Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-7532/18, 04.09.2018.	2.866	1.626	
			<b>Ukupno</b>		<b>74.000</b>			<b>27.224</b>	
13.	Usluge prevođenja i usklađivanja sa Smjericama:		Konsultantske usluge						
	M-5	Sanacija mosta preko Sandžačke rijeke (M-5-009_218), dionica Jajce Jug - Donji Vakuf 1, km 26+245		1.300	1.300	INK Konstruktor d.o.o. Banja luka, 01-02.1-11097/17, 13.12.2017.	1.300	1.300	
	M-5	Sanacija mosta preko potoka Mrižnica, (M-5_001_8) lokacija Kamenica, dionica Granica RH (Izačić)-Bihać 4, km 7+765		1.700	1.800	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-2.1-10748/17, 04.12.2017,	1.755	1.755	
	M-4	Sanacija mosta preko potoka Rađušica (M-4_008_200) dionica Teslić (Barići) - Karuše, km 13+917		1.300	1.300	INK Konstruktor d.o.o. Banja luka, 01-02.1-11097/17, 13.12.2017.	1.300	1.300	
	M-18	Sanacija mosta preko rijeke Drinjače Kladnju (M18-008-69) dionica: Vitalj-Olovo, km 2+107;		-	1.000	Desing&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-9643/17, 31.10.2017.	936	936	
	M-6.1	Sanacija mosta preko potoka Korana, (M6.1_002_462) lokacija Bakića vrela, dionica Resanovci Bos. Grahovo 1, km 12+921		-	1.000		936	936	
			<b>Ukupno</b>		<b>6.400</b>			<b>6.227</b>	
14.	M-18	Glavni projekat sanacije mosta preko rijeka Bioštica u Olovu (M-18-009-187), dionica Olovo – Semizovac, km 0-404	Projektovanje	20.000	21.800	IG d.o.o.Banja luka, 01-02.1-6979/18, 14.08.2018.	21.762	-	U toku
			Revizija	3.000	3.000	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-8139/18, 24.09.2018.	3.100	-	
			<b>Ukupno</b>		<b>24.800</b>			<b>-</b>	
15.	M-15	Glavni projekat sanacije mosta preko rijeke Sane, Krkojevačko polje, Čapije (M-15-003-42), dionica Sanski Most 1 - Kamičak, km 4+283	Projektovanje	35.000	22.500	IG d.o.o.Banja luka, 01-02.1-6979/18, 14.08.2018.	22.523	-	U toku
			Revizija	3.500	3.500	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-8139/18, 24.09.2018.	3.101	-	
			<b>Ukupno</b>		<b>26.000</b>			<b>-</b>	
16.	M-18	Rekonstrukcija mosta preko rijeke Ljubine u Semizovcu (M-	Projektovanje	-	12.500	Divel d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-8248/16,	23.751 (preneseno 12.470)	11.949	Projektovanje i revizija okončano

## JP CESTE FEDERACIJE BIH

		18-010-398), dionica Semizovac-Sarajevo - Malta, km 0+048				14.09.2016.				Radovi tenderisani, zbog prekoračenja procj. vrijednosti poništeni
			Revizija	-	3.000	INK Constructor d.o.o. Banja Luka, 01-02.1-11318/16, 20.12.2016.	2.925	2.925		
			Izvođenje	350.000	350.000				-	
			Nadzor	10.000	10.000				-	
			<b>Ukupno</b>	<b>360.000</b>	<b>375.500</b>				<b>14.874</b>	
17.	M-1.8	Rekonstrukcija tunela Drenik (T1.8-004-48) l=80m, dionica Srebrenik - Šiški Brod 3, km 2+655	Projektovanje	25.000	25.000	Divel d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-11849/18. 28.12.2018.	24.570	-	-	Projektovanje u toku
			Revizija	3.000	3.000		-	-	-	
18.	M-18	Glavni projekt rekonstrukcije mosta preko rijeke Stupčanice u Olovskim Lukama (M18-008-165), dionica Vitalj - Olovo, km 20+443	Revizija	-	3.400	INK Constructor d.o.o. Banja Luka, 01-02.1-11318/16, 20.12.2016.	3.393	<b>3.393</b>		Okončano
19.	M-18.1	Glavni projekat rekonstrukcije mosta preko Crne rijeke (M18.1-1-06), lokacija skretanje za Govediće, dionica Ustikolina-Trnovo, km 40+088	Projektovanje	-	1.900	Ipsa institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-7349/17. 14.08.2017.	16.965 (preneseno 1.895)		1.895	Okončano
			Revizija	-	1.400	Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-9802/17. 06.11.2017.	1.404		1.404	
			<b>Ukupno</b>		<b>3.300</b>				<b>3.299</b>	
				<b>1.778.500</b>	<b>1.682.400</b>				<b>672.785</b>	

### 3.1.4.2. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijevanja trupa puta, kosina, usjeka i zasjeka

Red. Br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2018.	Rebalans Plana 2018.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2018.	Napomena
1.	NN	Sanacija slijevanja trupa ceste M14: Bihać - Grmuša (Prnjosor) - Mali Radić, dionica Čavkići - Spašići, od P45 do P50, od km 0+870,74 do km 0+959,51	Projektovanje	19.500	19.500	Konzorcij: Divel d.o.o.Sarajevo, IGH d.o.o.Mostar Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-6987/17. 01.08.2017.	19.422	9.711	U toku
			Revizija	2.000	1.900	Desing&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-11352/17. 21.12.2017.	1.872	-	
			<b>Ukupno</b>		<b>21.400</b>			<b>9.711</b>	
2.	M-16 006	Dionica Crna Rijeka - Jajce, km 6+500 do km 10+600 (više lokacija), sanacija škarpi i nestabilnih kosina	Projektovanje	12.000	23.200	Konzorcij: Divel d.o.o.Sarajevo, IGH d.o.o.Mostar Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-6987/17. 01.08.2017.	23.166	11.583	U toku
			Revizija	2.000	3.300	Desing&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-11352/17. 21.12.2017.	3.276	-	
			<b>Ukupno</b>		<b>26.500</b>			<b>11.583</b>	
3.	M-14	Sanacija škarpi i kosina, dionica Srbljani - Bos.Krupa, na najugroženijim mjestima	Projektovanje	12.500	12.500	Konzorcij: Divel d.o.o.Sarajevo, IGH d.o.o.Mostar Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-6987/17. 01.08.2017.	24.921 (preneseno 12.460)	-	U toku
			Revizija	6.000	1.900	Desing&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-11352/17. 21.12.2017.	1.872	-	
			Izvođenje	525.000	550.300	Kov-Grad d.o.o. Mrazovac Bužim. 01-02.2-3059/18.	550.246	547.639	

## JP CESTE FEDERACIJE BIH

						13.04.2018.			Okončano
			Nadzor	14.000	8.000	IG Banja luka d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-2511/18 27.03.2018. Arting BH d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-8774/18, 10.10.2018.	7.927 2.340	2.340	
			<b>Ukupno</b>		<b>572.700</b>			<b>549.979</b>	
4.	M-16.2	Sanacija slijeganja trupa ceste i potpornog zida ispod nivelete, cesta M-16.2_003, dionica Prozor - Jablanica 1, km 3+850	Projektovanje	20.000	13.500	Desing&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-6993/18, 15.08.2018.	13.455	<b>13.455</b>	Okončano
5.	M-5	Rješavanje odvodnje, cesta M-5_018, Prača - Hrenovica, dionica Podgrab – Sastavci, km 11+800	Projektovanje	15.000	7.000	INK Connstruktor d.o.o. Banja luka, 01-02.2-7162/18, 17.08.2018.	6.903	-	U toku projektovanje
			Revizija	-	2.000			-	
		<b>UKUPNO</b>		<b>628.000</b>	<b>643.100</b>			<b>584.728</b>	

### 3.1.4.3. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2018.	Rebalans Plana 2018.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2018.	Napomena
1.	M-14 002	Sanacija asfaltnog kolovoza M-14_002: Srbljani - Bosanska Krupa sa uređenjem i zaštitom škarpi zasjeka cca = 8,0 km	Projektovanje	12.500	12.500	Konzorcij: Divel d.o.o.Sarajevo,IGH d.o.o.Mostar Trasa d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-6987/17, 01.08.2017.	24.921 (preneseno 12.461)	-	U toku
			Revizija	2.000	2.400	Desing&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-11352/17, 21.12.2017.	2.340	-	
			<b>Ukupno</b>	<b>14.500</b>	<b>14.900</b>			<b>-</b>	
2.	M-5	Sanacija asfaltnog kolovoza M-5, Gromljak - Blažuj, km 3+970 – km 5+166	Projektovanje	10.000	-			-	Nije planirano
3.	M-17	Sanacija asfaltnog kolovoza M-17 dionica: Konjic -Jablanica, dužine cca 3km	Projektovanje	15.000	11.200	Desing&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-9653/18, 02.11.2018.	11.115	<b>11.115</b>	Okončano
		<b>UKUPNO</b>		<b>39.500</b>	<b>26.100</b>			<b>11.115</b>	

## 3.2. Planirani projekti

### 3.2.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2018.	Rebalans Plana 2018.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2018.	Napomena
1.	M-17.3	Izgradnja ceste Neum-Stolac, dionica Bročanac – Cerovica - Drenovac -Izmještanje elektro-energetskih objekata duž trase	Projektovanje	40.000	23.500	Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-6978/18, 14.08.2018.	23.283	23.283	Okončano
			Revizija	-	2.000			-	Uključeno u projektovanje*
		-izrada elaborata o izvršenim preventivnim arheološkim istraživanjima Bročanac-Cerovica	Konsult.usl.	-	4.000	Ecoplan d.o.o.Mostar, 01-02.1-1865/18, 28.02.2018.	4.095	4.095	Okončano
		-izrada elaborata o izvršenim preventivnim arheološkim istraživanjima Cerovica -Drenovac	Konsult.usl.	-	5.300	Ecoplan d.o.o.Mostar, 01-02.1-1864/18.	5.265	5.265	Okončano

## JP CESTE FEDERACIJE BIH

						28.02.2018.			
		-izrada idejnog projekta raskrsnice Babin-Do dionica: Kiševo-Bročanac,	Projektovanje	-	6.500			-	Oduhalo se od novog rješenja
		Izrada glavnog projekta ukrštanja lokalne ceste i M17.3 u mjestu Oskrušnica, dionica Kiševo-Bročanac	Projektovanje	-	7.000	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-8138/18, 24.09.2018.	6.903	6.903	Okončano
		Vanjska kontrola ugrađenih materijala i izvedenih radova na LOT-u 2	Konsult.usl.	-	6.500			-	Ne treba
		Glavni projekat ukrštanja lokalne ceste i ceste M17.3, u mjestu Oštrovac, dionica Kiševo-Bročanac	Projektovanje	-	6.900			-	Okončano (*isti projekat)
		Izrada elaborata za vodnu saglasnost dionica: Bročanac-Cerovica-Drenovac	Konsult.usl.	-	-	Encos d.o.o.Sarajevo, 01-01.1-5651/18. 16.07.2018.	6.962	6.962	Okončano
		<b>Ukupno</b>			<b>61.700</b>			<b>46.508</b>	
2.	M-17	Izrada idejnog rješenja obilaznice Konjica	Konsult.usl.	15.000	-			-	Nije planirano
3.	M-4	Izrada elaboata zaštite od buke na M-4, dionica: Šiški brod- Tuzla	Konsult.usl.	-	3.000			-	Nabavka u toku (Ugovoreno u 2019.)
4.	M-14	Izgradnja obilaznice Bihaća, dionica Jablanska ulica-čvor Mali Lug-veza na M14 - Idejni projekat osiguranja pružnog prelaza	Projektovanje	-	6.900	Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo, 01-02.1-5979/18. 26.07.2018.	6.962	6.962	Okončano
5.	M-6.1	Obilaznica Mostara, Glavni projekti objekata-mostova na dionici Miljkovići-Rodoč-veza na M-17 (vijadukt Rodoč L=2x168m, podvožnjak Bulevar L=107m, podvožnjak Aluminij L=2x16,2m, Avijatičarski 2-zovi L=133m, Avijatičarski -rekonstrukcija L=133m, nadvožnjak M17 L=122m, nadvožnjak iznad željezničke pruge L=2x30,32m)	Projektiranje	-	500.000			-	Priprema projektnih zadataka u toku (nabavka u 2019. U toku)
			Revizija	-	35.000				
6.	M-6.1	Obilaznica Mostara Glavni projekat trase na dionici Miljkovići-Rodoč-veza na M17 - Prilagodavanje projektnog rješenja faznoj gradnji na potezu ulaz u tunel Privorac do čvora Rodoč u dužini L=cca 1,5km,	Projektiranje	-	40.000			-	Priprema projektnog zadataka u toku (nabavka u 2019. U toku)
			Revizija	-	2.000				
7.	M-5	Rekonstrukcija ceste Jajce-Donji Vakuf Glavni projekat tunela („Cvirkovac“ - L=cca 300m, „Vrbas“ - L=cca 212m i „Torlakovac“ - L=cca 163m)	Projektiranje	-	100.000			-	Priprema projektnih zadataka u toku
			Revizija	-	7.000				
8.	M-5	Obilaznica Kisejaka Glavni projekat trase (II faza), tunela (L=cca390m) i mosta preko ceste R443 (L=cca 75m) Ukupna dužina dionice L=cca 1.100m	Projektiranje	-	120.000			-	Čeka završetak usluga iz tačke 8. Tabela 3.1.1.
			Revizija	-	10.000				
9.	M-18.1	Rekonstrukcija dijelova ceste M18.1 Ustikolina-Garež,	Izvođenje	-	250.000			-	Sporazum s' Općinom Trnovo
			Nadzor	-	7.000				
10.	M-6	Izgradnja sjeverne obilaznice Gruda -izmještanje elektro-energetskih objekata duž trase	Projektiranje	-	6.000			-	
			Revizija	-	1.000				
<b>UKUPNO</b>					<b>55.000</b>	<b>1.149.600</b>		<b>53.470</b>	

R.br.9 – Na osnovu Sporazuma o zajedničkom finansiranju projekta, broj:01-02.1-11253/18. potpisanog 13.12.2018. JP Ceste F BiH su iznos od 256.500 KM, doznacile Općini Trnovo za navedeni projekat. Općina Trnovo će po okončanju radova, dostaviti kompletnu dokumentaciju JP Ceste F BiH, zbog uknjižbe ukupne vrijednosti izvedenih radova.

**3.2.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica i tunela**

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2018.	Rebalans Plana 2018.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2018.	Napomena
1.	M-4.2	Rasvjeta raskrsnice cesta M-4.2 i M-14 u Srbljanima	Izvođenje	-	70.000			-	Tender za izvođenje u toku
			Nadzor	-	2.000				
2.	M-17	Rasvjeta mosta Begića i Begovićna na M-17	Projektovanje	-	4.000			-	Tender za projektovanje u toku
			Izvođenje	-	40.000				
			Nadzor	-	1.000				
3.	M-17	Rasvjeta raskrsnice u Žitomislčićima na M-17	Projektovanje	-	4.000			-	Tender za projektovanje u toku
			Izvođenje	-	40.000				
			Nadzor	-	1.000				
<b>UKUPNO</b>				-	<b>162.000</b>			-	

**3.2.3. Poboljšanje sigurnosti prometa na magistralnim cestama izgradnjom traka za lijeva skretanja, pješačkih staza sa odvodnjom kišne kanalizacije, odmorišta i sanacija crnih tačaka**

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2018.	Rebalans Plana 2018.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2018.	Napomena
1.	M-4.2	Izgradnja pješačke staze na dionici Barake - Mala Kladuša - Marjanovac	Izvođenje	200.000	290.000	Kov-Grad d.o.o.Bužim, 01-02.2-8203/18, 26.09.2018.	287.820	-	U toku
			Nadzor	7.000	7.000	DTQ d.o.o. Sarajevo, 01-01.1-9535/18, 01.11.2018.	6.669	-	
			<b>Ukupno</b>	<b>207.000</b>	<b>297.000</b>			-	
2.	M-4.2	Rekonstrukcija raskrsnice Todorovo, općina Cazin	Izvođenje	500.000	500.000			-	Eksproprijacija u toku
			Nadzor	15.000	15.000				
3.	M-14.1	Rekonstrukcija raskrsnica na M-14.1 i M-19 na clazu u Gradačac	Projektovanje	7.000	7.000	Trasa d.o.o. Sarajevo, 01-01.1-5977/18, 26.07.2018	7.014	7.014	Projektovanje u toku
			Revizija	3.000	3.000			-	
			Izvođenje	240.000	400.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000			-	
<b>Ukupno</b>					<b>417.000</b>			<b>7.014</b>	
4.	M-5	Rekonstrukcija raskrsnice M-5 i ulice Hanjovska u Ključu, km 18+600	Projektovanje	6.000	-	Geofeld d.o.o.Bihać, 01-02.2-11771/18, 27.12.2018.	4.000	-	U toku
			Revizija	1.000	-			-	
5.	M-5	Rekonstrukcija raskrsnice M-5 i ulice Kulina bana u Ključu, km 19+600	Projektovanje	6.000	-			-	Nije planirano
			Revizija	1.000	-			-	
6.	M-5	Izgradnja pješačke staze (Rakovica) sa sanacijom kolovoza i rješavanjem odvodnje	Projektovanje	-	7.000			-	Projektovanje u toku
			Izvođenje	200.000	400.000				

## JP CESTE FEDERACIJE BIH

		(1 faza)	Nadzor	7.000	7.000				
7.	M-6	Izgradnja pješačke staze u naselju Ružići, općina Grude, L = 1,0 km	Izvođenje	200.000	275.000	Putovi d.o.o. Grude, 01-02.2-8182/18, 25.09.2018.	272.477	170.541	U toku
			Nadzor	7.000	7.000	Integra d.o.o. Mostar, 01-02.4-6985/18, 15.08.2018.	6.903	4.321	
			<b>Ukupno</b>	<b>207.000</b>	<b>282.000</b>			<b>174.861</b>	
8.	M-6.1	Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-6.1 sa lokalnom cestom za Blagaj, općina Mostar	Izvođenje	300.000	300.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000				
9.	M-6.1	Rekonstrukcija raskrsnice na M-6.1 i R-420 u naseljenom mjestu Vinjani, općina Posušju	Revizija	2.000	2.000			-	
			Izvođenje	241.000	350.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000				
10.	M-14	Rekonstrukcija raskrsnice M-14 i lokalne ceste (Prvomajska ulica) u Bosanskoj Krupi	Izvođenje	173.000	173.000			-	Tender u toku
			Nadzor	7.000	5.500				
11.	M-14	Izgradnja pješačkih staza uz M-14_001: Bihać - Srbijani u naselju Kostela	Izvođenje	200.000	200.000	Behić Sanny Boy d.o.o. Bihać, 01-02.2-11292/18, 14.12.2018.	198.990	-	Ugovor potpisan krajem godine
			Nadzor	7.000	7.000	DTQ d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-11830/18.28.12.2018	6.845	-	
			<b>Ukupno</b>		<b>207.000</b>			<b>-</b>	
12.	M-14.2	Izgradnja pješačke staze u Orašju, L = 1,0 km	Izvođenje	250.000	305.000	Galax-Niskogradnja d.d. Brčko, 01-02.2-8193/18, 26.09.2018.	304.083	-	Zastoj zbog polaganja gradskog vodovoda
			Nadzor	7.000	7.000	AIK-Inžinjering d.o.o. Banovići, 01-02.2-8257/18, 27.09.2018.	6.845	-	
			<b>Ukupno</b>		<b>312.000</b>			<b>-</b>	
13.	M-15	Rekonstrukcija raskrsnice u Sanskom mostu na M-15	Projektovanje	15.000	-			-	
			Revizija	2.000	-			-	
			Izvođenje	-	350.000			-	
			Nadzor	-	7.000			-	
14.	M-16.2	Izgradnja podhodnika kod skretanja za naselje Podgrađe, općina Prozor	Revizija	-	1.800	Desing&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-1553/18. 26.02.2018.	1.755	1.755	Eksproprij. u toku
			Izvođenje	200.000	280.000	Hering d.d. Široki brijeg, 01-02.2-11493/18. 20.12.2018.	279.089	-	
			Nadzor	10.000	6.000			-	
			<b>Ukupno</b>	<b>210.000</b>	<b>287.800</b>			<b>1.755</b>	
15.	M-17	Izgradnja isključne trake za lijevo skretanje za naselje Trzanj, općina Hadžići	Izvođenje	180.000	300.000			-	Tender u toku
			Nadzor	6.000	18.000				
16.	M-17	Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-17 i R-435a u naseljenom mjestu Potoci, dionica Potoci - Mostar	Izvođenje	250.000	250.000			-	
			Nadzor	7.000	7.000				
17.	M-17.4	Izgradnja pješačke staze u Ljubuškom. L = 0,8 km	Izvođenje	150.000	190.000	Putovi d.o.o. Grude, 01-02.2-8181/18, 25.09.2018.	185.875	36.960	U toku
			Nadzor	7.000	7.000	Interprojekt d.o.o. Mostar, 01-02.4-6984/18, 15.08.2018.	6.921	-	
			<b>Ukupno</b>	<b>157.000</b>	<b>197.000</b>			<b>36.960</b>	
18.	M-18	Rekonstrukcija raskrsnice na M-	Izvođenje	400.000	420.000			-	



## JP CESTE FEDERACIJE BIH

		18_010: Kobilja Glava – Sarajevo - Malta, km 8+340	Nadzor	15.000	10.000				
19.	M-14.2	Izgradnja pješačke staze unaselju Novo Selo, općina Odžak,	Izvođenje	115.000	220.000			-	Tender u toku
			Nadzor	5.000	5.000	NNM Inženjering d.o.o. Tuzla, 01-02.2-8364/18, 02.10.2018.	4.850	-	
			<b>Ukupno</b>	<b>120.000</b>	<b>225.000</b>			<b>-</b>	
20.	M-5	Izgradnja pješačke staze u naselju Brnjaci, općina Kiseljak	Izvođenje	123.000	150.000	Ceste-Company BiH d.o.o. Kiseljak, 02-02.2-8722/18, 10.10.2018.	99.002	99.002	Okončano
			Nadzor	7.000	7.000	Desing&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-10301/18, 21.11.2018.	4.095	4.095	
			<b>Ukupno</b>	<b>130.000</b>	<b>157.000</b>			<b>103.097</b>	
21.	M-20	Izmjene glavnog projekta rekonstrukcije raskrsnice na M-20 u Vitkovićima, općina Goražde, dionica:Ustikolina-Goražde, km 17+800	Projektovanje	-	7.000	Desing&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-7550/18, 05.09.2018.	7.020	<b>7.020</b>	Okončano
22.	M-5	Izrade varijanti idejnog rješenja rekonstrukcije raskrsnice na M-5 u naseiju Kamenica, Grad Bihać,	Konsultantske usluge	-	7.000	Desing&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-6666/18, 10.08.2018.	6.903	<b>6.903</b>	Okončano
23.	M-4	Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-4 sa lokalnom cestom za općinu Usora, sa rekonstrukcijom/ izgradnjom mosta preko rijeke Usore u mjestu Tešanjka, dionica: Teslić (Barići)-Karuše, km7+830	Izvođenje	-	600.000				Sporazum o zajedničkom finansiranju*
			Nadzor	-	40.000				
24.	M-20	Izrada elaborata o inženjersko geološkim i geotehničkim karakteristikama terena za projekat rekonstrukcije raskrsnice u kružni tok , u Goraždu na cesti M-20, dionica Goražde 8-Ustiprača, km 0+550	Konsultantske usluge	-	5.800	Desing&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-6975/18, 14.08.2018.	6.786	<b>6.786</b>	Okončano
25.	M-20	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije raskrsnice u kružni tok . u Goraždu na cesti M-20, dionica Goražde 8-Ustiprača, km 0+550	Projektiranje	-	7.000	Desing&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-8361/18, 01.10.2018.	7.020	7.020	Projektovanje okončano
			Revizija	-	1.000			-	
			<b>Ukupno</b>	<b>-</b>	<b>8.000</b>			<b>7.020</b>	
26.	M-6.1	Rekonstrukcija raskrsnice na obilaznici Livna u kružni tok – križanje M-6.1 i ul. Blajburških žrtava,	Projektiranje	-	25.000			-	
			Revizija	-	2.500				
27.	M-5	Idejni projekat: Rekonstrukcija raskrsnice M-5 i ulice Hanlovska u Ključu,	Projektovanje	-	4.000			-	Tender u toku
28.	M-18.1	Rekonstrukcija magistralne ceste M18.1 Ustikolina – Trnovo,	Projektovanje	-	5.000				
			Izvođenje	-	250.000				
			Nadzor	-	7.000				
29.	M-6	Izrada idejnog rješenja izmještanja magistralne ceste u Gradama, dužine 0,5 km	Projektovanje	-	7.000			-	
30.	M-14	Izgradnja pješačke komunikacije preko magistralne ceste M-17 u općini Jablanica	Projektovanje	-	7.000				Tender za projektovanje u toku
			Izvođenje	-	150.000				
			Nadzor	-	7.000				
31.	M-4	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok. Tešanjka, općina Tešanj	Projektovanje	-	15.000			-	Tender u toku
32.	M-17	Izgradnja pješačke staze u naseiju Šije, općina Doboj - Jug	Projektovanje	-	7.000			-	

## JP CESTE FEDERACIJE BIH

33.	M-4	Rekonstrukcija raskrsnice na ulazu u Jelah, općina Tešanj (Sufinansiranje sa Općinom Tešanj)	Izvođenje	-	350.000				Predat zahtjev za urbanističku saglasnost
			Nadzor	-	10.000				
34.	M-5	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M-14.2 i M-5 u Bosanskom Petrovcu	Izvođenje	-	420.000				-
			Nadzor	-	10.000				
35.	M-18	Rekonstrukcija raskrsnice "Hotel Sunce", općina Vogošća	Izvođenje	-	500.000				Eksproprij. u toku
			Nadzor	-	15.000				
36.	M-18	Izmještanje dijela ulice Alipašina na magistralnoj cesti M-18_010 Semizovac – Sarajevo – Malta, sa izgradnjom kružne raskrsnice na lokalitetu Šip	Izvođenje	-	500.000				-
			Nadzor	-	30.000				
37.	M-18	Izgradnja privremenog kružnog toka, skretanje Energopetrol-industrijska zona, km 4+600, općina Vogošća	Projektovanje	-	7.000				Tender za projektovanje u toku
38.	M-4	Rekonstrukcija raskrsnice M-4 i lokalne ceste u naselju Bjelave, općina Srebrenik	Projektovanje	-	7.000	Pronasa d.o.o. Sarajevo,01-02.2-11773/18, 27.12.2018.	6.952		U toku
39.	M-4	Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Klokotnica – II faza	Izvođenje	-	291.000				Eksproprij. u toku
			Nadzor	-	10.000				
40.	M-16.2	Gornji Vakuf-Bugojno, izgradnja pješačke staze	Projektovanje	-	7.000				-
			Izvođenje	-	200.000				
			Nadzor	-	7.000				
41.	M-17	Izvođenje radova na rekonstrukciji raskrsnice sa pješačkim stazama na M-17 dionica: Jablanica - Mostar, mjesto Vrapčići	Izvođenje	-	300.000				-
			Nadzor	-	7.000				
42.	M-17	Glavni projekat rekonstrukcije raskrsnice sa M-17 i lokalne ceste za naselje Papratnica dionica:M-17_096: Ozimica-Topšić Polje, km 9-180, općina Žepče	Projektovanje	-	20.000				-
43.	M-17	Izgradnja odmorista na dionici: Jablanica-Mostar,	Projektovanje	-	2.000				-
			Izvođenje	-	48.000				
			Nadzor	-	2.000				
				<b>4.100.000</b>	<b>9.414.600</b>				<b>351.416</b>

R.br.23 – Na osnovu Sporazuma o zajedničkom finansiranju projekta broj:01-02.1-11254/18 od 13.12.2018. sa Općinom Usora, JP Ceste F BiH F BiH su uplatile Općini iznos od 612.662 KM za radove i nadzor. Nakon okončanja projekta Općina će vrijednost ulaganja na mostu i raskrsnici uknjižiti na JP Ceste F BiH, a preostali dio na Općinu.

## JP CESTE FEDERACIJE BIH

### 3.2.4. Vanredno održavanje

#### 3.2.4.1. Sanacija i rekonstrukcija cestovnih objekata

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2018.	Rebalans Plana 2018.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 01.01.-31.12.2018.	Napomena
1.	M-18	Sanacija mosta preko rijeka Bioštica u Olovu (M-18-009-187), dionica Olovo - Semizovac, km 0-404	Izvođenje	250.000	250.000			-	Čeka okončanje projektovanja
			Nadzor	7.000	7.000			-	
2.	M-17	Zaštita temelja mosta (M-17-011-342), preko nepoznatog potoka, lokacija Zukića kosa, dionica Tarčin - Konjic, km 13+736	Izvođenje	200.000	188.200	HP Investing d.o.o. Mostar 01-02.1-7251/18, 23.08.2018.	188.121	173.635	Okončano
			Nadzor	5.000	5.800	OGH d.o.o. Mostar, 01-02.1-7217/18, 22.08.2018.	5.800	5.510	
			<b>Ukupno</b>		194.000			<b>179.145</b>	
3.	M-1.8	Sanacija kolovozne ploče mosta preko rijeke Tinje, Orlova klisura (M-1.8-004-113), dionica Srebrenik - Šiški Brod 3, km 9+279	Izvođenje	70.000	70.000			-	Postupak nabavke 2x poništen- I bez ponuda, II-jedna ponuda značajno iznad budžeta
			Nadzor	5.000	5.000	Desing&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.2-8799/18, 11.10.2018.	5.200	-	
			<b>Ukupno</b>		75.000			-	
4.	M-5	Zamjena dilatacionih naprava na mostu Babin zub preko strme padine (M-05.0-5-02), dionica Malta - Vijećnica - Korija	Izvođenje	100.000	100.000			-	Postupak nabavke radova 2x proveden- I puta bez ponuda, II put jedna ponuda Ugovor u pripremi
			Nadzor	4.000	4.000	Structura d.o.o.Sarajevo. 01-02.1-10144/18. 15.11.2018.	3.920	-	
			<b>Ukupno</b>		104.000			-	
5.	M-5	Rekonstrukcija mosta preko Sokolinskog potoka u Torlakovcu (M-5-009-598), dionica Jajce Jug - Donji Vakuf 1, km 18+298	Projektiranje	15.000	15.000	INK Konstruktor d.o.o. Banjaluka, 01-02.1-11576/18. 21.12.2018.	7.956	-	U toku (Revizija ugovorena u 2019.)
			Revizija	2.000	2.000			-	
			<b>Ukupno</b>		17.000			-	
6.	M-4	Sanacija mosta preko rijeke Soline u Tuzli (M-04.0-4-05), dionica Šiški Brod - Kalesija - Gr. ent (Memići), km 9+555	Projektiranje	22.000	22.000	Institut za građevinstvo IG d.o.o. Banja luka, 01-02.1-11575/18. 21.12.2018.	14.976	-	U toku (Revizija ugovorena u 2019.)
			Revizija	3.000	3.000			-	
			<b>Ukupno</b>		25.000			-	
7.	M-6.1	Rekonstrukcija mosta preko nepoznatog potoka (M-6.1-002-518), dionica Resarovci - Bosansko Gracovo 1, km 14+132	Projektiranje	17.000	17.000			-	Nabavka u toku
			Revizija	2.000	2.000			-	
8.	M-17	Ugradnja inklinometara na tunelu Crnaja (T17-012-2), na cesti M17, dionica Konjic-Jablanica, km 15+082	Nadzor	-	5.000	Desing&QC d.o.o.Sarajevo, 01-02.1-5699/18, 17.07.2018.	6.786	6.786	Okončano
9.	M-1.8	Zamjena dilatacije na stubnom mjestu S1- mosta preko rijeke Save u Orašju (M1.8-001-62), na cesti M1.8, dionica RH/BiH (Župarja)-Lončari, km 0+320	Izvođenje	-	80.000	Sikra d.o.o. Sarajevo,01-02.1-11161/18,12.12.2018	105.583	-	U toku
			Nadzor	-	4.000	Trasa d.o.o.Sarajevo, 01.02.1-8970/18, 18.10.2018.	5.265	-	
			<b>Ukupno</b>	-	84.000			-	
10.	M-5	Zamjena dilatacionih naprava na mostu preko rijeke Vrbas u Jajcu (M5-008-268) dionica Rogoljstija Jug, km 27+7.7	Izvođenje	-	120.000			-	Tender u pripremi
			Nadzor	-	5.000			-	
11.	M17	Zamjena dilatacione naprave na obalnom stubu broj 6 na mostu preko strme padine, klizište u Prapraskom (M17-012-306) dionica Konjic- Jablanica 1, km 17+074	Izvođenje	-	50.000			-	Tender u pripremi
			Nadzor	-	2.000			-	



## 3.2.4.2. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2018.	Rebalans Plana 2018.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2018.	Napomena
1.	M-5	Sanacija asfaltnog kolovoza M-5: Gromiljak - Blažuj	Izvođenje	150.000	150.000	Sarajevoputevi d.d. Sarajevo, 01-02.1-7726/18, 11.09.2018.	149.042	149.041	Okončano
			Nadzor	7.000	7.000	Desing&QC d.o.o. Sarajevo, 01-02.2-7230/18, 22.08.2018.	6.786	6.786	
			<b>Ukupno</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>			<b>155.827</b>	
2.	M-14	Sanacija asfaltnog kolovoza M-14_002: Srbljani - Bosanska Krupa sa uređenjem i zaštitom skarpi zasjeka L = 8,0 km	Izvođenje	200.000	200.000			-	Tender u toku
			Nadzor	7.000	7.000				
3.	M-16	Sanacija asfaltnog kolovoza Crma Rijeka - Jajce Jug, L=2,5 km	Izvođenje	200.000	220.000				Tender u toku
			Nadzor	4.000	4.000				
4.	M-5	Sanacija asfaltnog kolovoza Bosanski Petrovac – Ključ, L=3 km	Izvođenje	-	500.000				Tender u toku
			Nadzor	-	10.000				
5.	M-4.2	Sanacija asfaltnog kolovoza Skokovi – Srbljani, sa izgradnjom pješačke staze	Izvođenje	-	600.000				Tender u toku
			Nadzor	-	7.000				
6.	M-17.3	Ema – Mušine sanacija asfaltnog kolovoza L=1.0 km	Izvođenje	-	260.000				Tender u toku
			Nadzor	-	7.000				
7.	M-17	Sanacija asfaltnog kolovoza dionica: Čapljina- Doljani, od GP BiH do GP RH, cca 0,80km	Izvođenje	-	250.000				Tender u toku
			Nadzor	-	3.000				
8.	M-14.2	Sanacija asfaltnog kolovoza dionica: granica entiteta - Domaljevac	Izvođenje	-	200.000				Tender u toku
			Nadzor	-	3.000				
9.	M-17.4	Sanacija asfaltnog kolovoza dionica: Čitluk-Ljubuški	Izvođenje	-	150.000				Tender u toku
			Nadzor	-	2.000				
				<b>568.000</b>	<b>2.580.000</b>			<b>155.827</b>	

## 3.2.4.3. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina, usjeka i zasjeka

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2018.	Rebalans Plana 2018.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2018.	Napomena
1.	M-18	Izrada glavnog projekta sanacije klizišta ispod nivelete i slijeganje trupa ceste dionica: Živinice 1-Vitalj, km 29-350	Projektovanje	-	25.000	Desing&QC d.o.o.Sarajevo 01-02.2-8221/18, 26.09.2018.	19.656	-	Projektovanje u toku
			Revizija	-	5.000				
			Izvođenje	-	350.000				
			Nadzor	-	20.000				
			<b>Ukupno</b>	-	<b>400.000</b>				
2.	M-16 006	Dionica Crma Rijeka – Jajce, km 6-500 do km 10-600 (više lokacija), sanacija skarpi i nestabilne kosina	Izvođenje	-	200.000				Tender u toku
			Nadzor	-	7.000				

## JP CESTE FEDERACIJE BIH

3.	Izrada projektno dokumentacije za novonastale sanacije slijeganja, klizišta i škarpi	Projektovanje	-	50.000			-
	<b>UKUPNO</b>		-	<b>657.000</b>			-

### 4. Eksproprijacija i elaborati eksproprijacije

JP Ceste F BiH su u izvještajnom periodu za elaborate o eksproprijaciji i aktivnosti vezane za eksproprijaciju realizovale iznos od 0,46 mil.KM od planiranih 0,49 mil.KM, dok je u eksproprijaciju uloženo 2,14 mil.KM, od planiranih 2,40 mil.KM. Za izgradnju ceste Neum-Stolac je izuzeto zemljišta najviše vrijednosti, gdje je i dalje u toku proces eksproprijacije. Navedeni projekat je dio Programa "Modernizacija cesta u FBiH", gdje se radovi finansiraju iz sredstava kredita međunarodnih finansijskih institucija (EIB+WB). Također, eksproprijacija je rađena i na drugim projektima vezanim za spomenuti Program, kao i za projekte finansirane iz vlastitih sredstava JP Ceste F BiH.

Red. br.	Naziv	Plan 2018.	Rebalans Plana 2018.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2018.	Napomena
1.	Elaborati eksproprijacije	235.900	195.000	GP: Sarajinžinjeri d.o.o. Sarajevo, Zedis d.o.o. Zenica, GeoFeld d.o.o. Bihać i AMG d.o.o. Visoko, 01-02.2-7162/17, 07.08.2017. Anex broj: 01- 02.2-6333/18, 02.08.2018. (kojim se uvjeti i način plaćanja iz ugovora mijenjaju)			
	Izgradnje trake za spora vozila na dionici: - Ripač – Dubovsko				21.180 preneseno 16.944	10.590	U toku
	- Čevljanovići-Nišići				17.213	17.213	Okončano
	- Bosanaski Petrovac -Ključ				19.714 preneseno 15.771	15.771	Okončano
	- M-6.1 Tomislav grad-Široki brijeg				23.661	4.732	
	- M-14.2 Bos.Petrovac-Pasjak				24.286	17.000	
	- M-14.2 Pasjak-Resanovci				17.018	11.913	
	- M-16 Kupres-Šujica-Trivunove krivine				25.302	-	
	- Dionica Priboj 2-Simin Han 1, Podionica Barj Brdo - Simin Ha				14.341	-	U toku
	- Donji Vakuf 1 – Turbe, prevoj Koinar				16.334	-	
Obilaznica Cazina Glavni projekat objekata (mostovi 2) Misija G21 Ažuriranje –Izrijetla glavnog projekta trase Studija uticaja na okoliš	24.912	17.438					
	<b>Ukupno</b>		<b>94.657</b>				
2.	Pripremne faze za eksproprijaciju (vještačenja, pretvorbe zemljišta, i sl.)	-	300.000	Vještačenja, pretvorbe zemljišta,			
	Tasovčići - Čapljina, rekonstrukcija crne tačke raskrsnica M 6 i M 17, km 0+009					6.465	
	Neum-Stolac				283.721	283.721	
	Rekonstrukcija raskrsnice Gorica u Livnu u kružni tok				356	356	
	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok Odžak				712	712	
	Rekonstrukcija raskrsnice Maše Lisa				1.773	1.773	
	Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-4.2 i R-400 na M-2, dionice Skokovi – Srbijani (Todorovo)				2.449	2.449	
	Rekonstrukcija raskrsnice Vukovići u kružni tok				1.442	1.442	
	Obilaznica Mostara				4.447	4.447	
	Izgradnja ceste –prevoj Karaula				3.975	3.975	
	Bosanaski Petrovac -Ključ				62.234 1.162	63.396	
	Bihać: Devijacija poruč Robotar				652	652	
					<b>Ukupno</b>		<b>369.388</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>235.900</b>	<b>495.000</b>		<b>464.045</b>		

## JP CESTE FEDERACIJE BIH

U slijedećoj tabeli navedeni su projekti gdje je potrebno uraditi eksproprijaciju:

Red. br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Plan 2018.	Rebalans Plana 2018.	Realizovano 01.01.-31.12.2018.
1.	M-17.3	Novi – Stolac, dionica: Broćanac - Drenovac			1.782.062
2.	M-6.1	Južna Obilaznica Mostara, servisna saobraćajnica na dionici Medine - Miljkovići i dionici Miljkovići – Rodoč - veza na M-17			11.123
3.	M-1.4	Obilaznica Binača, dionica Izačić - Kamenica, cca 3 km			
4.	M-16.4	Obilaznica Bugojna			
5.	M-4.2	Obilaznica Cazina			
6.	M-6	Veza obilaznica Gruda (I faza)			
7.	M-14.1	Izgradnja magistralne ceste Bihać - Bosanska Krupa, Srbijansko – Grmuški plato, L= 25 km			116.128
8.	M-5	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M-5 i R-403 u Kamenici			
9.	M-5	Bihać: Devijacija pored Robota i Doma zdravlja Bihać			
10.	M-1.8	Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-1.8 u Špionici dionica (003), km 21-200			
11.	M-18	Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-18 "Husino" dionica (006), km 2+500			
12.	M-4	Rekonstr. raskrsnice ceste M-4 i lokane ceste za Bistarac, dionica (010): Donja Orahovica-Šićki Brod, km 23+500			
13.	M-6.1	Rekonstrukcija ceste M-6.1, dionica (010), km 9+000 do 10+000 Dobrič			
14.	M-5	Rekonstrukcija raskrsnice M-5 i lokalne ceste Dolac na Lašvi, dionica (011), km 10+200-9+950			
16.	M-5	Izgradnja pješačke staze u neslju Izačić, M5_001, km 2+450 – km 3+000			
17.	M-4.2	Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-4.2 i R-400 na M-4.2, dionice Skokovi – Srbijani (Todorovo)			
18.	M-18	Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-18 "Olovske Luke" dionica (008), km 20-600			
19.	M-1.8	Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Čehaje			
20.	M-20	Rekonstrukcija raskrsnice Vitkovići u kružni tok			
21.	M-17	Tepečić Poje – Lašva 0, km 1+600 i km 3+880	2.400.000	2.400.000	
22.	M-18	Priboj 2 – Simin Han 0, km 9+100 – km 9+200			
23.	M-18	Priboj 2 – Simin Han 1, km 11+050 do km 21+300			
24.	M-5	Rekonstrukcija ceste dionica: Kaonik - Gromljak, potez „Delfine krivine“			
25.	M-15	Kamičak – Kijuč, km 17+000			
26.	M-4	Magistralna cesta Doboj - Tuzla, dionica Drežnik (bolnica „Kreka“) - podjaja Šićki Brod			109.908
27.	M-6	Rekonstrukcija raskrsnice za Kravice, dionica: 002; km 12+400			
28.	M-6.1	Izgradnja pješačke staze na dionici: Mostar - Široki brijeg, kroz naseljeno mjesto Medine			
29.	M-4.2	Rekonst. rask. ceste M4.2, Ul. Žrtava domov. rata i 25. novembra u Cazinu (002), km 11+230 (Mala Lisa)			21.080
30.	M-15	Rekonstrukcija raskrsnice Gorica u Livnu u kružni tok			32.200
31.	M-6	Kršenje odvodnje magistralne ceste na ulazu u Stolac, II faza			
32.	M-4.2	Sanačnja klizišta, cesta M-4.2_002, dionica 002: Skokovi - Srbijani, km 13-350			
33.	M-18	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na Šipu, općina Centar, Sarajevo			
34.	M-14	Izgradnja kružnog toka u Bosanskoj Krupi (kolodvor) dionica 002			
35.	M-15	Izgradnja kružnog toka u Sanskom Mostu na spoju ceste M-15 i R-405 dionice 003			
36.	M-5	Rekonstr. raskrsn. ceste M-5 i M-16.4 u kružni tok, M-5, (012), km 0+000 (Tepečić Poje)			
37.	M-18	Rekonstr. raskrsn. ceste M-17 i ulice Safeta Zajke u kružni tok, M-17, (008), km 7-350			
38.	M-5	Rekonstrukcija raskrsnica na obilaznici Viteza			
39.	M-18	Rekonst. ceste i pločastog propusta preko Crne rijeke, u Delijašu, dion. Kiselina – Trnovo, km 37+257			

## JP CESTE FEDERACIJE BIH

40.	M-18	rekonstrukcija raskrsnica na cesti M-18 u kružne tokove (prolaz kroz Vogošća)			
41.	M-17	izgradnja potpunjaka za naselje Nemila, M-17			
42.	M-17	rekonstrukcija crne tačke M-6 i M-17 Tasovčići - Čapljina, km 0 + 000			4.210
43.	M-17	rekonstrukcija crne tačke Bulajića krivina na M-17 013, km 35+80 do 36+800			
44.	M-6	rekonstrukcija raskrsnice cesta M-6 i R-425 u naselju Trebižat (spoj na dionica 002 Vitina-Tasovčići km 20+400			7.020
45.	M-5	izgradnja trake za spora vozila, dionica: Bos. Petrovac - Ključ, prevoj Banište			
46.	M-5	izgradnja traka za spora vozila, Binač - Bos.Petrovac, dionica: Ripač - Tasovčići			
47.	M-6	izgradnja trake za spora vozila, Posušje – Široki brijeg,			
48.	M-14	rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok Odžak			42.200
49.	M-13	izgradnja ceste Potpaklenik - Kladanj, Karaula			11.472
50.		ostali projekti za koje neophodna eksproprijacija, a nisu obuhvaćeni u ovom planu			
		<b>UKUPNO</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.137.403</b>

### 5. Projekti iz Budžeta Federacije BiH i GSM licence

- Projekti finansirani iz sredstava Budžeta F BiH

Odlukom o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije BiH za 2017. godinu, V broj:1043/17.godinu, Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija odobrena su sredstva za eksproprijaciju projekta „Izgradnja ceste Neum – Stolac“ u iznosu od 0,70 mil.KM. Na osnovu „Ugovora o prijenosu sredstava kapitalnog transfera“ između Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i JP Ceste F BiH, namjenska sredstva su doznačena i realizovana.

Odlukom o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Grant Fedaralnoj Direkciji cesta za kapitalne investicije“ utvrđenih Budžetom F BiH za 2007. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija V broj:1528/15 od 12. novembra 2015. i V broj:1738/2015 od 16.12.2015. godine („Službene novine F BiH“, br. 97/15.) odobrena su sredstva za projekt „Rekonstrukcija ceste R 419 Posušje - Jablanica u iznosu od 1,85 mil.KM. Sredstva u iznosu od 1,72 mil.KM implementirana su tokom proteklog perioda, a preostala neutrošena sredstva (131.993KM) su na osnovu Sporazuma broj:01-02.1-10910/18. od 06.12.2018. doznačena Ministarstvu prometa i veza HNK/Ž - Upravi za ceste za finansiranje radova na spomenutom projektu.

Vlada F BiH je Odlukom o usvajanju Programa utroška dijela sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima - transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta, utvrđenih Budžetom F BiH za 2018 godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, V broj: 966/18 utvrdila projekte, među kojima je i projekt „Izgradnja južne obilaznice Mostara“. Za projekt je namijenjeno 7,00 mil.KM, od čega za eksproprijaciju 2,00 mil.KM, a za građevinske radove 5,00 mil.KM. Izmjenom spomenute Odluke V broj:1525/18. Za radove je obezbjeđeno 5,5 mil.KM, a za eksproprijaciju 1,50mil.KM. U izvještajnom periodu nije bilo realizacije sredstava.

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2018.	Rebalans Plana 2018.	Izvođač/ Konsultant - ugovor	Ugovoreno	Realizovano 01.01.- 31.12.2018.
1.	M-17.3	Izgradnja ceste Neum - Stolac	Eksproprijacija	700.000	648.000			647.851
2.	R-419	rekonstrukcija ceste R 419 Posušje – Jablanica	Izvođenje	-	132.000			-



## JP CESTE FEDERACIJE BIH

3.	M-6.1	Izgradnja južne obilaznice Mostar	Eksproprijacija	-	-		
			Izvođenje	-		JV Putovi d.o.o.Grude i HP Investing d.o.o. Mostar, 01-02.3-11218/18, 13.12.2018.	5.336.935
			Nadzor	-		GP:IGH d.o.o. Mostar i Institut IGH d.d. Zagreb 01-02.1-11217/18, 13.12.2018.	144.612
<b>UKUPNO</b>				<b>700.000</b>	<b>780.000</b>		<b>647.851</b>


### - Projekti finansirani iz GSM licence

Vlada F BiH je usvojila „Odluku o usvajanju programa investiranja kapitalnog transfera JP Ceste F BiH iz sredstava podračun-sredstava od GSM licence utvrđenog izmjenom i dopunom Budžeta F BiH za 2017. godinu za Federalno ministarstvo prometa i komunikacija“ V broj 1665/2017. Spomenutom Odlukom, obuhvaćen je projekat, „Izgradnja i rekonstrukcija kružnog toka na Šipu u Sarajevu“ za čiju implementaciju je bilo zaduženo JP Ceste F BiH. Međutim, Odlukom V broj: 1512/18. Vlada F BiH je odobrena sredstva preuzmjerila na druge projekte i odredila druge implementatore.

Red br.	Mag. Cesta	Naziv i opis projekta	Aktivnosti na projektu	Plan 2018.	Rebalans Plana 2018.	Realizovano 01.01.-31.12.2018.
1.	M-18	Izgradnja kružnog toka na Šipu u Sarajevu	Izvođenje	-	500.000	-
<b>UKUPNO</b>				-	<b>500.000</b>	-

## 6. Donacije

OPIS	Vrijednost projekta
Na osnovu Odluke Općine Jajce, Komisijski je predana na upravljanje JP Ceste F BiH semafora oprema na raskrsnici Pijavice u Jajcu	11.200
<b>UKUPNO-</b>	<b>11.200</b>

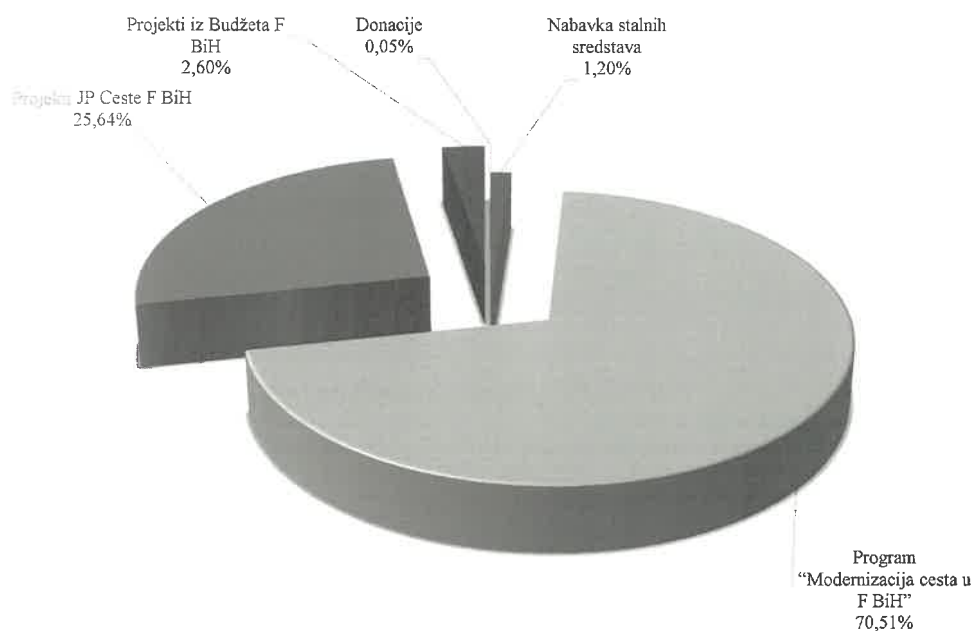

Grafički prikaz strukture investicija

#### D. ODJEL ZA JAVNE NABAVKE

Izveštaj o radu je urađen na bazi raspoloživih podataka i obuhvata :

Pregled provedenih postupaka javnih nabavki JP Ceste F BiH u promatranom periodu.

Plan nabavki je usvojen i objavljen 8.6.2018.godine.

Za navedeni period na osnovu provedenih postupaka nabavki ugovorena su 195 ugovora u iznosu od 19.640.853 KM. U izvještaj su uključeni i :

-ugovori za postupke nabavke koji su pokrenuti po Planu nabavki iz 2017 godine, a potpisani u 2018.godini,

-kao i ugovori koji su potpisani u 2017.godini, ali nisu bili dostavljeni u 2017.godini, pa nisu bili uključeni u predhodne izvještaje.

##### - Ugovorene nabavke po vrstama postupaka uključujući vrijednosti

Vrsta postupka nabavke	Iznosi u KM (sa PDV-om)	Broj ugovora
<b>Ukupno</b>	<b>19.640.853</b>	<b>195</b>
Otvoreni	15.368.364	43
Konkurentski	276.952	27
Pregovarački	3.457.302	11
Direktni sporazumi	509.793	112
Neprioritetne usluge	28.442	2

## **JP CESTE FEDERACIJE BIH**

Za dva (2) postupaka nabavki procjena ponuda je u toku.

Za devet (9) postupaka nabavki, donesene odluke o dodjeli ugovora i čeka se ugovaranje.

Osam (8) postupaka nabavki je pokrenuto i čekaju se ponude.

- Žalbe

U toku 2018.godine podneseno je 28 žalbi, od kojih je 27 žalbi riješeno i postupci nastavljani/ponovljeni. Jedna žalba je na rješavanju u Uredu za žalbe.

### **E. PRAVNI I KADROVSKI POSLOVI**

Aktivnosti pravnog sektora u periodu 01.01.- 31.12.2018. godina mogu se podijeliti na sljedeće oblasti:

- pravne, normativni i
- kadrovske poslove

#### **Pravni i normativno-pravni poslovi**

Sektor pravnih, kadrovskih i opštih poslova JP Cesta F BiH sve svoje poslove i aktivnosti bazira na primjeni svih pozitivnih zakonskih propisa koji su doneseni i važe u Federaciji BiH, odnosno u državi BiH kao i svih izmjena i dopuna koje se donesu u planiranoj godini.

Obavljali su se stručni i administrativni poslovi vezani za rad i funkcionisanje organa JP Ceste F BiH i to: Uprave, Odbora za reviziju, Nadzornog odbora i Skupštine društva.

U periodu 01.01.-31.12.2018.godina obavljane su aktivnosti koje se odnose na sve stručne i administrativne poslove vezane za rad i funkcionisanje organa JP Ceste F BiH i to: Uprave, Odbora za reviziju, Nadzornog odbora i Skupštine društva.

Vršene su pripreme sjednica organa JP Ceste F BiH, pripremanje i distribucija materijala za iste kao i aktivnosti vezane za realizaciju odluka i zaključaka sa sjednica Skupštine JP Ceste F BiH, Nadzornog odbora i Uprave ovog preduzeća.

U izvještajnom periodu održane su 4 sjednice Skupštine, 6 sjednica Nadzornog odbora (5 redovnih i 1 vanredna), 12 sjednica Odbora za reviziju i 23 sjednice Uprave JP Ceste F BiH.

Svi pravni poslovi se dijele na sve oblasti prava i to prvenstveno na oblast privrednog prava, gdje se reguliše rad privrednih društava, javnih preduzeća itd., kao i oblast parničnih, vanparničnih, prekršajnih, izvršnih i upravnih postupaka, a dijelom i imovinsko-pravnih poslova.

Najveća aktivnost ovog pravnog Sektora usmjerena je na organizaciju i zastupanje JP Ceste F BiH pred nadležnim sudovima u F BiH, u BiH i u pojedinim predmetima i u regionu.

Vođene su aktivnosti na pokretanju tužbi, gdje se kao tužilac pojavljuje JP Ceste F BiH, kao i pokretanje izvršnih prijedloga na temelju pravosnažnih i izvršnih presuda protiv korisnika koji redovno ne plaćaju svoje obaveze, te pokretanje tužbi za naknadu štete na cestovnoj opremi i sl.

Izdvajamo također i aktivnosti na regresnim tužbama gdje za to postoje zakonski uslovi.

U sudskim postupcima gdje se JP Ceste F BiH pojavljuje u ulozi tužitelja, broj aktivnih tužbi JP Ceste F BiH protiv trećih lica na dan 31.12.2018.god. iznosi 25 predmeta (naplata za cestovno zemljište,

## JP CESTE FEDERACIJE BIH

regresne tužbe i oštećenje cestovne opreme).

U izvještajnom periodu podnesena je jedna nova tužba gdje se kao tužitelj pojavljuje JP Ceste F BiH a završen je jedan predmet.

U predmetima gdje je JP Ceste F BiH tužena strana stanje aktivnih predmeta na dan 31.12.2018.god. iznosi 249 predmet, uzimajući u obzir da je u izvještajnom periodu podneseno 64 novih tužbi.

U izvještajnom periodu su obavljane aktivnosti na usklađivanju akata JP Ceste F BiH sa izmjenama i dopunama pozitivnih propisa, kao i aktivnosti na izradi nacrtu i prijedloga opštih akata preduzeća za usvajanje od strane nadležnih organa JP Ceste F BiH.

Takođe, u izvještajnom periodu su se obavljali poslovi iz oblasti radnih odnosa i kadrovski poslovi u skladu sa zakonom i opštım aktima.

### Kadrovski poslovi

Na dan 31.12.2018.god. obrazovna struktura radnika JP Ceste F BiH je slijedeća:

Red.br.	Vrsta školske spreme	Stanje 31.12.2018.
1.	Magistri nauka (građ. saob. ecc, komunikologije.)	4
2.	Magistri struke (saob. građ.ecc. arh; geografije)	12
3.	VSS građevinske struke	24
4.	VSS saobraćajne struke	3
5.	VSS ekonomske struke	7
6.	VSS pravne struke	11
7.	VSS geodetske struke	1
8.	VSS infor.struke	2
9.	VSS društ.smjera	1
10.	VS (ing.građ.)	5
11.	VS (becheler ecc.)	4
12.	SSS građevinski tehničari	4
13.	SSS mašinske struke	1
14.	SSS saobraćajne struke	3
15.	SSS ekonomske struke	3
16.	SSS ostale struke (druš. i prir.)	3
<b>U K U P N O</b>		<b>88</b>

 Direktor  
  
Ljubo Pravdić, dipl.ing.građ.
