

I N F O R M A C I J A

**O IMPLEMENTACIJI PROJEKATA U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
U 2013. GODINI**

Sarajevo, juni 2014. godine

SADRŽAJ

I UVOD	2
II PLAN I REALIZACIJA PROJEKATA U FEDERACIJI BIH U 2013. GODINI	3
a. Realizacija projekata po izvorima i načinu finansiranja	4
b. Realizacija projekata po DAC sektorima	5
c. Realizacija projekata po lokacijama	6
III UPOREDNI PRIKAZ PLANA I REALIZACIJE SREDSTAVA PO GODINAMA	7
IV TROŠKOVI IMPLEMENTACIJE PROJEKATA	8
ZAKLJUČAK	10
PRILOZI	11

I. UVOD

U cilju upravljanja i koordinacije razvojnim sredstvima u Federaciji BiH, a u skladu sa Uredbom o uspostavi koordinacionog mehanizma za upravljanje sredstava za razvoj u Federaciji BiH («Službene novine Federacije BiH»: br: 48/03 i 68/05) Federalno ministarstvo finansija-financija ima obavezu Vladu Federacije BiH izvještavati o implementaciji programa i projekata uključenih u Program javnih investicija Federacije BiH.

Navedenom uredbom propisana je obaveza da se projekti od značaja za Federaciju implementiraju u okviru resornog federalnog ministarstva koje upravlja domaćim i stranim sredstvima namjenjenim za implementaciju tih projekata. Uloga i odgovornost ministarstva je, između ostalog, koordinacija u identifikaciji i utvrđivanju prioriternih programa i projekata u okviru resora, dostavljanje prioriternih projekata Federalnom ministarstvu finansija u cilju izrade trogodišnjeg programa javnih investicija, te izvještavanje o implementaciji projekata iz njihove nadležnosti.

Nakon što je Vlada Federacije BiH zadužila federalna ministarstva i implementirajuće agencije/institucije da dostavljaju ažurirane podatke o projektima, Federalno ministarstvo finansija/financija redovno dobija finansijske podatke o realizaciji projekata. S ciljem informisanja o učincima i dostignutim ciljevima projekata sva federalna ministarstva, jedinice za implementaciju projekata i druge implementirajuće agencije/institucije imaju obavezu i da Vladi Federacije BiH dostavljaju izvještaj o realizaciji svih projekata iz svoje nadležnosti.

Informacija o implementaciji projekata u Federaciji BiH u 2013. godini izrađena je na osnovu podataka koje su, u skladu sa članom 12. Uredbe, do 31.03.2014. godine Federalnom ministarstvu finansija – financija dostavila nadležna resorna ministarstva, agencije ili javna preduzeća koji implementiraju projekat i upravljaju sredstvima namjenjenim za realizaciju projekta i programa iz Programa javnih investicija FBiH. Svi podaci su sadržani u bazi podataka Federalnog ministarstva finansija-financija.

Informacija sadrži finansijske pokazatelje koji se odnose na projekte finansirane domaćim i stranim sredstvima. Kako bi Vlada Federacije BiH bila upoznata i sa tokom realizacije projekta, ostvarivaju ciljeva projekta, poteškoćama sa kojima se implementatori suočavaju i slično, u prilogu su izvještaji nadležnih ministarstava-implementacionih jedinica o svakom projektu posebno. Navedeni izvještaji su grupisani po sektorima i dati u Prilogu 5.

Informacija sadrži pregled ulaganja u projekte po lokacijama i DAC sektorima, i to:

- ukupnu vrijednost projekata koji su implementirani tokom 2013. godine,
- plan za 2013. godinu i utrošak sredstava u 2013. godini.
- vrijednost sredstava utrošenih na realizaciju projekata do 31.decembra 2013. godine,
- vrijednost projekata završenih u 2013. godini.

Projekti u implementaciji obuhvataju kako projekte čija je realizacija u toku, tako i projekte u pripremi i odobrene projekte, odnosno projekte za koje postoji važeća i zvanična odluka nadležnog tijela o osiguranju sredstava za implementaciju ili je izvjesno njihovo finansiranje.

Projekat koji se finansira iz više izvora tretira se kao projekat u implementaciji ukoliko su efektivna sredstva iz bilo kog od izvora, bez obzira da li je npr. zaključen kreditni sporazum sa ino partnerom.

Podaci o utrošenim sredstvima odnose se na stvarno utrošena sredstva za realizaciju konkretnih projekata što stvara privid manje angažovanih sredstava po ino kreditima. Iznos neutrošenih sredstava na realizaciju projekata, veći je od iznosa neangažovanih sredstava po kreditima, iz razloga što dug nastaje povlačenjem sredstava sa kreditnih računa bez obzira da li su utrošena u realizaciji projekata.



II. PLAN I REALIZACIJA PROJEKATA U FEDERACIJI BIH U 2013. GODINI

Ukupna vrijednost projekata u Federaciji BiH koji su implementirani u toku 2013. godine iznosi 3.614,47 mil. KM, od čega se na projekte, čija implementacija se nastavlja i u narednom periodu odnosi 3.544,99 mil. KM ili 98,08 % vrijednosti svih projekata.

Plan i realizacija projekata po statusu, (u KM)

Status projekta	Vrijednost projekata	Utrošeno u prethodnim godinama	Ukupno utrošeno do 31. 12. 2013	2013		
				Plan	Realizacija	% realizacije
U implementaciji	3.544.993.365	1.274.400.655	1.930.048.200	959.198.972	655.639.792	68,35%
Završeni	69.477.882	50.493.997	67.559.722	18.983.885	17.065.725	89,90%
Ukupno	3.614.471.247	1.324.894.652	1.997.607.922	978.339.323	672.713.270	68,76%

Do 31. decembra 2013. godine. godine na implementaciju projekata je utrošeno 1.997,61 mil. KM, odnosno 55,27% vrijednosti projekata. Na projekte u implementaciji je utrošeno 1.930,05 mil. KM ili 54,44% sredstava. Od 69,48 mil. KM, koliko je bila ukupna planirana vrijednost projekata završenih u 2013. godini, na njihovu implementaciju utrošeno je 67,56 mil. KM.

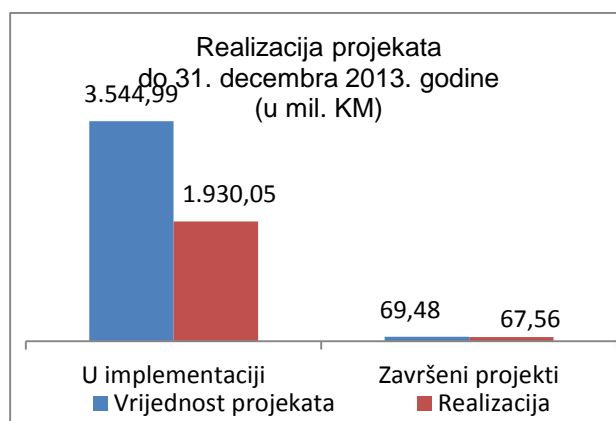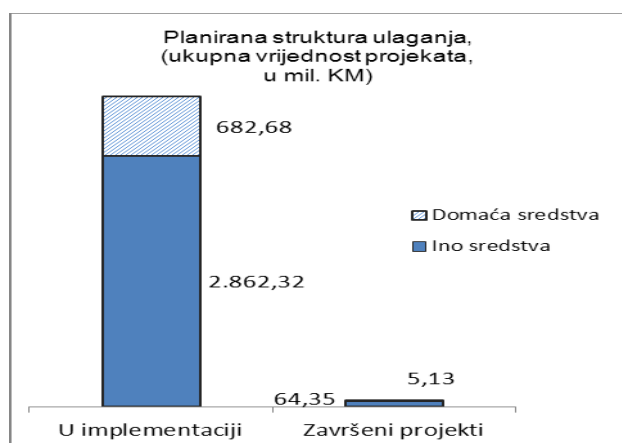

Status	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Ukupno utrošeno do 31 12 2013	% utrošenih sredstava
U IMPLEMENTACIJI	Ino	Kredit	2.682.196.297	957.242.119	1.543.571.134	57,55%
		Grant	180.121.295	50.215.020	65.427.263	36,32%
	Domaći	Budžeti	378.905.399	197.507.782	218.203.160	57,59%
		Kredit	12.401.257	5.326.704	5.394.163	43,50%
		Vlastita sredstva	272.524.914	62.227.605	94.603.941	34,71%
		Grant	18.844.203	1.881.425	2.848.539	15,12%
Ukupno projekti u implemetaciji			3.544.993.365	1.274.400.655	1.930.048.200	54,44%
ZAVRŠENI	Ino	Kredit	64.346.807	49.493.685	62.521.647	97,16%
		Budžeti	44.346	44.346	44.346	100,00%
	Domaći	Grant	29.978	29.978	29.978	100,00%
		Vlastita sredstva	5.056.751	925.988	4.963.751	98,16%
Ukupno završeni projekti			69.477.882	50.493.997	67.559.722	97,24%
UKUPNO	Ino	Kredit	2.746.543.104	1.006.735.804	1.606.092.781	58,48%
		Grant	180.121.295	50.215.020	65.427.263	36,32%
	Domaći	Budžeti	378.949.745	197.552.128	218.247.506	57,59%
		Kredit	12.401.257	5.326.704	5.394.163	43,50%
		Vlastita sredstva	277.581.665	63.153.593	99.567.692	35,87%
		Grant	18.874.181	1.911.403	2.848.517	15,25%
UKUPNO			3.614.471.247	1.324.894.652	1.997.607.922	55,27%

Za finansiranje projekata planirano je 2.746,54 mil. KM kreditnih sredstava, od čega je do kraja 2013. godine utrošeno 1.606,09 mil. KM (58,48%). Ino donacije kao izvor finansiranja planirane su u vrijednosti od 180,12 mil. KM od čega je do kraja izvještajnog perioda utrošeno 65,43 mil. KM odnosno 36,32%. Iz budžeta su finansirani projekti u vrijednosti od 218,25 mil. KM.

Procenat realizacije projekata u odnosu na planiranu je u toku 2013. godine godine veći nego u prethodnim godinama. Utroškom 672,71 mil. KM plan za 2013. godinu ostvaren je sa 68,76%.

a. Realizacija projekata po izvorima i načinu finansiranja

Ulaganja u projekte po izvorima finansiranja, u KM

Vrsta finansiranja	Vrijednost projekata	Utrošeno u prethodnim godinama	Ukupno utrošeno do 31 12 2013	2013		
				Plan	Realizacija	% realizacije
Ino izvor, od čega na projekte:	2.926.664.399	1.056.950.824	1.671.520.044	837.101.525	614.569.220	73,42%
U implementaciji	2.862.317.592	1.007.457.139	1.608.998.397	822.248.403	601.541.258	73,16%
Završene u 2013	64.346.807	49.493.685	62.521.647	14.853.122	13.027.962	87,71%
Domaći izvor, od čega na:	687.806.848	267.943.828	326.087.878	141.237.798	58.144.050	41,17%
U implementaciji	682.675.773	266.943.516	321.049.803	137.107.035	54.106.287	39,46%
Završene u 2013	5.131.075	1.000.312	5.038.075	4.130.763	4.037.763	97,75%
Ukupno	3.614.471.247	1.324.894.652	1.997.607.922	978.339.323	672.713.270	68,76%

Ulaganja u projekte po načinu finansiranja, u KM

	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Ukupno utrošeno do 31 12 2013	Plan za 2013.	Realizacija plana za 2013.	% realizacije
Ino finansiranje	Kredit, od čega na projekte:	2.746.543.104	1.006.735.804	1.606.092.781	789.777.007	599.356.977	75,89%
	U implemetaciji	2.682.196.297	957.242.119	1.543.571.134	774.923.885	586.329.015	75,66%
	Završene	64.346.807	49.493.685	62.521.647	14.853.122	13.027.962	87,71%
	Grant, od čega na projekte:	180.121.295	50.215.020	65.427.263	47.324.518	15.212.243	32,14%
	U implemetaciji	180.121.295	50.215.020	65.427.263	47.324.518	15.212.243	32,14%
	Završene	0	0	0	0	0	
Domaće finansiranje	Budžeti, od čega na projekte:	378.949.745	197.552.128	218.247.506	67.964.096	20.695.378	30,45%
	U implemetaciji	378.905.399	197.507.782	218.203.160	67.964.096	20.695.378	30,45%
	Završene	44.346	44.346	44.346	0	0	-
	Kredit, od čega na projekte:	12.401.257	5.326.704	5.394.163	5.884.432	67.459	1,15%
	U implemetaciji	12.401.257	5.326.704	5.394.163	5.884.432	67.459	1,15%
	Završene	0	0	0	0	0	
	Vlastita sredstva, od čega na projekte:	277.581.665	63.153.593	99.567.692	55.483.270	36.414.099	65,63%
	U implemetaciji	272.524.914	62.227.605	94.603.941	51.352.507	32.376.336	63,05%
	Završene	5.056.751	925.988	4.963.751	4.130.763	4.037.763	97,75%
	Grant, od čega na projekte:	18.874.181	1.911.403	2.878.517	11.906.000	967.114	8,12%
U implemetaciji	18.844.203	1.881.425	2.848.539	11.906.000	967.114	8,12%	
Završene	29.978	29.978	29.978	0	0	-	

Za finansiranje projekata u 2013. godini iz domaćih izvora najviše sredstava utrošeno iz vlastitih sredstava 36,41 mil. KM, čime je plan ispunjen sa 65,63%, dok je plan finansiranja budžetskim sredstvima ostvaren u procentu od 30,45%.

Iz ino kredita je u 2013. godini utrošeno 599,36 mil. KM, a iz donacija 15,21 mil. KM. Time je plan finansiranja projekata u 2013. godini iz kredita realizovan sa 75,89%, a iz donacija sa 32,14%.

b. Realizacija projekata po DAC sektorima

Plan ulaganja u 2013. godini najrealnije je postavljen za projekte iz sektora „Transport i skladištenje” u kome je, ulaganjem 565,06 mil KM plan ispunjen sa 97,73%.

Ulaganja u projekte u implementaciji i projekte završene u 2013. godini po DAC sektorima, u KM

DAC sektor	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Ukupno utrošeno do 31.12.2013	2013		% realizacije plana
				Plan	Utrošeno	
210 Transport i skladištenje, od čega na:	1.823.636.694	900.395.146	1.465.455.847	578.177.824	565.060.701	97,73%
Projekte u implementaciji	1.823.636.694	900.395.146	1.465.455.847	578.177.824	565.060.701	97,73%
230 Proizvodnja i snabdijevanje energijom, od čega na:	804.147.838	154.165.544	211.215.468	229.875.985	57.049.924	24,82%
Projekte u implementaciji	734.744.280	103.745.871	143.730.070	210.892.100	39.984.199	18,96%
Završene projekte	69.403.558	50.419.673	67.485.398	18.983.885	17.065.725	
140 Vodopsnabdijevanje i sanitacija, od čega na:	377.835.690	29.270.471	44.163.372	51.949.442	14.892.901	28,67%
Projekte u implementaciji	377.805.712	29.240.493	44.133.394	51.949.442	14.892.901	28,67%
Završene projekte	29.978	29.978	29.978	0	0	
321 Industrija, od čega na:	161.780.504	55.361.421	55.559.751	29.742.603	198.330	0,67%
Projekte u implementaciji	161.780.504	55.361.421	55.559.751	29.742.603	198.330	0,67%
400 Višesektorske / uzajamno povezane aktivnosti, od čega na:	117.966.927	35.774.269	38.028.425	18.146.206	2.254.156	12,42%
Projekte u implementaciji	117.966.927	35.774.269	38.028.425	18.146.206	2.254.156	12,42%
160 Ostale usluge i socijalna infrastruktura, od čega na:	28.387.462	10.132.670	18.295.497	8.905.540	8.162.827	91,66%
Projekte u implementaciji	28.387.462	10.132.670	18.295.497	8.905.540	8.162.827	91,66%
311 Poljoprivreda, od čega na:	93.558.948	36.266.497	44.015.483	21.422.986	7.748.986	36,17%
Projekte u implementaciji	93.558.948	36.266.497	44.015.483	21.422.986	7.748.986	36,17%
120 Zdravstvo, od čega na:	89.989.477	37.413.571	49.058.545	27.701.846	11.644.974	42,04%
Projekte u implementaciji	89.989.477	37.413.571	49.058.545	27.701.846	11.644.974	42,04%
323 Građevinarstvo, od čega na:	57.900.065	45.361.885	45.661.885	780.000	300.000	38,46%
Projekte u implementaciji	57.900.065	45.361.885	45.661.885	780.000	300.000	38,46%
150 Vladin sektor i civilno društvo, od čega na:	41.118.742	14.126.897	15.901.603	4.454.372	1.774.706	39,84%
Projekte u implementaciji	41.074.396	14.082.551	15.857.257	4.454.372	1.774.706	39,84%
Završene projekte	44.346	44.346	44.346	0	0	
322 Rudni resursi i rudarstvo, od čega na:	13.000.000	2.800.000	5.300.000	5.500.000	2.500.000	45,45%
Projekte u implementaciji	13.000.000	2.800.000	5.300.000	5.500.000	2.500.000	45,45%
312 Šumarstvo, od čega na:	2.461.600	2.366.281	3.309.746	1.025.219	943.465	92,03%
Projekte u implementaciji	2.461.600	2.366.281	3.309.746	1.025.219	943.465	92,03%
250 Poslovne i druge usluge, od čega na:	1.160.000	990.000	990.000	170.000	0	0,00%
Projekte u implementaciji	1.160.000	990.000	990.000	170.000	0	0,00%
332 Turizam, od čega na:	950.000	100.000	100.000	280.000	0	0,00%
Projekte u implementaciji	950.000	100.000	100.000	280.000	0	0,00%
110 Obrazovanje, od čega na:	577.300	370.000	552.300	207.300	182.300	87,94%
Projekte u implementaciji	577.300	370.000	552.300	207.300	182.300	87,94%
UKUPNO, od čega na:	3.614.471.247	1.324.894.652	1.997.607.922	978.339.323	672.713.270	68,76%
Projekte u implementaciji	3.544.993.365	1.274.400.655	1.930.048.200	959.355.438	655.647.545	68,34%
Završene projekte	69.477.882	50.493.997	67.559.722	18.983.885	17.065.725	


c. Realizacija projekata po lokacijama

Izuzmu li se tzv. federalni projekti na čiju se implementaciju u 2013. godini (591,52 mil KM) odnosi 87,62% ukupne realizacije, najviše sredstava je utrošeno na projekte implementirane u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (28,52 mil KM) što je 4,35% od ukupnih ulaganja u 2013. godini.


Ulaganja u 2013. godini u projekte u implementaciji i završene projekte po lokacijama, u KM

Lokacija	Vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Ukupno utrošeno do 31.12.2013	2013		% realizacije plana
				Plan	Utrošeno	
Federacija BiH, od čega	2.467.389.162	957.966.325	1.549.488.314	624.614.452	591.521.989	94,70%
U implementaciji	2.397.985.604	907.546.652	1.482.002.916	605.630.567	574.456.264	94,85%
Završeni	69.403.558	50.419.673	67.485.398	18.983.885	17.065.725	
Hercegovačko-neretvanski kanton, od čega	374.874.802	30.510.827	59.032.274	173.952.021	28.521.447	16,40%
U implementaciji	374.874.802	30.510.827	59.032.274	173.952.021	28.521.447	16,40%
Kanton Sarajevo, od čega	366.626.737	257.354.528	276.049.983	90.383.601	18.695.455	20,68%
U implementaciji	366.626.737	257.354.528	276.049.983	90.383.601	18.695.455	20,68%
Zeničko-dobojski kanton, od čega	184.099.000	11.739.000	19.091.000	26.612.000	7.352.000	27,63%
U implementaciji	184.099.000	11.739.000	19.091.000	26.612.000	7.352.000	27,63%
Tuzlanski kanton, od čega	89.321.441	30.323.096	40.836.687	25.974.300	10.513.591	40,48%
U implementaciji	89.321.441	30.323.096	40.836.687	25.974.300	10.513.591	40,48%
Unsko-sanski kanton, od čega	72.545.790	7.180.000	8.091.000	17.600.000	911.000	5,18%
U implementaciji	72.545.790	7.180.000	8.091.000	17.600.000	911.000	5,18%
Srednjobosanski kanton, od čega	43.021.499	24.638.049	39.692.798	16.521.700	15.054.749	91,12%
U implementaciji	42.947.175	24.563.725	39.618.474	16.521.700	15.054.749	91,12%
Završeni	74.324	74.324	74.324	0	0	
Kanton 10, od čega	9.165.176	4.414.667	4.477.706	1.864.509	63.039	3,38%
U implementaciji	9.165.176	4.414.667	4.477.706	1.864.509	63.039	3,38%
Zapadnohercegovački kanton, od čega	3.715.640	0	0	586.740	0	0,00%
U implementaciji	3.715.640	0	0	586.740	0	0,00%
Posavski kanton, od čega	3.712.000	768.160	848.160	230.000	80.000	34,78%
U implementaciji	3.712.000	768.160	848.160	230.000	80.000	34,78%
Ukupno, od čega	3.614.471.247	1.324.894.652	1.997.607.922	978.339.323	672.713.270	68,76%
U implementaciji	3.544.993.365	1.274.400.655	1.930.048.200	959.355.438	655.647.545	68,34%
Završeni	69.477.882	50.493.997	67.559.722	18.983.885	17.065.725	

Ulaganja u projekte u implementaciji po lokacijama, u KM

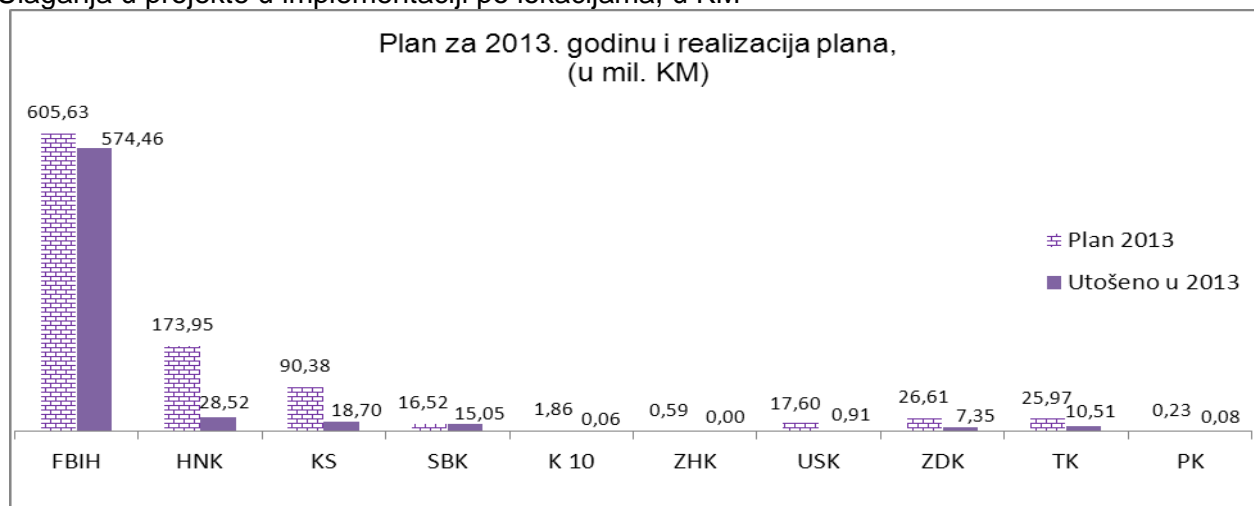

III. UPOREDNI PRIKAZ PLANA I REALIZACIJE SREDSTAVA PO GODINAMA

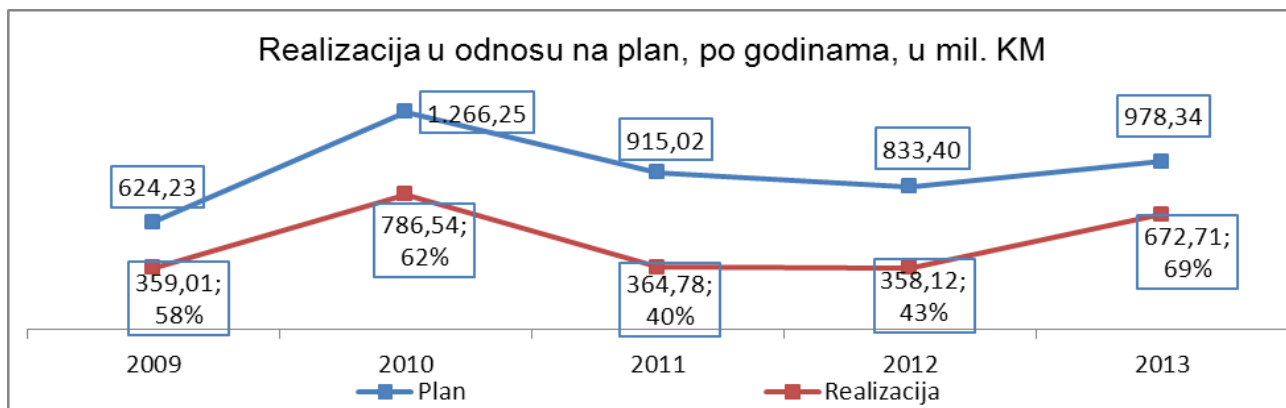

U odnosu na plan od 978,33 mil. KM, u toku 2013. godine realizirano je 68,76% ili 672,70 mil. KM, što je znatno više od ispunjenja plana za 2012. godinu (42,97%), čemu je, u velikoj mjeri doprinijelo realnije planiranje tzv. „federalnih projekata“

Plan i realizacija u periodu od 2011. do 2013. godine, po lokacijama, u mil. KM

Lokacija	Plan			Realizacija			Procenat realizacije plana			Odstupanje od plana		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011
1	2	3	4	5	6	7	8 (5:2)	9(6:3)	10 (7:4)	11(5-2)	12(6-3)	13(7-4)
Federacija BiH	624,61	440,24	588,83	591,52	252	273,84	94,70%	57,24%	46,51%	-33,09	-188,24	-314,99
Kanton 10	1,86	3,08	12,98	0,063	1,32	2,5	3,39%	42,86%	19,26%	-1,797	-1,76	-10,48
Kanton Sarajevo	90,38	191,66	136,53	18,7	25,6	25,51	20,69%	13,36%	18,68%	-71,68	-166,06	-111,02
Hercegovačko-neretvanski	173,95	68,24	64,24	28,52	18	29,87	16,40%	26,38%	46,50%	-145,43	-50,24	-34,37
Tuzlanski	25,98	39,8	36,07	10,51	25,25	18,27	40,45%	63,44%	50,65%	-15,47	-14,55	-17,8
Zeničko-dobojski	26,61	38,79	28,51	7,35	13,92	7,09	27,62%	35,89%	24,87%	-19,26	-24,87	-21,42
Srednjobosanski	16,52	26,84	10,58	15,05	18,6	3,19	91,10%	69,30%	30,15%	-1,47	-8,24	-7,39
Unsko-sanski	17,60	22,34	17,51	0,91	2,29	4,05	5,17%	10,25%	23,13%	-16,69	-20,05	-13,46
Bosansko-podrinjski	0,00	1,19	0,2	0	0,42	0	0,00%	35,29%	0,00%	0	-0,77	0
Zapadnohercegovački	0,59	0,5	5,83	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	-0,59	-0,5	-5,83
Posavski	0,23	0,72	13,74	0,08	0,72	0,46	34,78%	100,00%	3,35%	-0,15	0	-13,28
UKUPNO	978,33	833,4	915,02	672,71	358,12	364,78	68,76%	42,97%	39,87%	-475,28	-475,28	-550,24

Tokom 2013. godine počela je implementacija sljedećih projekata koji su u Programu javnih investicija 2013-2015. godina imali status kandidovanog projekta:

Projekat	Ukupna vrijednost projekta	Osigurani izvori finansiranja	Utrošeno u 2013. godini
IPA 2011 - OTPAD	563.000	Budžet FBiH	0
	9.200.000	Evropska Komisija- grant	0
	5.630.000	Svjetska banka - kredit	0
IPA-2010 Izgradnja reciklažnog postrojenja u Mostaru	4.580.000	Evropska Komisija- IPA	4.000.000
Izgradnja zgrade za općinske organe uprave Srebrenik	4.500.000	Saudijski fond - kredit	300.000

Pokazatelji o stepenu realizacije projekata ukazuju na:

- Neravnomjerno ostvarenje planiranih ulaganja po sektorima,
- Preambiciozni i nerealni planovi realizacije projekata usprkos pozitivnom trendu
 - Realno planiranje utroška sredstava samo za projekte koji se realiziraju kao zajednički projekti na teritoriji Federacije BiH (94,70%) i u Srednjobosanskom kantonu (91,12%),
 - Na svim ostalim lokacijama značajno je odstupanje u realizaciji planiranih ulaganja u odnosu na plan: od izuzetno slabe realizacije u Kantonu 10 (3,38%) i Unsko-sanskom kantonu (5,18%), do 40,48% u Tuzlanskom kantonu.
- Slabu stopu povlačenja planiranih budžetskih i grant sredstava;
- Efikasnije korištenje planiranih vlastitih (65,63%) i ino kreditnih sredstava (75,89%), u odnosu na grant (32,14%) i budžetska sredstva (30,45%);
- Realnije planiranje finansiranja projekata sredstavima iz ino izvora (ispunjenje plana sa 73,42%), nego iz domaćih izvora (realizirano 41,17% plana);
- Institucije i dalje nemaju adekvatne planove za implementaciju projekta u pogledu dinamike, organizacije i njihovog finansiranja;
- Projekti nemaju zaokruženu finansijsku konstrukciju što prouzrokuje kašnjenje u njihovoj realizaciji;
- Potrebu većeg stepena pripremljenosti projekta za koji se traži novo finansiranje.

Također, u toku implementacije projekata uočena je nedovoljna podrška vlasti, kako lokalne tako i viših razina. Nepravovremeno provođenje svih upravnih i drugih postupaka i radnji koje je potrebno poduzeti za izdavanje akata neophodnih za realizaciju projekta, veoma često dovodi do zastoja u implementaciji.

Prijedlog za prevazilaženje ove situacije je formiranje radnih tijela po sektorima, kojima će primarni zadatak biti monitoring projekata, a čime bi se osigurala kvalitetnija podrška političkih struktura, kao i bolja posvećenost implementatora provedbi projekata. U ta radna tijela pored prestavnika Ureda Premijera Federacije BiH, Federalnog ministarstva finansija, federalnog resornog ministarstva, mogli bi biti uključeni i prestavnici nadležnih odbora Parlamenta Federacije BiH.

IV TROŠKOVI IMPLEMENTACIJE PROJEKATA

U cilju praćenja troškova implementacije projekata Federalno ministarstvo finansija evidentira podatke o realizaciji projekata koji se sufinansiraju iz Budžeta Federacije BiH po komponentama i vrstama troškova, uz odvojene podatke o plaćanju iz kredita, iz Budžeta Federacije ili drugih izvora, kako bi se moglo odrediti u pogledu visine i opravdanosti određenih troškova (Prilog 4.). U 2013. godini operativni troškovi odnosno troškovi implementacije projekata iznosili su 2,93 mil. KM, od čega je najviše iz ino-kredita (1,55 mil. KM) i budžeta Federacije (0,75 mil. KM).

Troškovi obračunati na nepovučena sredstva već odobrenih kredita su redovni troškovi koji spadaju u standardne uslove poslovanja pojedinih kreditora, definisani su kreditnim ugovorom i nisu dodatni, odnosno zatezni troškovi, i plaćaju se do kraja perioda implementacije kredita. Ukupno plaćeni troškovi na nepovučena sredstva do 31.12.2013. godine su iznosili 19,71 mil. KM¹. Troškovi na nepovučena sredstva nastali u periodu od 01.01. do 31.12.2013. godine iznose 1,99 mil. KM i u ukupnom iznosu predstavljaju obavezu krajnjih korisnika,² tako da nema direktnog opterećenja Budžeta Federacije BiH po ovim troškovima.

¹ Ukupno plaćeni troškovi za projekte koji su i u 2013. godini imali trošak po ovom osnovu iznosi 16,23 mil. KM

² Obaveza po kreditu EBRD 38716-Koridor Vc supsidijarno je prenesena na JP Autoceste FBiH

Troškove na nepovučena sredstva obračunavaju kreditori: EBRD, Svjetska banka, Vlada Španije, UniCredit bank Austria, KfW Njemačka i Raiffeisen Zentralbank i obračunavaju se po stopi³ od 0,05% do 0,50 % na iznos nepovučenih a odobrenih sredstava. Visina obračunatih troška zavisi od visine ugovorenih sredstava, datuma efektivnosti sredstava, a u najvećoj mjeri od dinamike implementacije projekata. Oni su, razumljivo, najveći u periodu koji slijedi nakon efektivnosti kredita, odnosno na početku implementacije projekta, kada povlačenje sredstava sa kreditnog računa nije ni počelo ili je povučen mali dio. Neopravdano povećanje ovih troškova nastaje u slučaju poremećaja u planiranoj dinamici implementacije projekta.

Troškovi na nepovučena kreditna sredstva, po projektima, u KM

Krajnji korisnik	Kreditor	Projekat	Planirani period implementacije projekta	Ugovoreni iznos kredita	Iznos kredita povučen do 31.12.2013	Ukupno plaćeni troškovi i do 31.12.2013	Troškovi plaćeni u 2013. godini
JP Autoceste FBiH	EBRD	Koridor Vc	25.02.2009-31.12.2014.	352.049.400	261.606.630	7.862.065	835.775
JP Željeznice FBiH	EBRD	Željeznice II	09.06.2006-30.06.2012.	82.144.860	56.006.244	2.500.859	149.732
JP Ceste FBiH	EBRD	Razvoj puteva	03.12.2007-31.12.2011.	75.479.587	75.479.587	2.052.263	6.822
Direkcija cesta FBiH	EBRD	Rehabilitacija puteva	31.12.2011.	88.012.350	85.587.653	1.536.601	62.312
EP HZHB Mostar	KfW	Vjetroelektrane Mesihovina		138.863.930	0	1.250.740	347.160
BH Gas d.o.o	EBRD	Gasifikacija centralne Bosne	28.03.2010-07.09.2012.	33.249.110	26.153.981	525.836	71.819
EP HZHB Mostar	KfW	Obnova Hidroelektrane Rama	23.06.2008-31.12.2014.	19.558.300	15.386.019	264.861	16.260
JP Željeznice FBiH	Vlada Španije	TALGO vozovi	17.10.2006-17.10.2013.	132.267.029	131.699.897	221.057	444
EPBiH i EP HZHB	KfW	SCADA/DMS/OMS	19.09.2012-31.12.2014.	15.724.873	0	11.029	39.312
Posavski kanton	UniCredit bank Austria	Opremanje bolnice Orašje	02.07.2012-31.10.2015.	3.872.543	968.136	5.149	4.012
Federacija BiH	OPEC fond	Sarajevska obilaznica	13.04.2010-31.12.2013.	25.542.288	3.230.982	0	445.401
Općina Čelić i Kanton Tuzla	UniCredit bank Austria	Kanalizacioni i vodosistem Općine Čelić	01.03.2012-31.12.2013.	6.086.157	4.180.464	0	16.555
Unsko-sanski kanton	Raiffeisen Zentralbank Austria	Modernizacija Univerziteta u Bijaču	27.11.2013-30.06.2015.	9.779.150	0	0	2.147
EP BiH Sarajevo	EBRD	Struja 3	18.04.2002-31.12.2010.	35.242.588	35.242.588	2.214.673	0
EP BiH Sarajevo	EBRD	Obnova elektrodistribucija		37.067.823	37.067.823	1.164.351	0
Općina Kiseljak	UniCredit bank Austria	Vodosnadbijevanje		9.769.662	9.769.662	17.893	0
Općina Livno	Raiffeisen Zentralbank Austria	Vodosnadbijevanje		6.869.595	6.869.594	14.872	0
Elektroprenos	EBRD	Reorganizacija obnove elektro-energetskog sistema		19.902.853	19.902.853	55.600	0
NOS BiH				1.288.031	1.288.031		0
Kanton Sarajevo	UniCredit bank Austria	Nabavka opreme za dvije bolnice		6.190.135	6.190.135	8.000	0
Kanton Sarajevo	UniCredit bank Austria	Nabavka opreme za JKP Rad Sarajevo		4.273.668	4.273.696	5.632	0
		UKUPNO		1.103.233.931	779.936.807	19.711.481	1.997.751

³ EBRD 0,50%, KfW 0,25%, Raiffeisen Zentralbank 0,32-0,35%, UniCredit bank Austria 0,30-0,35%, Vlada Španije 0,05%

Prilog 1. Pregled projekata u implementaciji, u KM

DAC Sektor	Naziv projekta	Podnositelj	Lokacija	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u Prethodnim godinama	Plan za 2013	Utrošeno u 2013	
110 OBRAZOVANJE	Izgradnja sportske dvorane i tri učionice	Općina Gradačac	TK	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH - javne investicije	350.000	350.000			
						Budžet kantona	25.000		25.000		
						Budžet općine sufinansiranje	25.000		25.000	25.000	
					Vlastita sredstva	Fondovi vlastito ucesce	157.300		157.300	157.300	
						Javno-privatno partnerstvo (JPP)	20.000	20.000			
					Izgradnja sportske dvorane i tri učionice Gradačac Ukupno						
110 OBRAZOVANJE Ukupno							577.300	370.000	207.300	182.300	
120 ZDRAVSTVO	Dovršetak novosagrađenog objekta - Dom zdravlja Tomislavgrad	Općina Tomislavgrad	Kanton 10	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH - javne investicije	145.000	145.000			
						Budžet kantona	272.000	272.000			
						Budžet općine sufinansiranje	147.000	147.000			
					Vlastita sredstva	Grant	Ostala domaća sredstva	1.886.000			
						Javna preduzeća - vlastito učešće	152.000	152.000			
					Ino sredstva	Grant	Hrvatska (HR)	937.000	937.000		
	Dovršetak novosagrađenog objekta - Dom zdravlja Tomislavgrad Ukupno							3.539.000	1.653.000		
	Izgradnja objekta za smještaj KJU "Porodično savjetovalište"	Kantonalno ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice	KS	Domaća sredstva	Budžet	Budžet kantona	2.404.753	132.053	400.000		
							Kredit	Ostala domaća sredstva	300.000		300.000
	Izgradnja objekta za smještaj KJU "Porodično savjetovalište" KS Ukupno							2.704.753	132.053	700.000	
	Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija JU Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš"	Kantonalno ministarstvo zdravstva	KS	Domaća sredstva	Budžet	Budžet kantona	5.229.370	3.829.370			
Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija JU Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš" Sarajevo Ukupno							5.229.370	3.829.370			
Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija na ambulantama i centralnim objektima JU Doma zdravlja KS	Kantonalno ministarstvo zdravstva	KS	Domaća sredstva	Budžet	Budžet kantona	2.997.811	2.697.811	100.000			
						Kredit	Ostala domaća sredstva	699.985	299.985	400.000	
Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija na ambulantama i centralnim objektima JU Doma zdravlja KS Ukupno							3.697.796	2.997.796	500.000	100.000	
Jačanje zdravstvenog sektora - HSEP dodatno finansiranje	Federalno ministarstvo zdravstva	FBiH	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH - sufinansiranje	815.600	182.562	330.243	265.136		
						Ino sredstva	Kredit	Razvojna banka vijeća Europe (CEB)	10.760.000		
			Svjetska banka (WB) osim IDA	8.155.600	1.648.683			3.800.467	2.693.658		
Jačanje zdravstvenog sektora - HSEP dodatno finansiranje, ukupno							19.731.200	1.831.245	4.130.710	2.958.794	

120 ZDRAVSTVO	Nabavka medicinske opreme za JU Dom zdravlja KS	Kantonalno ministarstvo zdravstva	KS	Domaća sredstva	Budžet	Budžet kantona	3.630.846	1.430.846		
	Nabavka medicinske opreme za JU Dom zdravlja KS Ukupno						3.630.846	1.430.846		
	Nabavka medicinske opreme za Klinički centar Univerziteta u Sarajevu	Kantonalno ministarstvo zdravstva	KS	Domaća sredstva	Budžet	Budžet kantona	3.725.118	3.725.118		
	Nabavka medicinske opreme za Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Ukupno						3.725.118	3.725.118		
	Nabavka medicinske opreme za Zavod za medicinu rada KS	Kantonalno ministarstvo zdravstva	KS	Domaća sredstva	Budžet	Budžet kantona	589.886	359.886		
	Nabavka medicinske opreme za Zavod za medicinu rada KS Ukupno						589.886	359.886		
	Nabavka prioritetne opreme za JU Opća bolnica "Prim. dr Abudulah Nakaš" Sarajevo	Kantonalno ministarstvo zdravstva	KS	Domaća sredstva	Budžet	Budžet kantona	2.252.161	1.602.161		
	Nabavka prioritetne opreme za JU Opća bolnica "Prim. dr Abudlah Nakaš" Sarajevo Ukupno						2.252.161	1.602.161		
	Projekat izgradnje objekta JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije na lokalitetu Jagomir za potrebe psihosocijalne rehabilitacije ovisnika u zajednici na Jagomiru	Kantonalno ministarstvo zdravstva	KS	Domaća sredstva	Budžet	Budžet kantona	2.154.630	1.596.630	258.000	
	Projekat izgradnje objekta JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije na lokalitetu Jagomir za potrebe psihosocijalne rehabilitacije ovisnika u zajednici na Jagomiru Ukupno						2.154.630	1.596.630	258.000	
	Rekonstrukcija i opremanje JU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS	Kantonalno ministarstvo zdravstva	KS	Domaća sredstva	Budžet	Budžet kantona	1.087.394	862.394		
	Rekonstrukcija i opremanje JU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS Ukupno						1.087.394	862.394		
	Rekonstrukcija i opremanje objekta JU Psihijatrijska bolnica KS	Kantonalno ministarstvo zdravstva	KS	Domaća sredstva	Budžet	Budžet kantona	903.071	453.071		
	Rekonstrukcija i opremanje objekta JU Psihijatrijska bolnica KS Ukupno						903.071	453.071		
	Rekonstrukcija i opremanje objekta Zavoda za zaštitu zdravlja studenata Kantona Sarajevo	Kantonalno ministarstvo zdravstva	KS	Domaća sredstva	Budžet	Budžet kantona	619.655	514.655		
	Rekonstrukcija i opremanje objekta Zavoda za zaštitu zdravlja studenata Kantona Sarajevo Ukupno						619.655	514.655		
	Rekonstrukcija, sanacija i opremanje JU Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS	Kantonalno ministarstvo zdravstva	KS	Domaća sredstva	Budžet	Budžet kantona	1.184.464	844.464		
					Kredit	Ostala domaća sredstva	40.000		40.000	
	Rekonstrukcija, sanacija i opremanje JU Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS Ukupno						1.224.464	844.464	40.000	

120 ZDRAVSTVO	Uvođenje informaciono-komunikacione tehnologije u zdravstvu	Kantonalno ministarstvo zdravstva	KS	Domaća sredstva	Budžet	Budžet kantona	1.118.748	568.748			
					Kredit	Ostala domaća sredstva	60.000		60.000		
	Uvođenje informaciono-komunikacione tehnologije u zdravstvu Ukupno							1.178.748	568.748	60.000	
	Završetak i opremanja 4 bolnice u F BiH (Saudijski fond)	Federalno ministarstvo zdravstva	FBIH	Domaća sredstva	Kredit		5.000.000		5.000.000		
					Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	3.795.113	1.203.591	1.753.282	1.408.160	
Ino sredstva				Kredit	Saudijska Arabija	28.926.272	13.808.543	15.333.889	6.853.148		
Završetak i opremanja 4 bolnice u F BiH (Saudijski fond) Ukupno							37.721.385	15.012.134	22.013.135	8.586.180	
120 ZDRAVSTVO Ukupno							89.989.477	37.413.571	27.701.846	11.644.974	
140 VODOSNABDIJEVANJE I SANITACIJA	Drugi projekat upravljanja čvrstim otpadom	Federalno ministarstvo okoliša i turizma	FBIH	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBIH - javne investicije	2.690.000	671.564	489.000	241.058	
				Ino sredstva	Kredit	Svjetska banka (WB) osim IDA	18.287.000	1.691.202	2.347.000	332.313	
						Svjetska banka - Međunarodna asocijacija za razvoj (WB IDA)	12.381.000	3.929.286	2.814.000	1.112.634	
	Drugi projekat upravljanja čvrstim otpadom Ukupno							33.358.000	6.292.052	5.650.000	1.686.005
	GEF Projekat upravljanje Neretvom i Trebišnjicom	Agencija za vodno područje Jadranskog mora	FBIH	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBIH - sufinansiranje	217.000	25.465	187.824		
					Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	4.634.500		433.440	114.369	
					Vlastita sredstva	Javno privatno partnerstvo (JPP)	505.680		144.480		
				Ino sredstva	Grant	Svjetska banka (WB) osim IDA	3.737.500	662.976	605.371	477.329	
	GEF Projekat upravljanje Neretvom i Trebišnjicom Ukupno							9.094.680	688.441	1.371.115	591.698
	GEF Projekat zaštite kvaliteta voda u BiH	Agencija za vodno područje rijeke Save	FBIH	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBIH –potrošačka jedinica	3.960.000	2.230.000	740.000	400.000	
Budžet					Budžet općine - sufinansiranje	110.000					
Vlastita sredstva					Fondovi vlastito ucesce	2.000.000		1.000.000	1.000.000		
Ino sredstva				Grant	Europska komisija (EC)-IPA	14.910.000	3.570.000	2.540.000	1.390.000		
				Grant	Svjetska banka (WB) osim IDA	11.760.000	8.680.000	1.230.000	430.000		
				Grant	Švedska međunarodna razvojna agencija (SIDA)	8.020.000	0	6.020.000	1.570.000		
				Kredit	Svjetska banka (WB) osim IDA	600.000	600.000				
GEF projekat zaštite kvaliteta voda u BiH Ukupno							41.360.000	15.080.000	11.530.000	4.790.000	

IPA-2010 Izgradnja reciklažnog postrojenja u Mostaru	Federalno ministarstvo okoliša i turizma	FBIH	Ino sredstva	Grant	Europska komisija (EC)-IPA	4.580.000		4.580.000	4.000.000
IPA-2010 Izgradnja reciklažnog postrojenja u Mostaru Ukupno						4.580.000		4.580.000	4.000.000
Izgradnja Centra za upravljanje čvrstim otpadom, te sanacija i zatvaranje postojeće deponije "Babunovići" Srebrenik	Općina Srebrenik	TK	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	300.000			
			Ino sredstva	Grant	Europska komisija (EC)-IPA	1.950.000			
Izgradnja Centra za upravljanje čvrstim otpadom, te sanacija i zatvaranje postojeće deponije "Babunovići" Srebrenik Ukupno						2.250.000			
Izgradnja centra za upravljanje otpadom - Konjic	Općina Konjic	HNK	Domaća sredstva	Budžet	Općina budžet	2.150.000		2.100.000	2.100.000
				Grant	Fondovi vlastito ucesce	500.000			
Izgradnja centra za upravljanje otpadom - Konjic Ukupno						2.650.000		2.100.000	2.100.000
Izgradnja deponije smeća Ponir i izgradnja reciklažnog dvorišta-sortirnica	Općina Prozor-Rama	HNK	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	310.000		90.000	90000
			Ino sredstva	Grant	Švedska međunarodna razvojna agencija (SIDA)	373.500			
Izgradnja deponije smeća Ponir i izgradnja reciklažnog dvorišta-sortirnica Ukupno						683.500		90.000	90.000
Izgradnja kanalizacije i vodosnabdijevanje u općini Čelić	Općina Čelić	TK	Ino sredstva	Kredit	Austrija	6.086.157			
Izgradnja kanalizacije i vodosnabdijevanje u općini Čelić Ukupno						6.086.157			
Izgradnja kanalizacionog sistema u Ljubuškom	Općina Ljubuški	HNK	Ino sredstva	Grant	Europska komisija (EC)-IPA	3.715.640		586.740	448.710
Izgradnja kanalizacionog sistema u Ljubuškom Ukupno						3.715.640		586.740	448.710
Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda općine Bihać	Općina Bihać	USK	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	3.520.000		980.000	
				Vlastita sredstva	Fondovi vlastito ucesce	3.740.000		1.430.000	
			Ino sredstva	Grant	Europska komisija (EC)-IPA	5.630.000		1.960.000	
				Grant	KfW	34.230.000	7.180.000	12.030.000	700.000
Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda općine Bihać Ukupno						47.120.000	7.180.000	16.400.000	700.000
Sanacija deponije "Višnjik" u Gradačcu	Općina Gradačac	TK	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	341.000			
Sanacija deponije "Višnjik" u Gradačcu Ukupno						341.000			

140 VODOSNABDIJEVANJE I SANITACIJA	Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u F BiH	Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva	FBIH	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine-sufinansiranje	43.139.121		209.153	5.865	
					Vlastita sredstva	Fondovi vlastito ucesce	32.149.322		50.000	50.000	
				Ino sredstva	Grant	Europska komisija (EC)-IPA	32.743.492		5.781.369		
					Kredit	EIB	117.349.800		3.416.065	816.294	
	Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u F BiH Ukupno							225.381.735		9.456.587	872.159
	Vodosnabdijevanje naselja Rilić, Gornje i Donje ravno i zaseoka Zaganlina, Mušići i Zvirnjača, Općina Kupres	Općina Kupres	Kanton 10	Domaća sredstva	Budžet	Općina budžet	1.035.000		35.000		
			Vlastita sredstva		Fondovi vlastito ucesce	150.000		150.000			
Vodosnabdijevanje naselja Rilić, Gornje i Donje ravno i zaseoka Zaganlina, Mušići i Zvirnjača, Općina Kupres Ukupno							1.185.000		185.000	63.039	
140 VODOSNABDIJEVANJE I SANITACIJA Ukupno							377.805.712	29.240.493	51.949.442	14.892.901	
150 VLADIN SEKTOR I CIVILNO DRUŠTVO	Renoviranje i dogradnja arhivske zgrade- Dogradnja II faze Depoa Kantonalnog Arhiva	Kantonalni arhiv	SBK	Domaća sredstva	Budžet	Budžet kantona	1.387.495	484.625	300.000	902.869	
							Renoviranje i dogradnja arhivske zgrade- Dogradnja II faze Depoa Kantonalnog Arhiva Ukupno				
	Nabavka opreme za MUP KS	Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova	KS	Domaća sredstva	Budžet	Budžet kantona	13.956.901	13.578.965	908.760	871.837	
							Nabavka opreme Ukupno				
	Projekat registracija nekretnina	Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove	FBIH	Ino sredstva	Kredit	Svjetska banka - Međunarodna asocijacija za razvoj (WB IDA)	25.730.000		20.000	18.961	
							Projekat registracija nekretnina Ukupno				
150 VLADIN SEKTOR I CIVILNO DRUŠTVO Ukupno							41.074.396	14.082.551	4.454.372	1.774.706	
160 OSTALE USLUGE I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA	ARCH – Obnova građevinske baštine u Stocu	Federalno ministarstvo kulture i sporta	HNK	Ino sredstva	Grant	Evropska unija	195.583	46.463	156.466	7.753	
							ARCH - Obnova građevinske baštine u Stocu Ukupno				
	Izgradnja doma za stare i nemoćne osobe "RAMA"	Općina Prozor-Rama	HNK	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	430.895	230.895	200.000	6.000	
				Ino sredstva	Grant	Ostala ino sredstva	250.000		250.000		
Izgradnja doma za stare i nemoćne osobe "RAMA" Ukupno							680.895	230.895	450.000	6.000	

160 OSTALE USLUGE I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA	Izgradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoni "Sjever" u Odžaku	Općina Odžak	PK	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBIH - javne investicije	1.159.000	379.000	80.000	80.000	
					Budžet	Budžet kantona	230.000	30.000	50.000		
					Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	2.100.000	136.160	100.000		
					Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	200.000	200.000			
				Ino sredstva	Grant	Ostala ino sredstva	23.000	23.000			
	Izgradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoni "Sjever" u Odžaku Ukupno							3.712.000	768.160	230.000	80.000
	Izgradnja kulturnog centra u Gradačcu	Općina Gradačac	TK	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	1.000.000				
	Izgradnja kulturnog centra u Gradačcu Ukupno							1.000.000			
	SSNEŠP- Podrška mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja	Federalno ministarstvo rada i socijalne politike	FBIH	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBIH - sufinansiranje	840.000	597.128	202.253	202.253	
					Vlastita sredstva	Fondovi vlastito ucesce	6.720.000	3.104.662	2.804.782	2.804.782	
Ino sredstva				Kredit	Svjetska banka (WB) osim IDA	11.900.000	4.215.362	4.892.039	4.892.039		
Podrška mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja Ukupno							19.460.000	7.917.152	7.899.074	7.899.074	
Završetak II faze sportske dvorane u Brijesnici Velikoj	Općina Dobož Istok	TK	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBIH - javne investicije	1.338.984	170.000	170.000	170.000		
Završetak II faze sportske dvorane u Brijesnici Velikoj Ukupno							1.338.984	170.000	170.000	170.000	
Završetak privredno kulturnog i sportskog centra Gračanica	Općina Gračanica	TK	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine	371.000	371.000				
				Budžet	Budžet kantona	1.000.000					
				Kredit	Ostala domaća sredstva	629.000	629.000				
Završetak privredno kulturnog i sportskog centra Gračanica Ukupno							2.000.000	1.000.000			
160 OSTALE USLUGE I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA Ukupno							28.387.462	10.132.670	8.905.540	8.162.827	
210 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE	Glavni popravak i modernizacija 14 električnih lokomotiva	Federalno ministarstvo prometa i komunikacija	FBIH	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	5.309.790	3.394.473	126.913		
				Ino sredstva	Kredit	Ostala ino sredstva	30.088.812	19.235.348	126.913		
	Glavni popravak i modernizacija 14 električnih lokomotiva Ukupno							35.398.602	22.629.821	126.913	
	Izgradnja ceste M-17.3 Neum-Stolac, dionica Kiševo-Broćanac L=cca 8,1 km	JP Ceste Federacije BiH	HNK	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBIH - javne investicije	3.400.000	2.430.000	975.000	760.000	
					Grant	GSM licenca	3.280.000	1.630.000	1.600.000	80.000	
					Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	4.060.000	4.060.000	50.000	50.000	
Ino sredstva	Kredit	EBRD	880.000	880.000							
Izgradnja ceste M-17.3 Neum-Stolac, dionica Kiševo-Broćanac L=cca 8,1 km Ukupno							11.620.000	9.000.000	2.780.000	1.390.000	

Izgradnja glavne gradske magistrale u Zenici između Saudijskog fonda za razvoj i BiH	Općina Zenica	ZDK	Ino sredstva	Kredit	Saudijska Arabija	37.413.000	9.901.000	21.012.000	2.478.000
Izgradnja glavne gradske magistrale u Zenici između Saudijskog fonda za razvoj i BiH Ukupno						37.413.000	9.901.000	21.012.000	2.478.000
Izgradnja novoprojektovane dionice Kladanj - Potpaklenik, potez Karaula	JP Ceste Federacije BiH	TK	Domaća sredstva	Grant	GSM licenca	10.500.000	193.222	10.306.000	757.114
				Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	970.000	849.874	170.000	146.724
			Ino sredstva	Kredit	Europska investiciona banka (EIB)	4.311.000		4.311.000	4.243.925
Izgradnja novoprojektovane dionice Kladanj - Potpaklenik, potez Karaula Ukupno						15.781.000	1.043.096	14.787.000	5.147.763
Izrada projektne dokumentacije na prijedlog FMPK	JP Ceste FBIH	FBIH	Domaća sredstva	Grant	Budžet F BiH-GSM licenca	2.620.000			
Izrada projektne dokumentacije na prijedlog FMPK Ukupno						2.620.000			
Jačanje i umrežavanje malih aerodroma u Jadranskom području (A3-NET)	Kantonalno ministarstvo privrede	Kanton 10	Domaća sredstva	Budžet	Budžet kantona	57.531	13.900	43.631	
			Ino sredstva	Grant	Europska komisija (EC)-IPA	326.007	78.767	247.240	
Jačanje i umrežavanje malih aerodroma u Jadranskom području (A3-NET) Ukupno						383.538	92.667	290.871	
Koridor Vc	Federalno ministarstvo prometa i komunikacija	FBIH	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBIH - javne investicije	25.000.000	25.000.000		
				Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	36.816.718		19.558.300	17.079.526
			Ino sredstva	Kredit	EBRD	352.049.400	105.322.347	177.949.170	271.517.481
				Kredit	EIB	471.355.030	127.771.318	218.055.932	243.548.403
			Kredit	Kuvajt	54.763.240				
Koridor Vc Ukupno						939.984.388	258.093.665	415.563.402	532.145.410
Nabavka vozova nagibne tehnike TALGO	Federalno ministarstvo prometa i komunikacija	FBIH	Ino sredstva	Kredit	Vlada Španije	132.267.028	131.699.897		
Nabavka vozova nagibne tehnike TALGO Ukupno						132.267.028	131.699.897		
Prekogranično zračno uvezivanje (CAN)	Kantonalno ministarstvo privrede	Kanton 10	Domaća sredstva	Budžet	Budžet kantona	208.295		208.295	
			Ino sredstva	Grant	Europska komisija (EC)-IPA	1.180.343		1.180.343	
Prekogranično zračno uvezivanje (CAN) Ukupno						1.388.638		1.388.638	
Regionalni projekat obnove željeznica u BiH /Željeznice II/	Federalno ministarstvo prometa i komunikacija	FBIH	Ino sredstva	Grant	IPA	12.713.000	7.570.000	3.570.000	3.570.000
				Kredit	EBRD	82.145.000	52.510.000	12.884.000	3.496.000
				Kredit	EIB	100.921.000	56.325.000	11.735.000	5.870.000
Regionalni projekat obnove željeznica u BiH /Željeznice II/ Ukupno						195.779.000	116.405.000	28.189.000	12.936.000

210 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE	Rehabilitacija cesta u F BiH	Federalno ministarstvo prometa i komunikacija	FBIH	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	15.440.000	15.440.000	1.800.000		
				Ino sredstva	Kredit	EBRD	88.020.000	69.810.000	18.180.000		
					Kredit	EIB	97.791.500	85.960.000	6.250.000		
					Kredit	Svjetska banka - Međunarodna asocijacija za razvoj (WB IDA)	18.640.000	18.590.000			
	Rehabilitacija cesta u F BiH Ukupno							219.891.500	189.800.000	26.230.000	
	Rekonstrukcija i dogradnja petlje Šiški Brod, rekonstrukcija i dogradnja drugog kolovoza na cesti M-4 Doboj-Tuzla, dionica Drežnik-Petlja Šiški Brod	JP Ceste Federacije BiH	TK	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBIH - javne investicije	18.000.000	7.610.000	10.000.000	1.840.000	
					Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	580.000	580.000			
	Rekonstrukcija i dogradnja petlje Šiški Brod, rekonstrukcija i dogradnja drugog kolovoza na cesti M-4 Doboj-Tuzla, dionica Drežnik-Petlja Šiški Brod Ukupno							18.580.000	8.190.000	2.500.000	2.213.528
	Sarajevska obilaznica	Federalno ministarstvo prometa i komunikacija	KS	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBIH - javne investicije	40.000.000	40.270.000	29.710.000	3.180.000	
					Ino sredstva	Kredit	EBRD	73.520.000	70.040.000	3.440.000	1.940.000
Kredit				EIB		72.090.000	43.230.000	28.840.000	310.000		
Kredit				OPEC fond za međunarodni razvoj		26.920.000		3.320.000	3.320.000		
Sarajevska obilaznica Ukupno							212.530.000	153.540.000	65.310.000	8.750.000	
210 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE Ukupno							1.823.636.694	900.395.146	578.177.824	565.060.701	
230 PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE ENERGIJOM	CHE Vrilo	JP EP BiH	Kanton 10	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	19.206.000	1.379.000	600.000		
				Ino sredstva	Grant	KfW	1.222.000	880.000			
	CHE Vrilo Ukupno							20.428.000	2.259.000	600.000	
	Električna distribucija BiH	JP EP BiH	FBIH	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	29.337.450	3.679.468	7.334.363		
					Ino sredstva	Kredit	EIB	29.337.450		7.334.363	
	Električna distribucija BiH Ukupno							58.674.900	3.679.468	14.668.726	
	Faza III bis /HE Jablanica-Rekonstrukcija agregata 4,5 i 6 (iz nealociranih sredstava POWER I, II, III/)	JP EP BiH	HNK	Ino sredstva	Kredit	Švajcarska (CH)	4.248.383	3.513.094	175.119	0	
	Faza III bis /HE Jablanica-Rekonstrukcija agregata 4,5 i 6 (iz nealociranih sredstava POWER I, II, III/ Ukupno							4.248.383	3.513.094	175.119	0
	Gasifikacija Srednjobosanskog kantona I faza - Gasovod Zenica - Travnik	Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije	SBK	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	8.155.830	6.655.830	1.500.000	1.972.770	
					Ino sredstva	Grant	EBRD	648.300	572.110	76.190	76.100
Kredit				EBRD		32.755.550	16.851.160	14.645.510	12.103.010		
Gasifikacija Srednjobosanskog kantona I faza - Gasovod Zenica - Travnik Ukupno							41.559.680	24.079.100	16.221.700	14.151.880	

Izgradnja HE Una Aneks - 6,1 MW	JP EP BiH	USK	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	7.823.320	0	1.200.000	211.000
			Ino sredstva	Kredit	Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	17.602.470	0	0	0
Izgradnja HE Una Aneks - 6,1 MW Ukupno						25.425.790	0	1.200.000	211.000
Izgradnja HE Vranduk na rijeci Bosni - 20 MW	JP EP BiH	ZDK	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	22.490.000	1.838.000	5.600.000	4.874.000
			Ino sredstva	Kredit	EBRD	50.852.000	0	0	0
				Kredit	EIB	73.344.000	0	0	0
Izgradnja HE Vranduk na rijeci Bosni - 20 MW Ukupno						146.686.000	1.838.000	5.600.000	4.874.000
Izgradnja Vjetroelektrana Podveležje 1	JP EP BiH	HNK	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	14.081.976	2.356.209	500.000	59.035
			Ino sredstva	Kredit	KfW	127.128.950	0	0	0
Izgradnja Vjetroelektrana Podveležje 1 Ukupno						141.210.926	2.356.209	500.000	59.035
Izgradnja vjetroelektrane Mesihovina u okviru finacijske suradnje Njemačke i BiH	JP EP HZ HB	Kanton 10	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	11.735.000	456.000		
			Ino sredstva	Grant	KfW	1.956.000	962.000	529.267	259.267
				Kredit	KfW	138.864.000		138.864.000	
Izgradnja vjetroelektrane Mesihovina u okviru finacijske suradnje Njemačke i BiH Ukupno						152.555.000	1.418.000	140.088.000	529.267
Obnova električne energije II	JP EP HZ HB	FBIH	Ino sredstva	Kredit	EIB	38.921.017	32.718.000	5.421.000	
Obnova električne energije II Ukupno						38.921.017	32.718.000	5.421.000	
POWER IV - EP BiH - Uvođenje SCADA/DMS i TK u sektor distribucije	JP EP BiH	FBIH	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	3.618.286			
			Ino sredstva	Grant	KfW	5.065.600			
				Kredit	KfW	9.251.076			
POWER IV - EP BiH - Uvođenje SCADA/DMS i TK u sektor distribucije Ukupno						17.934.962			
Revitalizacija hidroelektrane Rama	JP EP HZ HB	HNK	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBIH - javne investicije	5.583.660		5.583.659	5.558.703
				Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	14.779.631			
			Ino sredstva	Grant	KfW	13.690.810	12.305.000	1.386.270	1.347.019
				Kredit	KfW	19.558.300	3.861.000	15.697.626	13.253.295
Revitalizacija hidroelektrane Rama Ukupno						53.612.401	16.166.000	22.667.555	20.159.017
RiTE Kongora	JP EP HZ HB	Kanton 10	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	2.669.000	2.669.000		
RiTE Kongora Ukupno						2.669.000	2.669.000		

230 PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE ENERGIJOM	SCADA/DMS/OMS s pripadajućim komunikacijskim sustavom	JP EP HZ HB	FBIH	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	2.523.000			
				Ino sredstva	Grant	KfW	3.520.494		704.000	
					Kredit	KfW	6.474.727		1.296.000	
	SCADA/DMS/OMS s pripadajućim komunikacijskim sustavom Ukupno						12.518.221		2.000.000	
	Toplifikacija Gračanice	Općina Gračanica	TK	Domaća sredstva	Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	2.500.000	1.500.000	500.000	
					Vlastita sredstva	Javno-privatno partnerstvo (JPP)	10.400.000	10.400.000	500.000	
				Ino sredstva	Grant	Europska komisija (EC)-IPA	400.000	400.000		
	Toplifikacija Gračanice Ukupno						13.300.000	12.300.000	1.000.000	
	Toplifikacija Srebrenika	Općina Srebrenik	TK	Domaća sredstva	Budžet	Budžet kantona	1.000.000	500.000	500.000	
					Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	4.000.000	250.000	250.000	
Toplifikacija Srebrenika Ukupno						5.000.000	750.000	750.000		
230 PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE ENERGIJOM Ukupno						734.744.280	103.745.871	210.892.100	39.984.199	
250 POSLOVNE I DRUGE USLUGE	Izgradnja poduzetničkih zona Prozor Rama	Općina Prozor-Rama	HNK	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBIH - javne investicije	250.000	150.000	100.000	
					Budžet	Budžet kantona	450.000	400.000	50.000	
					Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	335.000	315.000	20.000	
				Ino sredstva	Grant	Ostala ino sredstva	125.000	125.000		
	Izgradnja poduzetničkih zona Prozor Rama Ukupno						1.160.000	990.000	170.000	
250 POSLOVNE I DRUGE USLUGE Ukupno						1.160.000	990.000	170.000		
311 POLJOPRIVREDA	Poljoprivreda i ruralni razvoj	Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva	FBIH	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBIH - sufinansiranje	2.400.000	1.800.000	490.063	490.063
					Ino sredstva	Grant	Švedska međunarodna razvojna agencija (SIDA)	4.400.000	3.700.000	171.310
				Kredit		Svjetska banka - Međunarodna asocijacija za razvoj (WB IDA)	15.800.000	11.465.497	2.502.613	2.502.613
	Poljoprivreda i ruralni razvoj Ukupno						22.600.000	16.965.497	3.163.986	3.163.986
	Razvoj navodnjavanja	Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva	FBIH	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBIH - sufinansiranje	4.913.992		1.920.000	
Ino sredstva					Kredit	Svjetska banka - Međunarodna asocijacija za razvoj (WB IDA)	27.845.956		10.900.000	
Razvoj navodnjavanja Ukupno						32.759.948		12.820.000		

311 POLJOPRIVREDA	Unapređenje ruralnog poduzetništva	Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva	FBIH	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBIH - sufinansiranje	3.332.000	3.016.000	316.000	316.000	
				Ino sredstva	Kredit	IFAD	7.978.000	7.708.000	73.000	73.000	
					Kredit	OPEC fond za međunarodni razvoj	8.250.000	8.577.000			
	Unapređenje ruralnog poduzetništva Ukupno							19.560.000	19.301.000	389.000	389.000
	Unapređenje uvjeta života na selu	Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva	FBIH	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBIH - sufinansiranje	2.263.000		957.000	46.000	
				Ino sredstva	Kredit	IFAD	7.342.000		1.836.000	3.366.000	
Kredit					OPEC fond za međunarodni razvoj	9.034.000		2.257.000	784.000		
Unapređenje uvjeta života na selu Ukupno							18.639.000	5.050.000	4.196.000		
311 POLJOPRIVREDA Ukupno							93.558.948	36.266.497	21.422.986	7.748.986	
312 ŠUMARSTVO	Zaštićena šumska i planinska područja - FMPAP	Federalno ministarstvo okoliša i turizma	FBIH	Ino sredstva	Grant	Svjetska banka (WB) osim IDA	2.461.600	2.366.281	1.025.219	943.465	
							Zaštićena šumska i planinska područja - FMPAP Ukupno				
312 ŠUMARSTVO Ukupno							2.461.600	2.366.281	1.025.219	943.465	
321 INDUSTRIJA	Poboljšanje pristupa malih i srednjih preduzeća finansijskim sredstvima SME	Federalno ministarstvo financija-finansija	FBIH	Ino sredstva	Kredit	Svjetska banka (WB) osim IDA	56.093.204	55.361.421	417.603	198.330	
							Poboljšanje pristupa malih i srednjih preduzeća finansijskim sredstvima SME Ukupno				
	Poboljšanje pristupa malih i srednjih preduzeća finansijskim sredstvima SME - dodatno finansiranje	Federalno ministarstvo financija-finansija	FBIH	Ino sredstva	Kredit	Svjetska banka (WB) osim IDA	105.687.300		29.325.000		
							Poboljšanje pristupa malih i srednjih preduzeća finansijskim sredstvima SME - dodatno finansiranje Ukupno				
321 INDUSTRIJA Ukupno							161.780.504	55.361.421	29.742.603	198.330	
322 RUDNI RESURSI I RUDARSTVO	Izgradnja istražno-eksploatacionih bušotina i rekonstrukcija transportnih sistema - Tuzla	Kantonalno ministarstvo energetike, industrije i rudarstva	TK	Domaća sredstva	Budžet	Budžet kantona	1.500.000	300.000	500.000		
					Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	11.500.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000	
	Izgradnja istražno-eksploatacionih bušotina i rekonstrukcija transportnih sistema - Tuzla Ukupno							13.000.000	2.800.000	5.500.000	2.500.000
322 RUDNI RESURSI I RUDARSTVO Ukupno							13.000.000	2.800.000	5.500.000	2.500.000	

323 GRAĐEVINARSTVO	Energetska sanacija Sarajeva - Povećanje energetske efikasnosti u stambenim zgradama u KS - ENESANSA	Kantonalno ministarstvo stambene politike	KS	Domaća sredstva	Budžet	Budžet kantona-javne finansije	3.730.654	2.330.654			
					Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	112.987	112.987			
					Budžet	Budžet kantona-potrošačka jedinica	80.000				
					Kredit	Ostala domaća sredstva	1.164.351	682.851	500.000		
					Vlastita sredstva	Ostala domaća sredstva	17.874	17.874			
				Ino sredstva	Grant	Ostala ino sredstva	22.452	22.452			
	Energetska sanacija Sarajeva - Povećanje energetske efikasnosti u stambenim zgradama u KS - ENESANSA Ukupno							5.128.318	3.166.818	500.000	
	Izgradnja sportske dvorane u Kalesiji	Općina Kalesija	TK	Domaća sredstva	Budžet	Saudijska Arabija	4.617.000	3600000	480.000		
	Izgradnja sportske dvorane u Kalesiji Ukupno							4.617.000	3.600.000	480.000	
	Izgradnja zgrade za općinske organe uprave Srebrenik	Općina Srebrenik	TK	Ino sredstva	Kredit	Saudijska Arabija	4.500.000		300.000	300.000	
	Izgradnja zgrade za općinske organe uprave Srebrenik Ukupno							4.500.000		300.000	300.000
	Predinvestiranje u rješ. imov-pravnih odnosa i izgradnje primarne materijalne infr. za pokretanje kolektivne i individualne stambene izg. u skla. sa usvojenim pros.plan na području KS	Kantonalno ministarstvo stambene politike	KS	Domaća sredstva	Budžet	Budžet kantona	12.719.015	10.368.015			
					Kredit	Ostala domaća sredstva	2.603.700	2.195.000			
	Predinvestiranje u rješ. imov-pravnih odnosa i izgradnje primarne materijalne infr. za pokretanje kolektivne i individualne stambene izg. u skla. sa usvojenim pros.plan na području KS Ukupno							15.322.715	12.563.015		
	Sanacija ratnim dejstvima oštećenih fasada na području KS	Kantonalno ministarstvo stambene politike	KS	Domaća sredstva	Budžet	Budžet kantona	3.416.602	2.716.612			
	Sanacija ratnim dejstvima oštećenih fasada na području KS Ukupno							3.416.602	2.716.612		
	Sanacija ratnim dejstvima oštećenih krovova na području KS	Kantonalno ministarstvo stambene politike	KS	Domaća sredstva	Budžet	Budžet kantona	12.275.993	12.275.993			
					Kredit	Ostala domaća sredstva	200.000				
	Sanacija ratnim dejstvima oštećenih krovova na području KS Ukupno							12.475.993	12.275.993		
	Sanacija ratnim dejstvima oštećenih liftova na području KS	Kantonalno ministarstvo stambene politike	KS	Domaća sredstva	Budžet	Budžet kantona	2.780.000	2.180.010			
					Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	150.000	150.000			
					Vlastita sredstva	Fondovi vlastito ucesce	208.827	208.827			
					Vlastita sredstva	Ostala domaća sredstva	33.797	33.797			
Sanacija ratnim dejstvima oštećenih liftova na području KS Ukupno							3.172.624	2.572.634			

323 GRAĐEVINARSTVO	Sanacija ratnim dejstvima oštećenih zajedničkih dijelova objekata - Velike opravke na području KS	Kantonalno ministarstvo stambene politike	KS	Domaća sredstva	Budžet	Budžet kantona	7.579.665	7.179.665		
					Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	205.423	205.423		
	Sanacija ratnim dejstvima oštećenih zajedničkih dijelova objekata - Velike opravke na području KS Ukupno						7.785.088	7.385.088		
	Sredstva za snimanje objekata, ispitivanje stabilnosti konstrukcija, izrada sanacionih elaborataa, projektne dokumentacije, obezbjeđivanje dozvola za snaciju, troškovi tehničkog prijema	Kantonalno ministarstvo stambene politike	KS	Domaća sredstva	Budžet	Budžet kantona	1.381.725	1.081.725		
					Kredit	Ostala domaća sredstva	100.000			
Sredstva za snimanje objekata, ispitivanje stabilnosti konstrukcija, izrada sanacionih elaborataa, projektne dokumentacije, obezbjeđivanje dozvola za snaciju, troškovi tehničkog prijema Ukupno						1.481.725	1.081.725			
323 GRAĐEVINARSTVO Ukupno						57.900.065	45.361.885	780.000	300.000	
332 TURIZAM	Revitalizacija kompleksa "Stari grad" Srebrenik	Općina Srebrenik	TK	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH - potrošačka jedinica	600.000		200.000	
					Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	100.000		30.000	
					Vlastita sredstva	Fondovi vlastito ucesce	250.000	100.000	50.000	
	REvitalizacija kompleksa "Stari grad" Srebrenik Ukupno						950.000	100.000	280.000	
332 TURIZAM Ukupno						950.000	100.000	280.000		
400 VIŠESEKTORSKE / UZAJAMNO POVEZANE AKTIVNOSTI	IPA 2011 - OTPAD	Federalno ministarstvo okoliša i turizma	FBiH	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBiH - javne investicije	563.000		200.000	
				Ino sredstva	Grant	Europska komisija (EC)-IPA	9.200.000		2.000.000	
					Kredit	Svjetska banka (WB) osim IDA	5.630.000		2.000.000	
	IPA 2011 - OTPAD Ukupno						15.393.000		4.200.000	
	Izgradnja i uređenje mezarja "Hambina carina" Sarajevo	Fond memorijala Kantona Sarajevo	KS	Domaća sredstva	Budžet	Budžet kantona	179.400	31.079	11.400	
					Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	127.035	16.435	15.600	
	Izgradnja i uređenje mezarja "Hambina carina" Sarajevo Ukupno						306.435	47.514	28.298	23.863
	Izgradnja i uređenje mezarja "Ravne bakije" Sarajevo	Fond memorijala Kantona Sarajevo	KS	Domaća sredstva	Budžet	Budžet kantona	178.741	45.715	15.060	15.027
					Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	131.319	95.179	16.140	16.140
	Izgradnja i uređenje mezarja "Ravne bakije" Sarajevo Ukupno						310.060	140.894	31.166	31.166

400 VIŠESEKTORSKE / UZAJAMNO POVEZANE AKTIVNOSTI	Izgradnja kompleksa "Šehidsko spomen mezarje Kovači" Sarajevo	Fond memorijala Kantona Sarajevo	KS	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBIH - potrošačka jedinica	500.000	500.000			
					Budžet	Budžet kantona	13.775.251	5.473.000	216.400	41.718	
					Budžet	Budžet općine - sufinansiranje	221.751	221.751			
					Budžet	Općina budžet	255.000	255.000			
					Budžet	Ostala domaća sredstva	10.000	10.000			
					Grant	Javno-privatno partnerstvo (JPP)	58.203	58.203			
					Kredit	Ostala domaća sredstva	2.233.300	2.148.868	84.432	67.459	
				Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	300.000	300.000				
	Ino sredstva	Grant	Ostala ino sredstva	133.971	133.971						
	Izgradnja kompleksa "Šehidsko spomen mezarje Kovači" Sarajevo Ukupno							17.487.476	9.100.793	300.832	109.177
	Izrada i postavljanje nišana i spomenika šehidima i poginulim borcima i umrlim braniteljima Armije BiH	Fond memorijala Kantona Sarajevo	KS	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBIH - javne investicije	18.500	18.500			
					Budžet	Budžet kantona	4.790.602	4.572.804	85.000	75.000	
					Budžet	Budžet kantona	256.112	90.000	57.798	57.798	
					Budžet	Općina budžet	697.688	307.688	66.112	66.112	
	Izrada i postavljanje nišana i spomenika šehidima i poginulim borcima i umrlim braniteljima Armije BiH Ukupno							5.762.902	4.988.992	208.910	198.910
	Nabavka opreme za Šehidsko spomen mezarje Kovači Sarajevo	Fond memorijala Kantona Sarajevo	KS	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBIH - javne investicije	770.700	266.159	16.000	15.996	
	Nabavka opreme za Šehidsko spomen mezarje Kovači Sarajevo Ukupno							770.700	266.159	24.500	24.322
	Podrška razvoju lokalnih zajednica PRLZ	Federalno ministarstvo finansija	FBIH	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBIH - javne investicije	33.861.920	11.414.002	5.015.000	804.520	
					Budžet	Budžet kantona	31.659.937	4.171.782	7.500.000	414.323	
	Podrška razvoju lokalnih zajednica PRLZ Ukupno							65.521.857	15.585.784	12.515.000	1.218.843
Prostorni plan Federacije Bosne i Hercegovine	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	FBIH	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBIH - javne investicije	6.488.000	5.340.873	467.500	467.500		
Prostorni plan Federacije Bosne i Hercegovine Ukupno							6.488.000	5.340.873	467.500	467.500	
Rekonstrukcija rudarskog kompleksa Vihovići-Mostar-II faza	Grad Mostar	HNK	Domaća sredstva	Budžet	Budžet FBIH - javne investicije	3.579.501	303.260	370.000	180.375		
Rekonstrukcija rudarskog kompleksa Vihovići-Mostar-II faza Ukupno							3.579.501	303.260	370.000	180.375	
Sanacija deponije "Klepovica" Neum	Općina Neum	HNK	Ino sredstva	Kredit	Svjetska banka	2.346.996					
Sanacija deponije "Klepovica" Neum Ukupno							2.346.996				
400 VIŠESEKTORSKE / UZAJAMNO POVEZANE AKTIVNOSTI Ukupno							117.966.927	35.774.269	18.146.206	2.254.156	
UKUPNO							3.544.993.365	1.274.400.655	959.355.438	655.647.545	

Prilog 2: Projekti u implementaciji po strateškim ciljevima

Naziv projekta	Socio-ekonomski razvoj		Izgradnja institucija		SR/SSU			Finansijski pokazatelji			
	Kapitalni	Instituc. - razvojni	Kapitalni	Izgradnja kapaciteta	Strateski Cilj SR/SSU	Podcilj SR/SSU	Prioritet/mjera SR/SSU	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za 2013	Utrošeno u 2013
Koridor Vc	x				4-Održivi razvoj	3-Transport i komunikacije	1 - Povećanje mobilnosti roba i ljudi	939.984.388	258.093.665	415.563.402	532.145.410
Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u Federaciji BiH	x				4-Održivi razvoj	1-Poljoprivreda, proizvodnja hrane i ruralni razvoj		225.381.735		9.456.587	872.159
Rehabilitacija cesta u Federaciji BiH	x				4-Održivi razvoj	3-Transport i komunikacije	1 - Povećanje mobilnosti roba i ljudi	219.891.500	189.800.000	26.230.000	
Sarajevska obilaznica	x				4-Održivi razvoj	3-Transport i komunikacije	1 - Povećanje mobilnosti roba i ljudi	212.530.000	153.540.000	65.310.000	8.750.000
Regionalni projekat obnove željeznica u BiH /Željeznice II/	x				4-Održivi razvoj	3-Transport i komunikacije	1 - Povećanje mobilnosti roba i ljudi	195.779.000	116.405.000	28.189.000	12.936.000
Izgradnja vjetroelektrane Mesihovina	x				4-Održivi razvoj	2 - Ekologija i razvoj energetske postrojenja	5 - Razvitak obnovljivih izvora energije	152.555.000	1.418.000	140.088.000	529.267
Izgradnja HE Vranduk na rijeci Bosni – 20 MW	x				4-Održivi razvoj	2 - Ekologija i razvoj energetske postrojenja	4 - Poticanje razvoja energetskog sektora	146.686.000	1.838.000	5.600.000	4.874.000
Izgradnja Vjetroelektrana Podveležje 1	x				4-Održivi razvoj	2 - Ekologija i razvoj energetske postrojenja	5 - Razvitak obnovljivih izvora energije	141.210.926	2.356.209	500.000	59.035
Nabavka vozova nagibne tehnike TALGO	x				4-Održivi razvoj	3-Transport i komunikacije	1 - Povećanje mobilnosti roba i ljudi	132.267.028	131.699.897		
Poboljšanje pristupa malih i srednjih preduzeća finansijskim sredstvima SME - dodatno finansiranje		x						105.687.300		29.325.000	
Projekat podrške razvoju lokalnih zajednica PRLZ		x						65.521.857	15.585.784	12.515.000	1.218.843
Električna distribucija BiH	x				4-Održivi razvoj	2 - Ekologija i razvoj energetske postrojenja	4 - Poticanje razvoja energetskog sektora	58.674.900	3.679.468	14.668.726	
Poboljšanje pristupa malih i srednjih preduzeća finansijskim sredstvima SME		x						56.093.204	55.361.421	417.603	198.330
Revitalizacija hidroelektrane Rama	x				4-Održivi razvoj	2 - Ekologija i razvoj energetske postrojenja	4 - Poticanje razvoja energetskog sektora	53.612.401	16.166.000	22.667.555	20.159.017
Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda općine Bihać	x				4-Održivi razvoj	1-Poljoprivreda, proizvodnja hrane i ruralni razvoj	4 - Poboljšanje uvjeta života i ruralna zaposlenost	47.120.000	7.180.000	16.400.000	700.000
Gasifikacija Srednjobosanskog kantona I faza - Gasovod Zenica - Travnik	x				4-Održivi razvoj	2 - Ekologija i razvoj energetske postrojenja	4 - Poticanje razvoja energetskog sektora	41.559.680	24.079.100	16.221.700	14.151.880
GEF upravljanje slivom rijeke Neretve i Trebišnjice	x			x	4-Održivi razvoj	1-Poljoprivreda, proizvodnja hrane i ruralni razvoj	3-Očuvanje prirode	41.360.000	15.080.000	11.530.000	4.790.000
Obnova električne energije II	x				4-Održivi razvoj	2 - Ekologija i razvoj energetske postrojenja	4 - Poticanje razvoja energetskog sektora	38.921.017	32.718.000	5.421.000	

Projekat završetka i opremanja 4 bolnice u F BiH (Saudijski fond)	x				5-Socijalna uključenost	3- Poboľšati zdravstvenu zaštitu	3- Unaprijediti primarnu zdravstvenu zaštitu	37.721.385	15.012.134	22.013.135	8.586.180
Projekat izgradnje glavne gradske magistrale u Zenici	x				4-Održivi razvoj	3-Transport i komunikacije	1 - Povećanje mobilnosti roba i ljudi	37.413.000	9.901.000	21.012.000	2.478.000
Glavni popravak i modernizacija 14 električnih lokomotiva	x				4-Održivi razvoj	3-Transport i komunikacije	1 - Povećanje mobilnosti roba i ljudi	35.398.602	22.629.821	126.913	
Drugi projekat upravljanja čvrstim otpadom		x			4-Održivi razvoj	1 - Poljoprivreda, proizvodnja hrane i ruralni razvoj	3 - Očuvanje prirode	33.358.000	6.292.052	5.650.000	1.686.005
Razvoj navodnjavanja		x			4-Održivi razvoj	1 - Poljoprivreda, proizvodnja hrane i ruralni razvoj	3 - Ruralni razvoj	32.759.948		12.820.000	
Projekat registracije nekretnina								25.730.000	18.961	3.245.612	
Izgradnja HE Una Aneks - 6,1 MW	x				4-Održivi razvoj	2 - Ekologija i razvoj energetskih postrojenja	4 - Poticanje razvoja energetskog sektora	25.425.790	0	1.200.000	211.000
Poljoprivreda i ruralni razvoj		x			4-Održivi razvoj	3 - Poljoprivreda proizvodnja hrane i ruralni razvitak	4- Poboľšanje uvjeta života	22.600.000	16.965.497	3.163.986	3.163.986
CHE Vrilo	x				4-Održivi razvoj	2 - Ekologija i razvoj energetskih postrojenja	4 - Poticanje razvoja energetskog sektora	20.428.000	2.259.000	600.000	
Projekat jačanja zdravstvenog sektora - HSEP dodatno finansiranje	x				5-Socijalna uključenost	3- Poboľšati zdravstvenu zaštitu	3- Unaprijediti primarnu zdravstvenu zaštitu	19.731.200	1.831.245	4.130.711	2.958.794
Projekat unapređenja ruralnog poduzetništva		x			4-Održivi razvoj	3 - Poljoprivreda proizvodnja hrane i ruralni razvitak	4- Poboľšanje uvjeta života	19.560.000	19.301.000	389.000	389.000
Projekat podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja		x			5-Socijalna uključenost	1- Socijalna politika i zapošljavanje	2 - pristup uslugama	19.460.000	7.917.152	7.899.074	7.899.074
Projekat unapređenja uvjeta života na selu		x			4-Održivi razvoj	3 - Poljoprivreda proizvodnja hrane i ruralni razvitak	4- Poboľšanje uvjeta života	18.639.000		5.050.000	4.196.000
Rekonstrukcija i dogradnja petlje Šićki Brod, rekonstrukcija i dogradnja drugog kolovoza na cesti M-4 Doboj-Tuzla, dionica Drežnik-Petlja Šićki Brod	x				4-Održivi razvoj	3-Transport i komunikacije	1 - Povećanje mobilnosti roba i ljudi	18.580.000	8.190.000	2.500.000	2.213.528
POWER IV - EP BiH - Uvođenje SCADA/DMS i TK u sektor distribucije	x				4-Održivi razvoj	2 - Ekologija i razvoj energetskih postrojenja	4 - Poticanje razvoja energetskog sektora	17.934.962			
Izgradnja kompleksa "Šehidsko spomen mezarje Kovači" Sarajevo			x					17.487.476	9.100.793	300.832	109.177
Izgradnja novoprojektovane dionice Kladanj - Potpaklenik, potez Karaula	x				4-Održivi razvoj	3-Transport i komunikacije	1 - Povećanje mobilnosti roba i ljudi	15.781.000	1.043.096	14.787.000	5.147.763
IPA 2011 - OTPAD		x			4-Održivi razvoj	1 - Poljoprivreda, proizvodnja hrane i ruralni razvoj	3 - Očuvanje prirode	15.393.000		4.200.000	
Predinvestiranje u rješ. imov-pravnih odnosa i izgradnje primarne materijalne infr. za pokretanje kolektivne i individualne stambene izg. u skla. sa usvojenim pros.plan na području KS			x					15.322.715	12.563.015		
Nabavka opreme MUP KS								13.956.901	13.578.965	908.760	871.837
Toplifikacija Gračanice	x				4-Održivi razvoj	2 - Ekologija i razvoj energetskih postrojenja	4 - Poticanje razvoja energetskog sektora	13.300.000	12.300.000	1.000.000	

Izgradnja istražno-eksploatacionih bušotina i rekonstrukcija transportnih sistema - Tuzla	x							13.000.000	2.800.000	5.500.000	2.500.000
SCADA/DMS/OMS s pripadajućim komunikacijskim sustavom	x				4-Održivi razvoj	2 - Ekologija i razvoj energetske postrojenja	4 - Poticanje razvoja energetskog sektora	12.518.221		2.000.000	
Sanacija ratnim dejstvima oštećenih krovova na području KS			x					12.475.993	12.275.993		
Izgradnja ceste M-17.3 Neum-Stolac, dionica Kiševo-Bročanac L=cca 8,1 km	x				4-Održivi razvoj	3-Transport i komunikacije	1 - Povećanje mobilnosti roba i ljudi	11.620.000	9.000.000	2.780.000	1.390.000
GEF projekat zaštite kvaliteta voda u BiH	x			x	4-Održivi razvoj	1-Poljoprivreda, proizvodnja hrane i ruralni razvoj	3-Očuvanje prirode	9.094.680	688.441	1.371.115	591.698
Sanacija ratnim dejstvima oštećenih zajedničkih dijelova objekata KS			x					7.785.088	7.385.088		
Prostorni plan Federacije BiH								6.488.000	5.340.873	467.500	467.500
Izgradnja kanalizacije i vodosnabdijevanje u općini Čelić	x				4-Održivi razvoj	1-Poljoprivreda, proizvodnja hrane i ruralni razvoj	4 - Poboļšanej uvjeta života i ruralna zaposlenost	6.086.157			
Izrada i postavljanje nišana i spomenika šehidima i poginulim borcima i umrlim braniteljima Armije BiH			x					5.762.902	4.988.992	208.910	198.910
Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija JU Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš" Sarajevo	x				5-Socijalna uključenost	3- Poboļšati zdravstvenu zaštitu	3- Unaprijediti primarnu zdravstvenu zaštitu	5.229.370	3.829.370		
Energetska sanacija Sarajeva - Povećanje energetske efikasnosti u stambenim zgradama u KS - ENESANSA	x							5.128.318	3.166.818		
Toplifikacij Srebrenika	x				4-Održivi razvoj	2 - Ekologija i razvoj energetske postrojenja	4 - Poticanje razvoja energetskog sektora	5.000.000	750.000	750.000	
Izgradnja sportske dvorane u Kalesiji			x		5-Socijalna uključenost	3 - Poboļšati obrazovanje	1 - Povećati obuhvat stanovništva obrazovanjem	4.617.000	3.600.000	480.000	
IPA-2010 Izgradnja reciklažnog postrojenja u Mostaru		x			4-Održivi razvoj	1 - Poljoprivreda, proizvodnja hrane i ruralni razvoj	3 - Očuvanje prirode	4.580.000		4.580.000	4.000.000
Izgradnja zgrade za općinske organe uprave Srebrenik			x					4.500.000	0	300.000	300.000
Faza III bis /HE Jablanica-Rekonstrukcija agregata 4,5 i 6 (iz nealociranih sredstava POWER I, II, III)	x				4-Održivi razvoj	2 - Ekologija i razvoj energetske postrojenja	4 - Poticanje razvoja energetskog sektora	4.248.383	3.513.094	175.119	0
Nabavka medicinske opreme za Klinički centar Univerziteta u Sarajevu	x				5-Socijalna uključenost	3- Poboļšati zdravstvenu zaštitu	3- Unaprijediti primarnu zdravstvenu zaštitu	3.725.118	3.725.118		
Projekat izgradnje kanizacionog sistema u Ljubuškom	x				4-Održivi razvoj	1-Poljoprivreda, proizvodnja hrane i ruralni razvoj	4 - Poboļšanej uvjeta života i ruralna zaposlenost	3.715.640		586.740	
Izgradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoni "Sjever"	x				3 Zapošljavanje	1 - MSP i otvaranej novih radnih mjesta	2 - Poboļšati uslove za stvaranje novih malih i srednjih preduzeća	3.712.000	768.160	230.000	80.000
Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija na ambulantama i centralnim objektima JU Doma zdravlja KS	x				5-Socijalna uključenost	3- Poboļšati zdravstvenu zaštitu	3- Unaprijediti primarnu zdravstvenu zaštitu	3.697.796	2.997.796	500.000	100.000
Nabavka medicinske opreme za JU Dom zdravlja KS	x				5-Socijalna uključenost	3- Poboļšati zdravstvenu zaštitu	3- Unaprijediti primarnu zdravstvenu zaštitu	3.630.846	1.430.846		

Rekonstrukcija rudarskog kompleksa Vihovići-Mostar II faza	x				4-Održivi razvoj	2 - ekologija i razvoj energetskih postrojenja	3 - Integriranost politike zaštite okoliša sa politikama ostalih sektora	3.579.501	303.260	370.000	180.375
Dovršetak novosagrađenog objekta - Dom zdravlja Tomislavgrad	x				5-Socijalna uključenost	3- Poboľjšati zdravstvenu zaštitu	3- Unaprijediti primarnu zdravstvenu zaštitu	3.539.000	1.653.000		
Sanacija ratnim dejstvima oštećenih fasada na području KS			x					3.416.602	2.716.612		
Sanacija ratnim dejstvima oštećenih liftova na području KS			x					3.172.624	2.572.634		
Izgradnja objekta za smještaj KJU "Porodično savjetovalište" KS	x				5-Socijalna uključenost	3- Poboľjšati zdravstvenu zaštitu	3- Unaprijediti primarnu zdravstvenu zaštitu	2.704.753	132.053	700.000	
RiTE Kongora	x				4-Održivi razvoj	2 - Ekologija i razvoj energetskih postrojenja	5 - Razvitak obnovljivih izvora energije	2.669.000	2.669.000		
Izgradnja centra za upravljanje otpadom Konjic		x			4-Održivi razvoj	1 - Poljoprivreda, proizvodnja hrane i ruralni razvoj	3 - Očuvanje prirode	2.650.000		2.100.000	2.100.000
Izrada projektne dokumentacije na prijedlog FMPK								2.620.000			
Zaštićena šumska i planinska područja - FMPAP								2.461.600	2.366.281	1.025.219	943.465
Sanacija deponije "Klepovica" Neum		x			4-Održivi razvoj	1 - Poljoprivreda, proizvodnja hrane i ruralni razvoj	3 - Očuvanje prirode	2.346.996			
Nabavka prioritetne opreme za JU Opća bolnica "Prim. dr Abudlah Nakaš" Sarajevo	x				5-Socijalna uključenost	3- Poboľjšati zdravstvenu zaštitu	3- Unaprijediti primarnu zdravstvenu zaštitu	2.252.161	1.602.161		
Izgradnja Centra za upravljanje čvrstim otpadom, te sanacija i zatvaranje postojeće deponije "Babunovići"		x			4-Održivi razvoj	1 - Poljoprivreda, proizvodnja hrane i ruralni razvoj	3 - Očuvanje prirode	2.250.000			
Projekat izgradnje objekta JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije na lokalitetu Jagomir	x				5-Socijalna uključenost	3- Poboľjšati zdravstvenu zaštitu	3- Unaprijediti primarnu zdravstvenu zaštitu	2.154.630	1.596.630	258.000	
Završetak privredno kulturnog i sportskog centra Gračanica	x				5-Socijalna uključenost	3 - Obrazovanje	1 - Povećati obuhvat stanovništva obrazovanjem	2.000.000	1.000.000		
Sredstva za snimanje objekata, ispitivanje stabilnosti konstrukcija, izrada sanacionih elaborataa, projektne dokumentacije, obezbjeđivanje dozvola za snaciju, troškovi tehničkog prijema					2 Konkurentnost	4 - Jedinstveni ekonomski prostor	2 - Unapređenje sistema infrastrukture kvaliteta	1.481.725	1.081.725		
Prekogranično zračno uvezivanje (CAN)	x				4-Održivi razvoj	3-Transport i komunikacije	1 - Povećanje mobilnosti roba i ljudi	1.388.638		1.388.638	
Renoviranje i dogradnja arhivske zgrade-Dogradnja II faze Depoa Kantonalnog Arhiva	x				5-Socijalna uključenost	3 - Poboľjšati obrazovanje	1 - Povećati obuhvat stanovništva obrazovanjem	1.387.495	484.625	300.000	902.869
Završetak II faze sportske dvorane u Brijesnici Velikoj	x				5-Socijalna uključenost	3 - Obrazovanje	1 - Povećati obuhvat stanovništva obrazovanjem	1.338.984	170.000	170.000	170.000
Rekonstrukcija, sanacija i opremanje JU Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS	x				5-Socijalna uključenost	3- Poboľjšati zdravstvenu zaštitu	3- Unaprijediti primarnu zdravstvenu zaštitu	1.224.464	844.464	40.000	

Vodosnabdijevanje naselja Rilić, Gornje i Donje ravno i zaseoka Zanačlina, Mušići i Zvimjača, Općina Kupres	x				4-Održivi razvoj	1-Poljoprivreda, proizvodnja hrane i ruralni razvoj	4 - poboljšane uvjete života i ruralna zaposlenost	1.185.000		185.000	63.039
Uvođenje informaciono-komunikacione tehnologije u zdravstvu	x				5-Socijalna uključenost	3- Poboľšati zdravstvenu zaštitu	3- Unaprijediti primarnu zdravstvenu zaštitu	1.178.748	568.748	60.000	
Izgradnja poduzetničkih zona Prozor Rama	x							1.160.000	990.000	170.000	
Rekonstrukcija i opremanje JU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS	x				5-Socijalna uključenost	3- Poboľšati zdravstvenu zaštitu	3- Unaprijediti primarnu zdravstvenu zaštitu	1.087.394	862.394		
Izgradnja kulturnog centra u Gradačcu	x				5-Socijalna uključenost	3 - Obrazovanje	1 - Povećati obuhvat stanovništva obrazovanjem,	1.000.000			
Revitalizacija kompleksa "Stari grad" Srebrenik			x					950.000	100.000	280.000	
Rekonstrukcija i opremanje objekta JU Psihijatrijska bolnica KS	x				5-Socijalna uključenost	3- Poboľšati zdravstvenu zaštitu	3- Unaprijediti primarnu zdravstvenu zaštitu	903.071	453.071		
Nabavka opreme za Šehidsko spomen mezarje Kovači Sarajevo			x					770.700	266.159	24.500	24.322
Izgradnja deponije smeća Ponir i izgradnja reciklažnog dvorišta-sortirnica		x			4-Održivi razvoj	1 - Poljoprivreda, proizvodnja hrane i ruralni razvoj	3 - Očuvanje prirode	683.500		90.000	90.000
Izgradnja doma za stare i nemoćne osobe "RAMA"	x				5-Socijalna uključenost			680.895	230.895	450.000	6.000
Rekonstrukcija i opremanje objekta Zavoda za zaštitu zdravlja studenata Kantona Sarajevo	x				5-Socijalna uključenost	3- Poboľšati zdravstvenu zaštitu	3- Unaprijediti primarnu zdravstvenu zaštitu	619.655	514.655		
Nabavka medicinske opreme za Zavod za medicinu rada KS	x				5-Socijalna uključenost	3- Poboľšati zdravstvenu zaštitu	3- Unaprijediti primarnu zdravstvenu zaštitu	589.886	359.886		
Izgradnja sportske dvorane i tri učionice	x				5-Socijalna uključenost	3 -Poboľšati obrazovanje	1 - Povećati obuhvat stanovništva obrazovanjem	577.300	370.000	207.300	182.300
Jačanje i umrežavanje malih aerodroma u Jadranskom području (A3-NET)	x				4-Održivi razvoj	3-Transport i komunikacije	1 - Povećanje mobilnosti roba i ljudi	383.538	92.667	290.871	
Sanacija deponije "Višnjik" u Gradačcu	x				4-Održivi razvoj	1 - Poljoprivreda, proizvodnja hrane i ruralni razvoj	3 - Očuvanje prirode	341.000			
Izgradnja i uređenje mezarja "Ravne bakije" Sarajevo			x					310.060	140.894	31.166	31.166
Izgradnja i uređenje mezarja "Hambarina carina" Sarajevo			x					306.435	47.514	28.298	23.863
ARCH - Stolac - Obnova građevinske baštine u Stocu	x				4-Održivi razvoj			195.583	46.463	156.466	7.753

Prilog 3. Projekti završeni u 2013. godini, u KM

Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za 2013	Utrošeno u 2013	Utrošeno do 31.12.2013
Električna energija II	Domaća sredstva	Vlastita sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	5.056.751	925.988	4.130.763	4.037.763	4.963.751
	Ino sredstva	Kredit	EIB	64.346.807	49.493.685	14.853.122	13.027.962	62.521.647
	UKUPNO			69.403.558	49.494.611	18.983.885	66.560.336	
Adaptacija prostorija Policijske ispostave Turbe	Domaća sredstva	Budžet	Budžet kantona - potrošačka jedinica	30.846	30.846	0	0	30.846
Adaptacija prostorija, nabavka i ugradnja opreme i sredstava za sigurnosno područje u zgradi MUP-a SBK u sjedištu	Domaća sredstva	Budžet	Budžet kantona - potrošačka jedinica	13.500	13.500	0	0	13.500
Rekonstrukcija vodovodne mreže - zamjena azbestnih cijevi u naselju Troska	Domaća sredstva	Grant	Budžet kantona - javne investicije	29.978	29.978	0	0	29.978
UKUPNO				69.477.882	50.493.997	18.983.885	17.065.725	67.559.722

Prilog 4: Operativni troškovi po projektima koji se sufinansiraju iz budžeta FBiH, u KM

II faza – Upravljanje čvrstim otpadom - SSWMP (Deponije Mošćanica, Zenica i Mostar)	IBRD		Budžet FBiH	
	Utrošeno u prethodnim godinama	Utrošeno u 2013	Utrošeno u prethodnim godinama	Utrošeno u 2013
Naknada zaposlenim	0	1.410	520	3.965
Bankarska provizija	0	3.547	864	34
Potrošni materijal	0	4.382	0	1.411
Održavanje	0	5.342	3.633	2.049
Dnevnice	0	6.427	3.467	6.087
Registracija i ostali troškovi autoparka	0	7.024		
Troškovi siguranja	0	7.874	0	5.264
Troškovi službenog putovanja	0	10.003	2.594	2.087
Oglašavanje	0	13.773		
Konsultantski ugovori	0	15.448	20.417	19.317
PTT troškovi	0	15.637	2.789	4.186
Kancelarijski material i ostale nabavke i usluge za ured	0	21.858	5.978	5.962
Zakupnine	0	25.348		
Plaće zaposlenih za SSS	0	65.747		
Plaće zaposlenih za VSS	0	116.904	40.387	24.695
Stručna literature i obrazovanje			520	904
Renta, struja, grijanje			0	2.916
Komunalni i zaštitarski poslovi			0	3.520
Ostalo	14.523	681	4.801	1.444

Poboljšanje životnih uvjeta na selu - IFAD	OPEC	
	Utrošeno u prethodnim godinama	Utrošeno u 2013
Bankarska provizija	0	310
Naknada zaposlenim	0	5.291
Plaće zaposlenih za SSS	0	6.400
Plaće zaposlenih za VSS	0	36.200
Porezi i doprinosi poslodavca i zaposlenih	0	32.434

Zaštita kvaliteta voda - GEF	Budžet FBiH		Svjetska banka	
	Utrošeno u prethodnim godinama	Utrošeno u 2013	Utrošeno u prethodnim godinama	Utrošeno u 2013
Bankarska provizija	0	14	0	315
Kancelarijski materijal i ostale nabavke i usluge za ured			0	52
Održavanje			0	579
Komunikacijski troškovi			0	603
Plaće zaposlenih za VSS			0	13.480

ARDP – Poljoprivreda i ruralni razvoj	Budžet FBiH		Svjetska banka	
	Utrošeno u prethodnim godinama	Utrošeno u 2013	Utrošeno u prethodnim godinama	Utrošeno u 2013
Stručna literatura i obrazovanje	1.897	30	18.544	170
Troškovi službenog putovanja	0	217		
Edukacija, seminari	0	251	0	289
Internet-server zaregistar	0	2.123	0	12.028
Reprezentacija	331	337		
Komunikacijski troškovi	0	565		
Oglašavanje	3.134	754	18.056	2.793
Dnevnice	936	828	5.299	2.016
Kancelarijski materijali, ostale nabavke i usluge za ured	8.929	876	11.307	4.964
Revizija	2.105	951	11.931	5.387
Bankarska provizija	1.536	1.194	6.347	3.231
Registracija i ostali troškovi autoparka	0	2.797	0	2.666
Privremeni poslovi	1.514	2.925	8.582	1.294
Gorivo	257	3.106	7.581	5.422
Ostalo	5.496	5.884	24.259	10.145
Naknada zaposlenim	7.897	9.424	48.931	11.638
Plaće zaposlenih za VŠS	4.998	10.203	28.335	17.910
Plaće zaposlenih za SSS	21.985	25.875	124.575	53.927
Plaće zaposlenih za VSS	64.043	58.696	362.908	103.124
Renta, struja, grijanje	12.777	15.294	71.182	35.520

SSNESP – Podrška mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanju	Budžet FBiH		Svjetska banka	
	Utrošeno u prethodnim godinama	Utrošeno u 2013	Utrošeno u prethodnim godinama	Utrošeno u 2013
Bankarska provizija	19	496	3.522	3.063
Kancelarijski materijali, ostale nabavke i usluge za ured	2.114	2.393	4.971	560
Dnevnice	6.752	523	2.104	552
Gorivo	5.578	999	1.853	720
Oglašavanje	4.782	1.209		
Renta, struja, grijanje	0	4.175		
PTT troškovi	5.866	4.582	8.420	891
Renta, struja, grijanje	0	5.265		
Računovodstvene usluge	0	6.022	0	6.022
Održavanje	11.386	8.595	21.080	1.009,40
Zakupnine	19.200	9.600	25.800	9.600
Ostalo	18.795	13.005	0	2.330
Plaće zaposlenih za SSS	27.412	56.921	125.502	74.699
Plaće zaposlenih za VSS	217.018	98.665	401.562	93.989
Stručna literatura i obrazovanje			5.774	521
Konsultantski ugovori			17.575	15.000

SME – Poboljšanje dostupnosti finansija malih i srednjih preduzeća	IBRD		Revolving fond	
	Utrošeno u prethodnim godinama	Utrošeno u 2013	Utrošeno u prethodnim godinama	Utrošeno u 2013
Troškovi službenog putovanja	0	787	0	814
Bankarska provizija	1.356	824	0	1.165
Dnevnice	3.847	1.266	0	2.457
Kancelarijski materijali, ostale nabavke i usluge za ured	4.549	3.966	0	4.501
Stručna literatura i obrazovanje	2.830	3.994	0	6.132
Plaće zaposlenih za SSS	16.181	4.287	0	11.126
Gorivo	9.699	7.147	0	11.161
Održavanje	13.271	7.020	0	10.876
Privremeni poslovi	7.280	11.148	0	16.388
Komunikacijski troškovi	12.018	7.298	0	13.891
Plaće zaposlenih za VSS	69.198	24.399	0	36.748
Zakupnine			0	29.883
Plaće zaposlenih za VSS	454.950	230.408	0	452.881
Ostalo			0	18.305

HSEP- Jačanje zdravstvenog sektora – dodatno finansiranje	Budžet FBiH		Svjetska banka	
	Utrošeno u prethodnim godinama	Utrošeno u 2013	Utrošeno u prethodnim godinama	Utrošeno u 2013
Ostalo	0	10		
Komunikacijski troškovi	0	29	0	257
Bankarska provizija	0	65	0	1.996
Kancelarijski materijali, ostale nabavke i usluge za ured	0	95	0	641
Gorivo	0	205	0	1.855
Troškovi službenog putovanja	0	400	0	3.510
Dnevnice	0	455	0	4.087
Održavanje	0	500	0	4.498
Oglašavanje	0	567	0	5.106
Privremeni poslovi	0	1.205	0	10.852
Stručna literatura i obrazovanje	0	1.448	0	13.038
Registracija i ostali troškovi autoparka			0	745
Revizija			0	3.969

PRLZ – Projekat podrške razvoju lokalnih zajednica	Budžet FBiH	
	Utrošeno u prethodnim godinama	Utrošeno u 2013
Troškovi službenog putovanja	17.637	504
Bankarska provizija	3.273	510
Oglašavanje	16.427	644
Dnevnice	1.966	917
Kancelarijski materijali, ostale nabavke i usluge za ured	11.775	1.329
Privremeni poslovi	13.379	2.681
Stručna literatura i obrazovanje	7.550	3.204
Komunikacijski troškovi	32.886	3.583
Održavanje	40.980	3.778
Plaće zaposlenih za SSS	30.816	4.567
Plaće zaposlenih za VSS	866.501	131.973
Plaće zaposlenih za VŠS	131.789	19.539
Gorivo	26.418	4.852
Ostalo	278.460	25.050

Unapređenje ruralnog poduzetništva – IFAD 697 BA	Budžet FBiH		IFAD		OPEC	
	Utrošeno u prethodnim godinama	Utrošeno u 2013	Utrošeno u prethodnim godinama	Utrošeno u 2013	Utrošeno u prethodnim godinama	Utrošeno u 2013
Troškovi službenih putovanja	0	104			0	635
PTT troškovi	0	145			0	1.634
Gorivo	0	624			0	6.030
Internet-server za registar	0	1.140				
Zakupnine	0	1.526			0	8.974
Plaće zaposlenih za SSS	0	3.395			0	22.400
Plaće zaposlenih za VSS	0	34.122			0	126.700
Održavanje	2.069	8.436	12.883	182	0	4.938
Ostalo	7.033	11.000			0	1.631
Renta, struja, grijanje	0	38.113				
Edukacija, seminari			0	120		
Dnevnice			3.120	150	0	2.880
Bankarska provizija	0	352				
Registracija i ostali troškovi autoparka					0	1.105
Kancelarijski materijali,ostale nabavke i usluge za ured					0	1.286
Oglašavanje					0	1.631
Naknada zaposlenim					0	17.908
Porezi i doprinosi poslodavca i zaposlenih					0	27.086
Doprinosi					0	86.431

Prilog 5. Podaci implementatora o realizaciji projekata
